



EIGNASJÓÐUR FJÁRFESTINGAR  
UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

VERKSTAÐA NÝFRAMKVÆMDA  
JAN-DES 2020



LJÓSM. ÁGÚST SIGURJÓNSSON  
MYND Í EIGU RAFKAUP HF.

## EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2020

### VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - DESEMBER 2020

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2020

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 26.03.2021).

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 17.11.2020

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	10.552.730.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	9.644.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.379.000.000	þús. kr.
<b>Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)</b>	<b>22.575.730.000</b>	<b>þús. kr.</b>
<hr/>		
<b>Raunkostnaður 31.12.2020 nemur alls (brúttó)</b>	<b>15.824.973.560</b>	<b>þús. kr.</b>
<b>Raunkostnaður 31.12.2020, að frádregnum kostnaði vegna Samgöngusáttmála færðum á veltufjármuni, nemur alls (brúttó)</b>	<b>14.698.322.387</b>	<b>þús. kr.</b>

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - DESEMBER 2020				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	738.700	540.960	73%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	5.378.530	3.049.272	57%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.525.000	2.713.604	77%
Velferðarsvið	1107	485.500	351.324	72%
Ýmsar fasteignir	1108	375.000	116.792	31%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	50.000	3.937	8%
<b>FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR</b>		<b>10.552.730</b>	<b>6.775.888</b>	<b>64%</b>
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.670.000	1.355.346	81%
Nýbyggingahverfi	3104	3.040.000	2.330.599	77%
Endurnýjun í miðborginni	3105	890.000	565.475	64%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	1.269.230	66%
Umferðaröryggismál	3107	190.000	168.415	89%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.939.000	1.521.820	78%
<b>GÖTUR OG UMHVERFI</b>		<b>9.644.000</b>	<b>7.210.885</b>	<b>75%</b>
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.464.000	1.283.363	88%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	38.022	63%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	175.000	13.269	8%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	680.000	503.546	74%
<b>AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS</b>		<b>2.379.000</b>	<b>1.838.201</b>	<b>77%</b>
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)</b>		<b>22.575.730</b>	<b>15.824.974</b>	<b>70%</b>
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.343.500	-804.337	24%
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)</b>		<b>19.232.230</b>	<b>15.020.637</b>	<b>78%</b>
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur kostnaður vegna Samgöngusáttmála færður á veltufjármuni	3102	-995.000	-1.126.651	
<b>SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ) að frá frádregnum kostnaði Samgöngus.</b>		<b>18.237.230</b>	<b>13.893.986</b>	<b>76%</b>



SKÓLI, MENNINGARMÍÐSTÖÐ OG SUNDLAUG  
Í ÚLFARSÁRDAL

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni	5.000	0	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis og bakrými bars	92.000	91.121	99%
20037	Árbæjarsafn ný geymslubygging	Brietahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 2 setja upp sprinkler	24.000	23.144	96%
20094	Ásmundarsafn - Endurbætur	Aðgengismál, afgreiðsla og starfsmannarými	35.000	30.880	88%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	Endurnýjun lýsingar	15.000	13.263	88%
20282	Grófarhús, viðbygging	Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í nýju og gömlu húsi	15.000	7.918	53%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Frágangur innanhúss	334.500	246.031	74%
20308	Borgarbókasafn	Sjálfvirkt útlánakerfi	38.200	0	0%
20574	Aðalstræti 10	Aðgengi fyrir alla, tengingur og uppsetning lyftu auk Landnámssýningar	180.000	128.603	71%
<b>Samtals 1103</b>			<b>738.700</b>	<b>540.960</b>	<b>73%</b>

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli	Viðgerð á útitiskýlum og lyftur í aðalbyggingu	100.000	5.818	6%
20003	Árbæjarskóli	Breyting á stofum	30.000	28.440	95%
20013	Ingunnarskóli	Breyting á stofum	30.000	28.427	95%
20030	Endurbýgging - Skólalóðir, boltagerði	Unnið að framkvæmdum	275.000	223.336	81%
20092	Safnliður, frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis öryggismál	30.000	12.338	41%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	5.000	3.790	76%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalsskóli frágangur innanhúss	350.000	412.736	118%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Lóðaframkvæmdir	30.000	22.159	74%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Flutningur á færanlegum stofum og smíði á þrem nýjum	125.000	101.975	82%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis í Hólabrekkuskóla og breytingar í Laugalækjaskóla, Norðlingaskóla	50.000	49.073	98%
20321	Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	Lagfæringar á húsnæði	50.000	22.551	45%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald		270.000	183.979	68%
20326	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjaförður	Undirbúningur, samkeppni, hönnun	240.000	172	0%
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	Undirbúningur	100.000	2.374	2%
20340	Grunnskólar - Grafarvogur norður	Engjaskóli, Víkurskóli og Borgarskóli	35.000	35.305	101%
20373	Fossvogsskóli	Viðgerðir og endurbætur á húsnæði	85.000	81.571	96%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Kaup og endurbætur	320.000	262.779	82%
20848	Fellaskóli	Framkvæmdir í kjallara	20.000	20.027	100%
20849	Seljaskóli	Endurnýjun vegna bruna	111.000	112.577	101%
<b>Samtals 1104</b>			<b>2.256.000</b>	<b>1.609.426</b>	<b>71%</b>

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ





1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20068	Endurbygging leikskólalóða	Unnið að framkvæmdum	525.000	426.968	81%
20101	Nýjar leikskóladeildir		2.217.530	906.813	41%
20190	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	Ýmis öryggismál	30.000	11.228	37%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Endurnýjun mótuneyta í Rauðhól og Lyngheimum	50.000	16.937	34%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Ýmsar framkvæmdir	110.000	48.315	44%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu Fífuborg, Gullborg og Sæborg	120.000	5.925	5%
20332	Miðborg, nýr leikskóli	Hönnunarsamkeppni	70.000	23.659	34%
<b>Samtals 1106</b>			<b>3.122.530</b>	<b>1.439.845</b>	<b>46%</b>
<b>Samtals 1104 OG 1106</b>			<b>5.378.530</b>	<b>3.049.272</b>	<b>57%</b>

1105 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ



1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Meiriháttar viðhald, endurnýjun ýmiss búnaðar.	80.000	43.890	55%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurgerð á kvennaklefum.	60.000	43.348	72%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Bláfjöll og Skálafell	105.000	49.645	47%
20058	Laugardalur aðalleikvangur samn. við KSÍ	Lagfæringar á búningsklefum, hlaupbrautum ofl.	93.000	95.564	103%
20060	Reiðhöll Víðidal	Samningur við Fák	12.000	12.000	100%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla auk eldvarnarmála	30.000	25.836	86%
20172	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	Gevigras	40.000	40.348	101%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Færsla á lagnahús og fering vallar	25.000	26.919	108%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	10.675	53%
20276	Sundlaugar	Ýmis stærri viðhaldsverkefni	200.000	106.224	53%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurgerð búningsklefa í eldri byggingu ofl.	95.000	40.150	42%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Ártúni, Breiðholti og Grafarvogi	10.000	7.138	71%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús	Lúkning á frjálsíþróttavelli	50.000	76.173	152%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Íþróttarmiðstöð	575.000	361.057	63%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Uppsteypa íþróttarhúss	1.300.000	1.148.296	88%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Fjölnotahús og Parkethús	700.000	613.933	88%
20310	Laugardalslaug	Endurbætur og undirbúningur samkeppni vegna Laugardalslaugar	80.000	12.408	16%
20312	Ylstrendur	Við Gufunes og Skarfaklett	50.000	0	0%
<b>Samtals 1105</b>			<b>3.525.000</b>	<b>2.713.604</b>	<b>77%</b>

1105 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ



ÍPRÓTTAHÚS FRAM  
Í ÚLFARSÁRDAL

1105 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ



1107 VELFERÐARSVIÐ



1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20077	Hjúkrunarheimili Suðurlandsbraut 66 (110 rými)	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	13.500	0	0%
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Unnið í samstarfi við ríkið	48.450	48.545	100%
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	Ýmis verkefni	26.550	312	1%
20259	Gistiskýli Lindargötu	Endurnýjun þaks	45.000	47.266	105%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Bygging á 20 stk. smáhýsum	250.000	251.373	101%
20342	Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	Undirbúningur og þarfagreining	20.000	0	0%
20343	Árskógar 4		8.000	0	0%
20434	Bjarkarhlíð við Bústaðarveg		10.000	3.828	38%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	64.000	0	0%
<b>Samtals 1107</b>			<b>485.500</b>	<b>351.324</b>	<b>72%</b>

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20090	Tjarnargata 12	Búningaaðstaða hjólréiðafólks	11.000	583	5%
20278	Ráðhús, breytingar	Breytingar á borgarstjórnarsal, brunahönnun og önnur hönnun	55.000	40.953	74%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	11.000	0	0%
20315	Toppstöðin	Próun Toppstöðvarinnar	0	0	0%
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	Samningsbundið viðhald Gufunesi	75.000	0	0%
20490	Hverfisbækistöð Jafnaseli og Stórhöfða	Ýmsar breytingar	50.000	21.441	43%
20839	Víðines, Víðinesvegur 30	Meiriháttar viðhald	25.000	0	0%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Lúkning á framkvæmdum	50.000	21.237	42%
20842	Sólheimar 29-35		20.000	0	0%
20844	Þönglabakki 4	Bruna og öryggiskerfi	12.000	4.764	40%
20847	Grandagarður 1A	Uppgjör	6.000	5.221	87%
20851	Völvufell 7a	Breytingar innan- og utanhúss	25.000	937	4%
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	Lagfæringar á húsnæði	7.000	4.780	68%
20857	Völvufell 11	Breytingar innanhúss	5.000	3.042	61%
20858	Arnarbakki 2-6	Breytingar innanhúss	5.000	1.836	37%
20859	Völvufell 13-21	Breytingar innanhúss	8.000	5.631	70%
20964	Borgartún 6	Breytingar innanhúss	10.000	6.366	64%
<b>Samtals 1108</b>			<b>375.000</b>	<b>116.792</b>	<b>31%</b>



1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	3.937	0%
20855	Bílakjallari Vesturbugt		50.000	0	0%
Samtals 1112			50.000	3.937	8%

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		0	213.456	0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-1.017.792	0%
			-3.343.500	0	0%
		<b>Samtals 3100</b>	<b>-3.343.500</b>	<b>-804.337</b>	<b>24%</b>

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmis minni undirbúningsverk	5.000	0	0%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk.	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	50.000	0	0%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Bústaðarvegur lenging fráreinar og breikkun rampa	50.000	22.333	45%
30230	Forgangur Strætó og úrbætur	Biðstöðvar ofl.	50.000	11.732	23%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Frágangur göngu- og hjólaleiða ofl.	50.000	14.592	29%
30239	Laugalækur, grenndastöð og torg	Gerð torgs og niðursetning djúpgáma	50.000	34.470	69%
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	Unnið að framkvæmdum	30.000	21.714	72%
30245	Bústaðavegur 151-153	Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum lóðum	200.000	150.595	75%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Rvk.	995.000	1.064.651	107%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Undirbúningur	20.000	0	0%
30250	Stórhöfði/Sævarhöfði/Gullinbrú	Undirbúningur og hönnun á gatnamótum	50.000	0	0%
30251	Borgargötur	Undirbúningur	20.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun á búnaði, miðlæg stýring og gangbrautaljós	100.000	35.259	35%
<b>Samtals 3102</b>			<b>1.670.000</b>	<b>1.355.346</b>	<b>81%</b>
30248	Samgöngusáttmáli	Kostnaður vegna samgöngusáttmála færður á veltufjármuni	-995.000	-1.126.651	
<b>Samtals 3102 að frádrögnum kostnaði færðum á veltufjármuni</b>			<b>675.000</b>	<b>228.695</b>	<b>34%</b>

3104 NÝBYGGINGAHVERFI



3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis minni verkefni	30.000	52.594	175%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Ýmis frágangsverkefni	20.000	330	2%
30409	Úlfarsárdalur	Bílastæði, gönguleiðir og frágangur	150.000	123.196	82%
30412	Þétting byggðar	Frágangur umhverfis Héðinsreit ofl.	70.000	69.284	99%
30413	Hádegismóar	Gangstéttar og frágangur	2.000	89	4%
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Unnið í samvinnu við Fák	30.000	20.599	69%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Gangstéttar og frágangur	2.000	154	8%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar og frágangur	70.000	41.077	59%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði	36.000	51.152	142%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Gatnagerð vegna nýrra lóða	100.000	133.887	134%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Frágangur Úlfarsbrautar og færsla Korpulínu	325.000	234.825	72%
30433	LSH	Hlutur Rvk.borgar í framkvæmdum tengdum NLSH	100.000	58.509	59%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Bjargargata ofl.	15.000	20.481	137%
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Stígagerð og frágangur	20.000	3.120	16%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	500.000	371.515	74%
30442	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	400.000	337.548	84%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatns	20.000	21.305	107%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna og mengunarrannsóknir	70.000	81.801	117%
30446	Kirkjusandur	Frágangur gönguleiða og hliðargötur	85.000	95.161	112%
30447	Eggertsgata	Framhald á Eggertsgötu, Sturlugata	95.000	120.108	126%
30449	RÚV reitur	Lokafrágangur hverfisins	70.000	67.876	97%
30453	Árskógar, gönguverun milli Álfabakka og Skógarsels	Upphækkuð gönguleið, eftirstöðvar	15.000	3.093	21%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Fyrsti áfangi gatnagerðar	210.000	206.582	98%
30455	Vigdísarlundur	Færsla stíga, vegna breytts skipulags	10.000	10	0%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur, skipulagsvinna	100.000	46.429	46%
30457	Hraunbær 103	Lenging götu og stígagerð	55.000	19.800	36%

30460	Bryggjuhverfi stækkun III	Framkvæmdir Gjúkabryggju og Beimabryggju	175.000	49.994	29%
30461	Hlíðarfótur	Endurbætur	15.000	14.169	94%
30462	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	Færsla stofnlagnar	50.000	0	0%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Undirbúningur	55.000	7.918	14%
30464	Veðurstofureitur	Framkvæmdir vegna nýs mælireits Veðurstofunnar	125.000	75.519	60%
30465	Sjómannaskólareitur	Skipulagsvinna	20.000	2.473	12%
<b>Samtals 3104</b>			<b>3.040.000</b>	<b>2.330.599</b>	<b>77%</b>



3105 MIÐBORG

3105 MIÐBORG





3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30509	Hverfisgata, endurgerð	Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis - eftirstöðvar	40.000	37.657	94%
30510	Þingholt, "torgin þrjú"	Framkvæmdum að mestu lokið, unnið að gróðursetningu	70.000	73.983	106%
30512	Laugavegur, endurbætur	Endurbætur Laugavegs	100.000	15.240	15%
30513	Frakkastígur, endurgerð	Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut - eftirstöðvar	20.000	13.886	69%
30522	Hlemmusvæði götur og torg	Undirbúningur og skipulagsvinna	50.000	5.062	10%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Endurgerð frestað	60.000	113	0%
30526	Tryggvagata, endurgerð	Endurgerð Nausta og Tryggvagötu milli Pósthússtrætis og Nausta	300.000	154.757	52%
30532	Miðbakki	Ýmsar framkvæmdir á Miðbakka, ásamt hjólastíg	40.000	1.693	4%
30533	Austurbakki Bryggjugata	Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, Faxaflóahafnir og Veitur - Uppgjör við aðra verkkaupa en Veitur fer fram í lok verks	130.000	162.123	125%
30536	Norðurstígur/Nýlendugata	Unnið að framkvæmdum	80.000	100.961	126%
<b>Samtals 3105</b>			<b>890.000</b>	<b>565.475</b>	<b>64%</b>




3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



LJÓSM. ÁGÚST SIGURJÓNSSON  
MYND Í EIGU RAFKAUP HF.

3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL

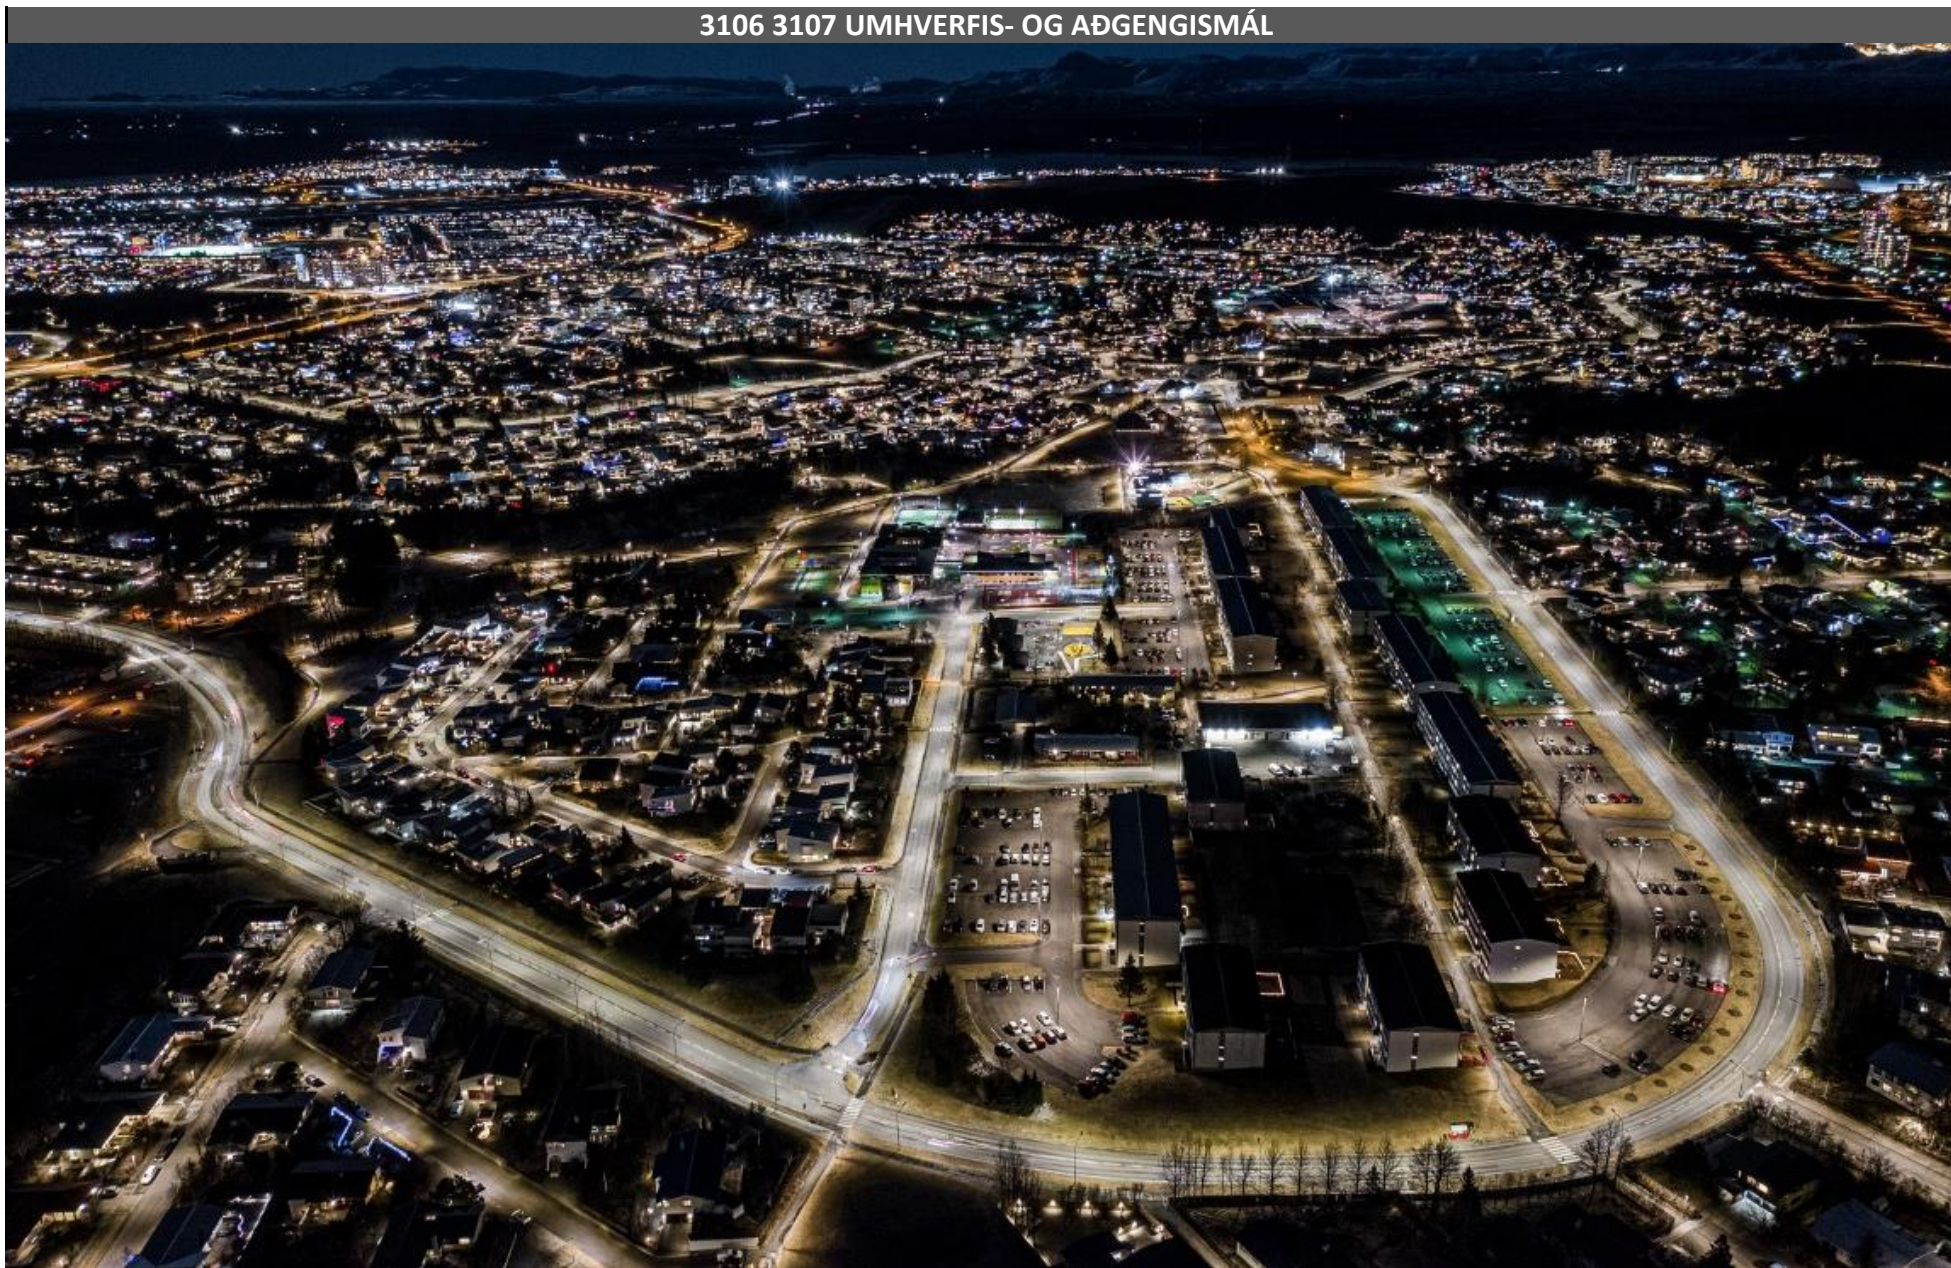

LJÓSM. ÁGÚST SIGURJÓNSSON  
MYND Í EIGU RAFKAUP HF.

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	270.000	93.485	35%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	5.317	106%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	7.966	32%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólreiðaáætlun	500.000	321.589	64%
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra strætóskýla	30.000	14.326	48%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	3.128	31%
30628	Brautarholtsstígar Kjalarnesi	Göngustígar við Brautarholtsveg - eftirstöðvar	50.000	43.815	88%
30631	Snorrabraut	Gatnamót Borgartúns og Snorrabrautar	100.000	43.784	44%
30633	Götulýsing - LED væðing	Uppsetning nýrrar LED lýsingar	300.000	335.071	112%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir nýjir staðir	100.000	81.611	82%
30637	Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Unnið að hönnun, framkvæmd fyrir áramót	30.000	14.448	48%
30638	Vatnspóstar	Vinna við uppsetningu	30.000	6.223	21%
30639	Endurnýjun götutrjáa	Framkvæmdum lokið	20.000	19.605	98%
30640	Græna netið	Unnið að framkvæmdum	80.000	73.569	92%
30641	Öskjuhlíð	Unnið að framkvæmdum	120.000	50.364	42%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Framkvæmdum 2020 lokið	10.000	9.037	90%
30643	Samgöngubætur Grafarvogur norður	Gangbrautir, bætt lýsing, upphækkanir ofl.	70.000	87.061	124%
30644	Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	Nýjir göngu- og hjólastígar	85.000	7.834	9%
30645	Umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva	Úrbætur á umhverfi og aðgengi að strætóbiðstöðum	30.000	7.990	27%
30646	Bryggjuhverfi. göngustígar milli Sævarhöfða og Stórhöfða	Nýr göngustígar	50.000	43.007	86%
<b>Samtals 3106</b>			<b>1.915.000</b>	<b>1.269.230</b>	<b>66%</b>

3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



LJÓSM. ÁGÚST SIGURJÓNSSON  
MYND Í EIGU RAFKAUP HF.

3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



VINNA VIÐ GERÐ GÖNGU- OG HJÓLASTÍGS  
FRÁ BÚSTAÐAVEGI



3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	190.000	168.415	89%
<b>Samtals 3107</b>			<b>190.000</b>	<b>168.415</b>	<b>89%</b>
<b>Samtals 3106 OG 3107</b>			<b>2.105.000</b>	<b>1.437.646</b>	<b>68%</b>

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.	150.000	103.823	69%
30816	Umferðaskiltun, merkingar	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	7.336	37%
30817	Malbiksyfirlög	Víðsvegar í borginni	784.000	772.133	98%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	26.161	131%
30846	Grendarstöðvar	Unnið að skipulagsgerð og hönnun, framkvæmdir í haust	70.000	36.481	52%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.		50.000	3.919	8%
30848	Grasagarður	Unnið að framkvæmdum	20.000	17.559	88%
30849	Klambratún	Unnið að framkvæmdum	90.000	87.086	97%
30850	Gufunes, heildarsvæði	Unnið að hönnun, framkvæmdir í haust	100.000	73.739	74%
30854	Önnur svæði, leiksvæðastefna	Unnið að framkvæmdum	45.000	55.125	123%
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	7.929	32%
30858	Snjallborgarlausnir		50.000	5.109	10%
30865	Mjódd	Endurnýjun útisvæðis, unnið við framkvæmdir	155.000	173.804	112%
30866	Kjalarnes útivist	Almennings salerni við Esju, framkvæmdum að mestu lokið	40.000	46.226	116%
30869	Kamsvegur	Endurgerð stoðveggja ásamt stígagerð	40.000	24.949	62%
30871	Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	Útboði lokið, framkvæmdir í haust	250.000	80.440	32%
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	Undirbúningur	30.000	0	0%
<b>Samtals 3108</b>			<b>1.939.000</b>	<b>1.521.820</b>	<b>78%</b>

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR





3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar í Borgartúni 12-14 vegna skipulagsbreytinga	20.000	19.870	99%
20841	Rafrænt þjónustuver	Efling sjálfsafgreiðslu íbúa o.fl	160.000	160.257	100%
80001	Ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og upplýsingakerfi	678.000	513.514	76%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	56.000	49.361	88%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmslum tækjum	46.000	12.089	26%
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	Árlegur pottur fyrir endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	528.273	124%
80016	Stjórnsýsluhúsin	Aðgangskerfi-stýringar	30.000	0	0%
80017	Löggæslumyndavélar		49.000	0	0%
<b>Samtals 2101</b>			<b>1.464.000</b>	<b>1.283.363</b>	<b>88%</b>
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
800012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	60.000	38.022	63%
<b>Samtals 2112</b>			<b>60.000</b>	<b>38.022</b>	<b>63%</b>
<b>Samtals 2101 OG 2112</b>			<b>1.524.000</b>	<b>1.321.386</b>	<b>87%</b>

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Deiliskipulagsvinna við Völvufell	0	5.881	-
20277	Samgöngumiðstöð	Umferðarmiðstöð breytingar	75.000	1.172	2%
20281	Þróunarverkefni	Safn Nínu Tryggvadóttur ofl.	0	6.215	-
20317	Ártúnshöfði		50.000	0	0%
20318	Skerjafjörður		50.000	0	0%
<b>Samtals 4101 OG 4102</b>			<b>175.000</b>	<b>13.269</b>	<b>8%</b>

7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD



7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 17. NÓV	KOSTNAÐARST 202012	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Unnið að framkvæmdum	100.000	110.237	110%
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Unnið að framkvæmdum og hugmyndasöfnun fyrir næstu kostningar	450.000	383.222	85%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni		130.000	10.087	8%
<b>Samtals 7101 og 7102</b>			<b>680.000</b>	<b>503.546</b>	<b>74%</b>

7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD



KLIFURKLETTUR Á KLAMBRATÚNI  
HVERFIÐ MITT
