



Minnismerki um kvennabaráttu í Hljómskálagarði

Endurgerð Venusar eða Sáttarinnar

Kynning í Umhverfis- og skipulagsráði

Þórólfur Jónsson , Arnfríður Valdimarsdóttir 18. mars 2026




Minnismerki sem heiðrar sögu og framlag Rauðsokkahreyfingarinnar í baráttunni fyrir jafnrétti, félagslegu réttlæti og bættum lífskjörum.

23. okt. 2025 - Viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar og fulltrúaráðs verkalýðshreyfingarinnar í Reykjavík um minnismerki.


Endurgerð Venusar eða Sáttarinnar sem gerð var af Jóni Benediktssyni fyrir leikmynd Messíönu Tómasdóttur fyrir leiksýninguna Lýsisströtu árið 1970, leikstjóri var Brynja Benediktsdóttir.



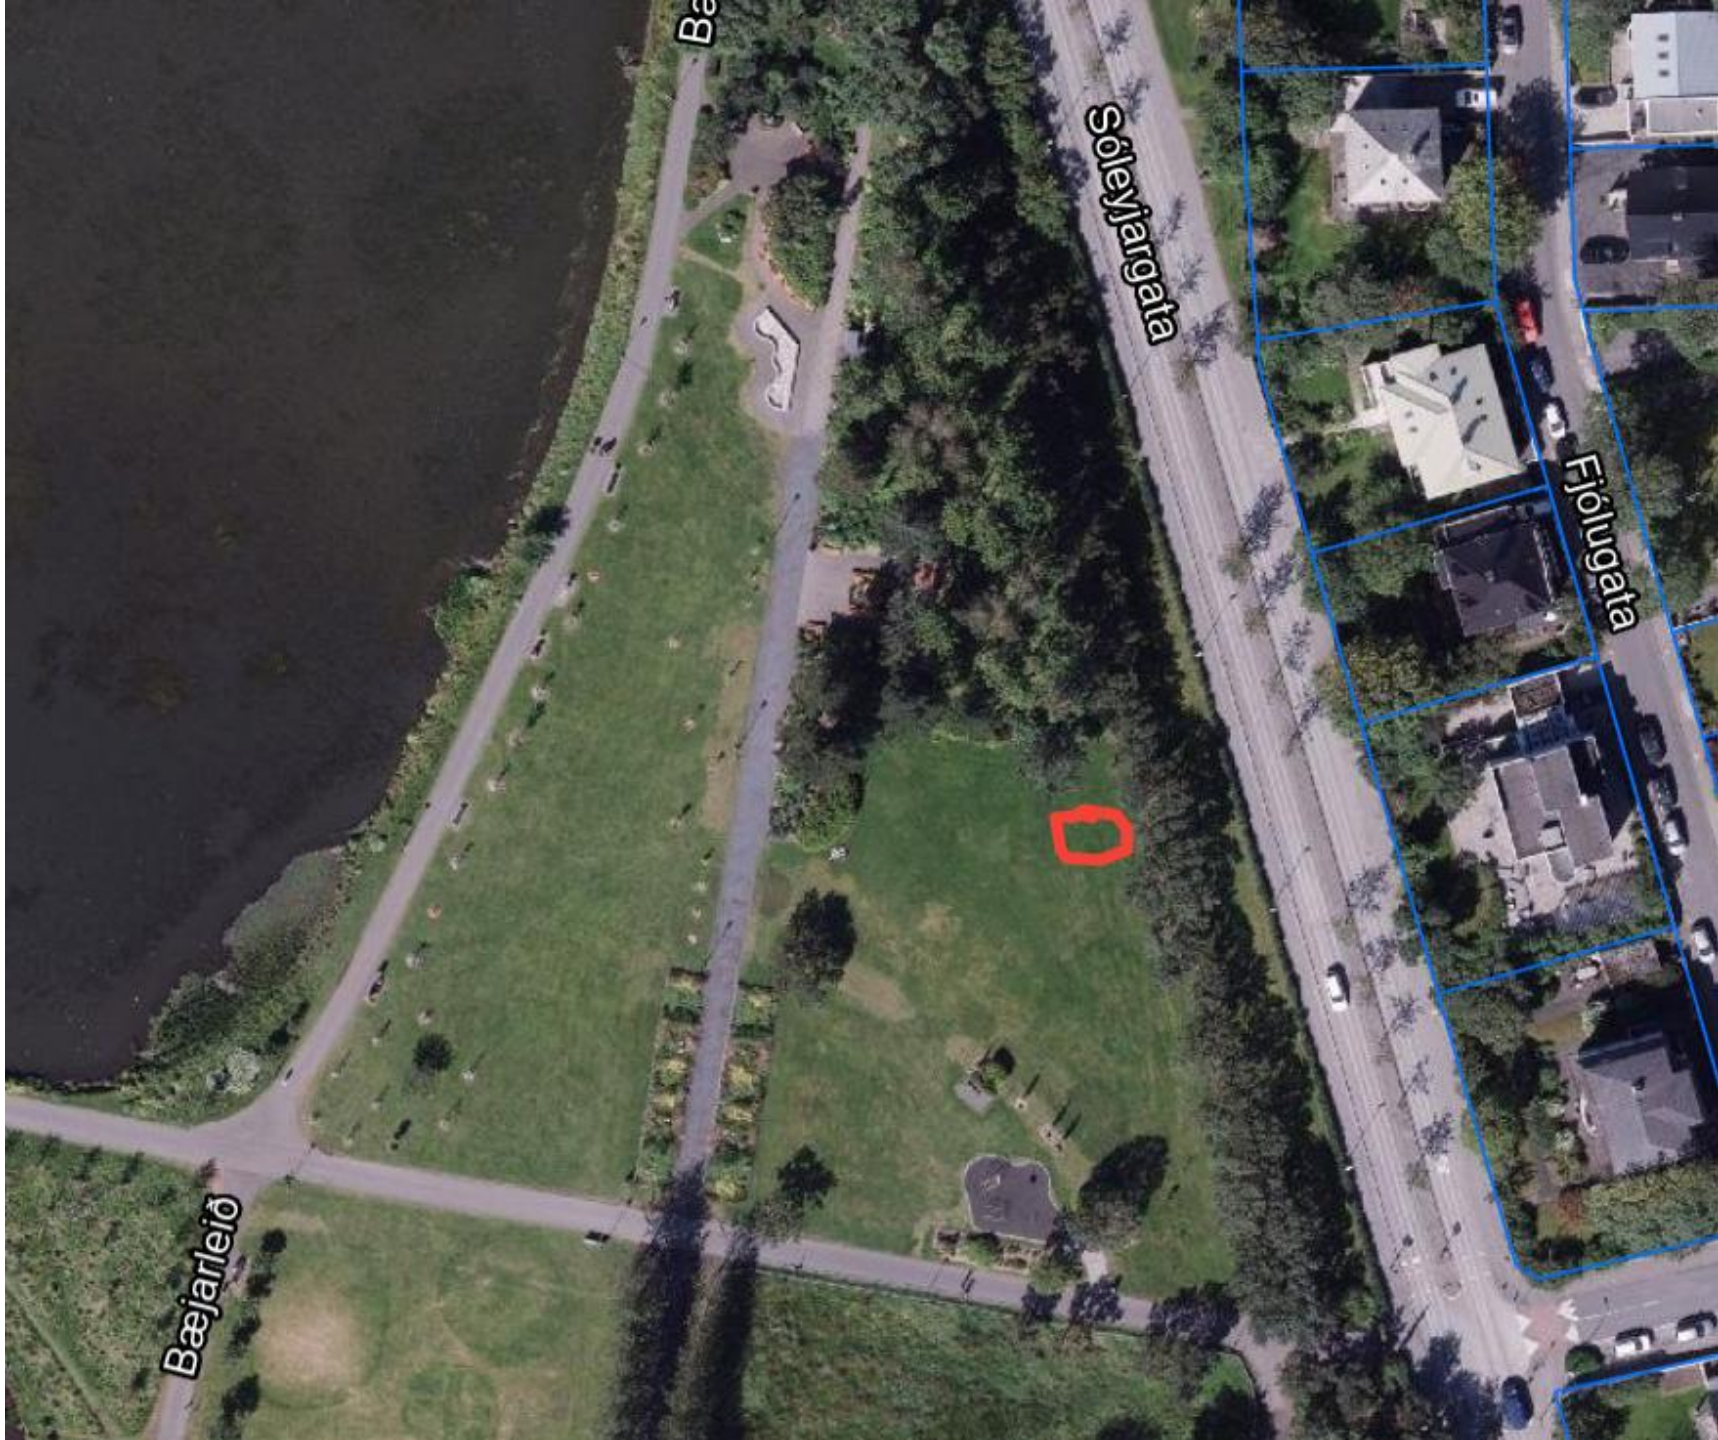

VENUS

GERÐ MINNISVARÐA
Eva Ísleifs

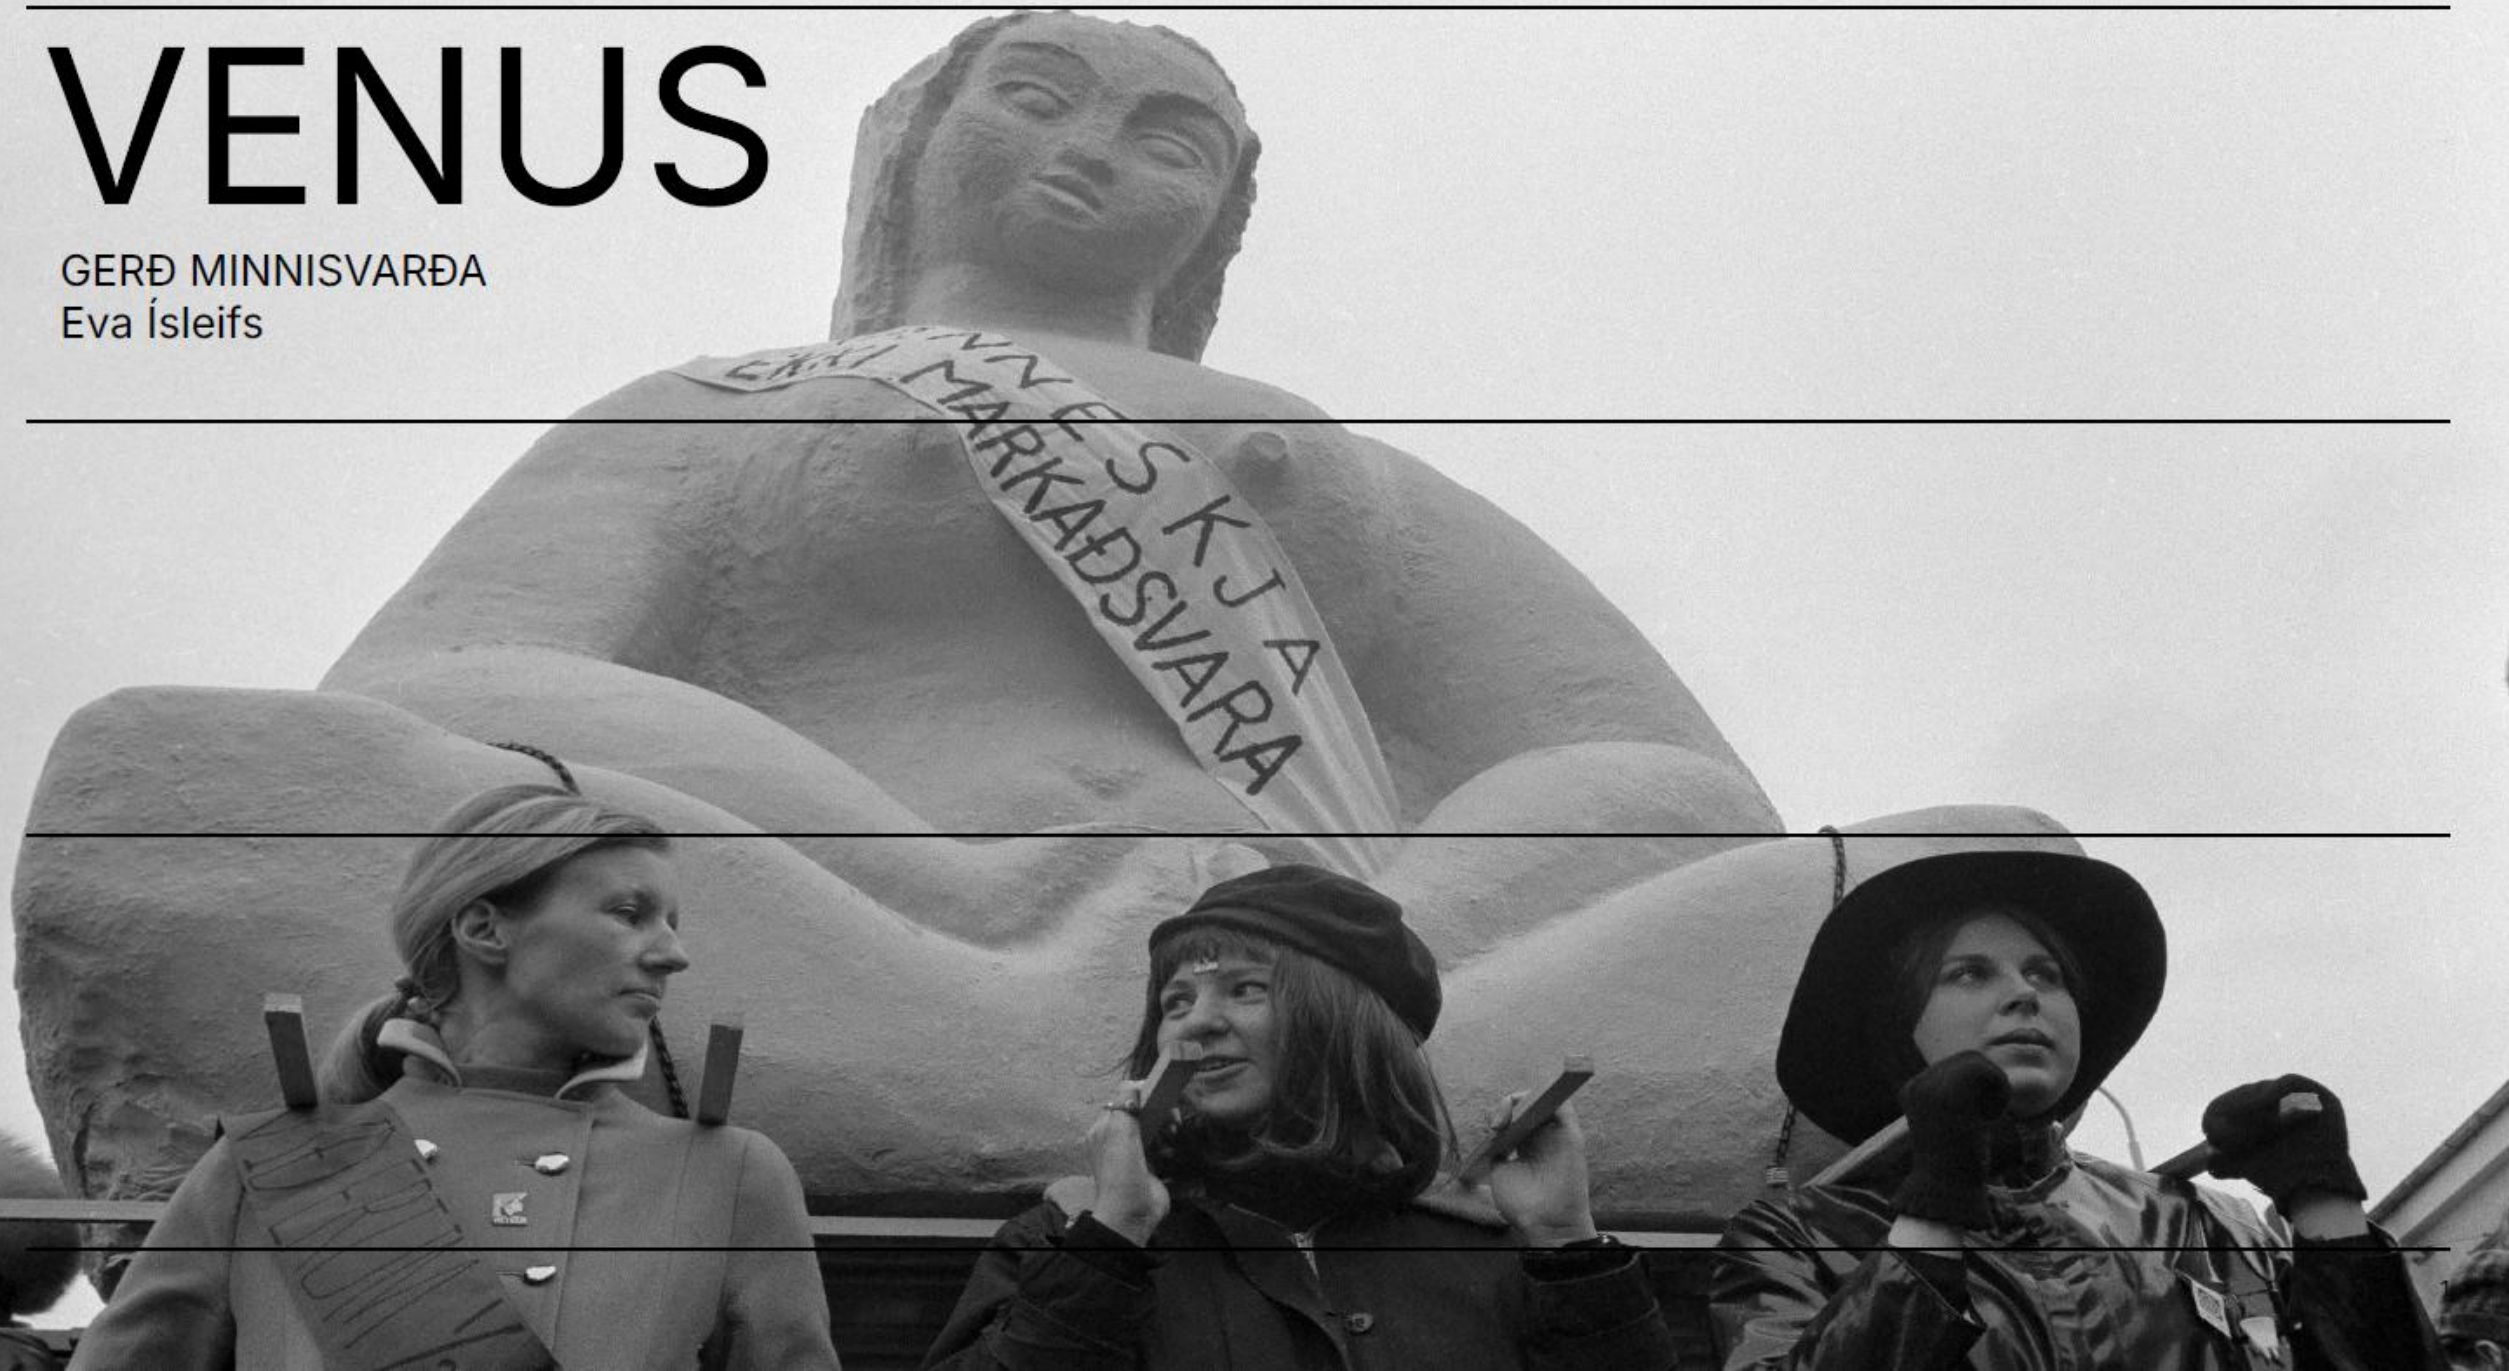




Efni og áferð verður líkt
og stytturnar hans
Ásmundar Sveinssonar,
steypt í steypu og múr.

Það verður tekið mót af
frauðstyttni og í það
helt steypu sem verður
með sérhönnuðu
ryðfríu vírvirki inni.



220 cm

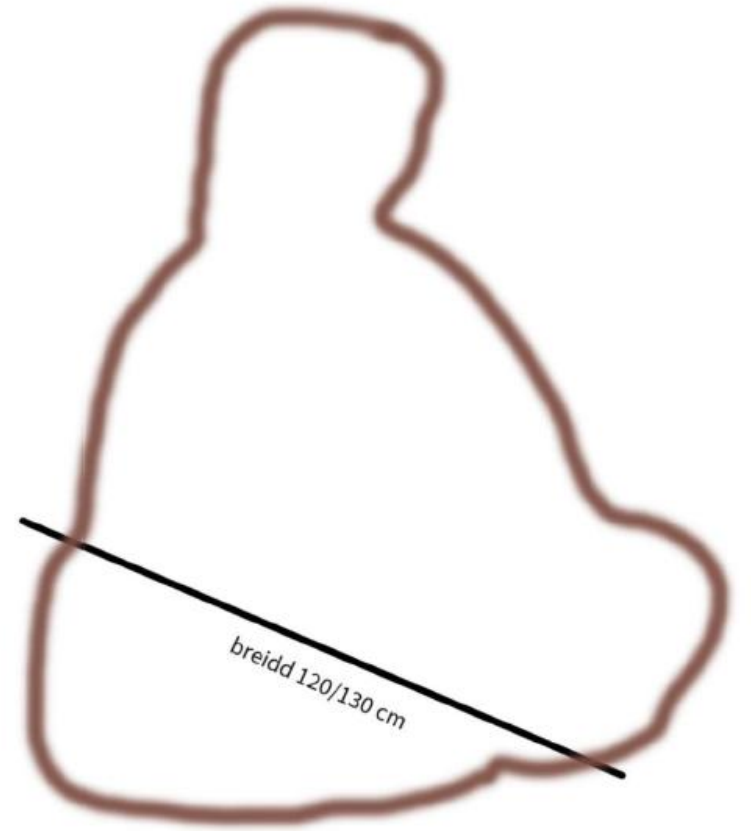

breidd 120/130 cm

262 cm



Tíma og verkáætlun 2026

Mars

Mars / undirbúningur

- Undirbúningur fyrir mótagerð á stóru styttunni.
- Frauð styttu flutt upp í vinnustofuna sem er vinnustofa Hallsteins Sigurðarsonar uppí Breiðholti sem MHR hefur til umráða fyrir gerð á stórum verkum.
- Fundur með Venusarhópnum sem sér um að vinna styttuna.
- Efni til mótagerðar komið fyrir uppí vinnustofu, timpur, trefjaplast, gifs, öll áhöld.
- Reiknað magn steypu sem þarf í styttuna.

Apríl - maí - júní

Apríl / mótagerð

- Frauð styttu löguð og húðuð og undirbúin fyrir mótagerð.
- Mót tekið af frauðstyttunni, sílikon með trefja skel.

Maí - júní

- Unnið að gerð mótsins
- Samsetning mótsins og víravirki komið fyrir inn í mótinu.
- Steypubíll kemur á svæðið og styttan steypd. Steypan þarf 28 daga til að harðporna.
- Unnið að húð-frágangi á styttunni og aðrar viðgerðir.
- Sökkull gerður (þarf 1 til 2 vikur til að harðporna).

Júlí

Júlí

- Styttan flutt og komið fyrir á sökkli.
- Unnið að lokafrágangi, merking o.s.f.r.v.

