

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

Ferlimál í vinnslu

SKRIFSTOFA FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS

Ferlimál í vinnslu

Aðgengis- og samráðsnefnd

VERKÞÆTTIR FERLIMÁLA

- Hólabrekkuskóli
- Sérklefi í Árbæjarlaug
- Hellirinn, félagsmiðstöð
- Sæmundarskóli
- Árbæjarsafn
- Bakkasel
- Aðalstræti 10
- Laugarnesskóli
- Norðlingaskóli
- Sérklefi í Vesturbæjarlaug
- Réttarholtsskóli
- Melaskóli
- Breiðholtslaug
- Laugalækjarskóli
- Bólstaðarhlíð
- Leikskólinn Bjartarhlíð

Hólabrekkuskóli

ÁÆTLUN


Í maí 2019 var framkvæmdarlok á bílastæði fyrir þjónustu- og hópþífu ásamt sérstæði hreyfihamlaðra. Snjóbræðsla var sett frá bílastæði að inngangi og aðgengi að byggingu endurbætt.

Búnaður og öryggismál á salerni fatlaðra lagað og bætt við hæðarstillanlegum skiptibekk.

Í september 2019 eru áætluð verklok á lyftu upp þrep frá sal út á leiksvæði

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið [8.103.600 ISK](#)

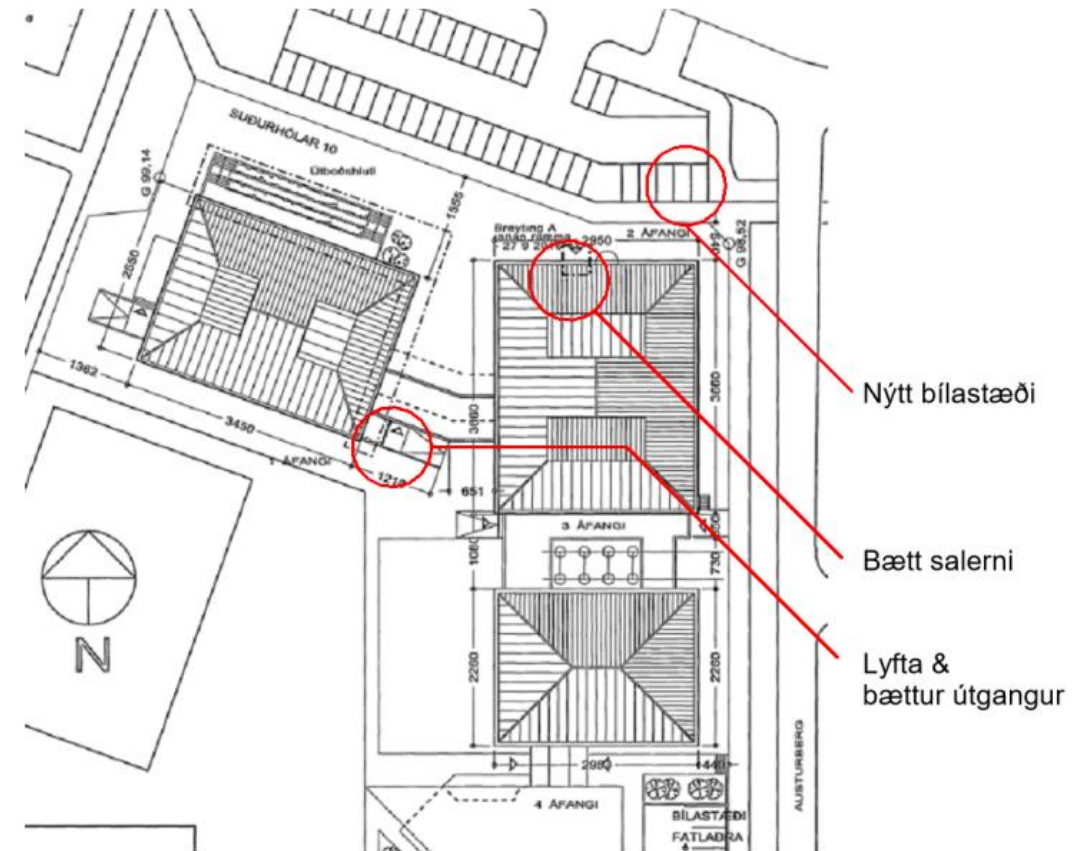

Beiðni kemur frá skólastjórn v/ umbóta í aðgengi fatlaðra

Hellirinn Seljaskóli

ÁÆTLUN

Hellirinn er félagsmiðstöð fyrir börn með sérþarfir. Til stendur að setja upp sturtuaðstöðu inná klósett með aðgengi fyrir hjólastóla.

Ásamt rafmagnsopnun á inngang frá gangstíg bak við húsið.

Áætluð verklok: Ágúst 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 1.730.497 ISK

Beiðni kemur frá umsjónarmanni vegna úrbóta á aðstöðu fatlaðra

Sæmundarskóli

ÁÆTLUN

Mála tábrep, bílastæði og allar fallhættur á skólalóð til að bæta öryggi þriggja nemanda sem sækja skólann. Töluverðar endurbætur á öryggismálum á lóð voru gerðar 2018.

Áætluð verklok: Júní 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 2.421.797 ISK

Beiðni kemur frá skólastjórn vegna úrbóta á öryggismálum fyrir blinda nemendur

Árbæjarsafn

ÁÆTLUN

Bæta þarf aðgengi hjá Árbæjarsafni, við aðalinngang og Dillonshús.

Skábraut veitir einungis aðgengi að litlu anddyri, innra skipulag og breidd hurða innan byggingar verða ekki aðlöguð af breidd hjólastóla vegna friðunar.

Rafmagnsopnun verður sett við aðalinnganga og skábraut bætt við Dillonshúsið.

Áætlun verklok september 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 6.339.863 ISK

Beiðni kemur frá safnstjóra

Breiðholtsskóli - Bakkasel

ÁÆTLUN

Bæta þarf aðgengi á milli Bakkasels og skólans.

Engin skábraut er á milli þjónustubyggingar og ekkert aðgengi að félagsmiðstöðinni fyrir hjólastóla eða fólk með skerta hreyfigetu.

Því er lagt til skábraut upp hæð fyrir framan skálann. Einnig þarf að bæta aðgengi við inngang þar sem skábraut kemur að. Fjarlægja þarf alla þröskulda innandyra.

Áætluð verklok: Október 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 9.946.460 ISK

Beiðni kemur frá forstjóra bakkasels vegna starfsmanns í hjólastól



Aðalstræti 10

ÁÆTLUN


Á staðnum er safn á vegum Borgarsögusafns Reykjavíkur.

Bæta þarf aðgengi og öryggi að safni frá hliðargötu.

Tillögur eru að búa til hraðahindrun fyrir framan inngang sem virkar einnig sem skábraut.

Einnig þarf að setja upp rafmagnsopnun á aðalhurð safnsins

Áætluð verklok: Ágúst 2019

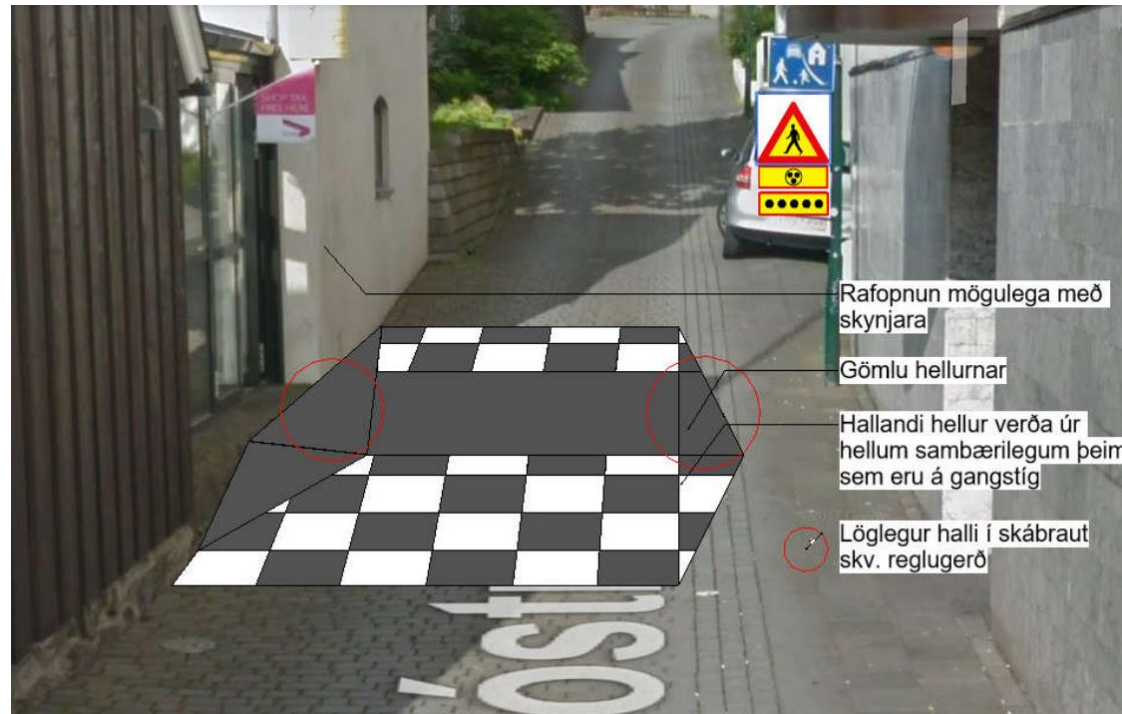

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 1.827.821 ISK

Beiðni kemur frá safnstjóra

Laugarnesskóli


ÁÆTLUN

Lyfta í Laugarnesskóla var tekin úr notkun af vinnueftirlitinu vegna ólöglegar lofthæðar.

Búið er að hanna þakglugga til að hækka þakið efst við lyftuna.

Vinnueftirlitið bendir einnig á það að víða á lóð vantar handrið meðfram tröppum, verið er að meta umfang þeirrar framkvæmdar.

Áætluð verklok: 1. september 2019

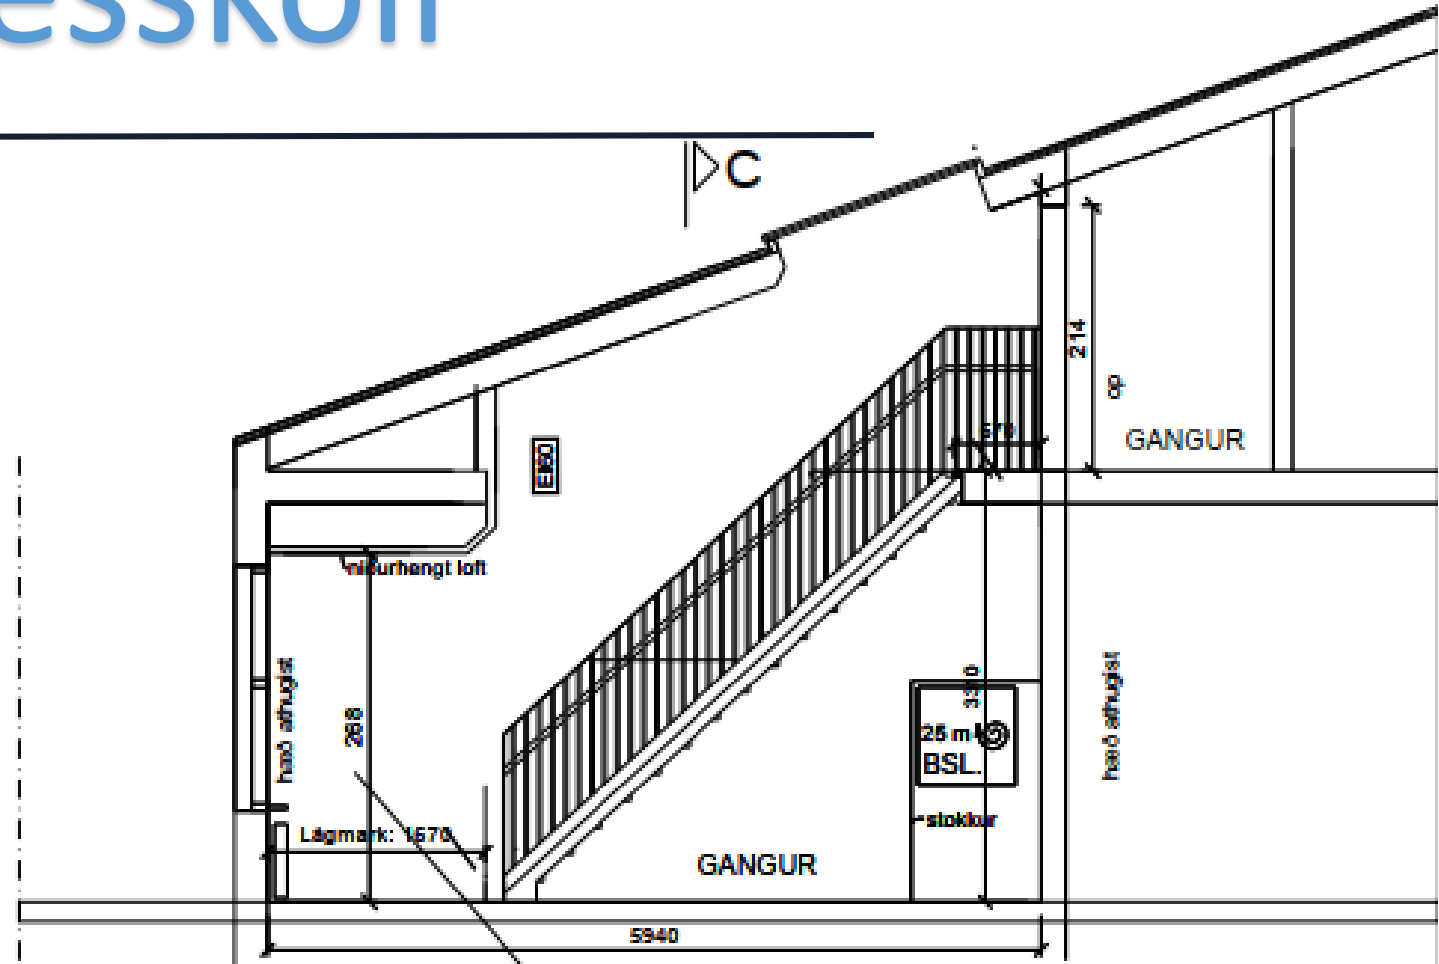

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Kostnaðaráætlun er í greiningu

Beiðni kemur frá vinnueftirlit vegna kvartana frá starfsfólki

Norðlingaskóli

ÁÆTLUN

Aðgengi og öryggismál við Norðlingaskóla er töluvert ábótavant, þörf er á rafmagnsopnun við tvo innganga.

Einnig er inngangur í austurátt með rennihurð sem fýkur upp í vondu veðri. Þar stendur til að útbúa bíslag.

Áætluð verklok: Ágúst 2019

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við framkvæmd sé 2.634.104 ISK



Beiðni kemur frá umsjónarmanni fasteignar vegna bætt aðgengis og tjóns á fasteign


Sérklefi í Vesturbæjarlaug

ÁÆTLUN

Útbúa þarf sérklefann samkvæmt reglugerðum og bæta þarf aðgengi að klefa og frá klefa að sundlaug.

Í klefa á að vera allur búnaður til að auðvelda fólki með sérþarfir að athæfa sig.

Áætluð verklok: Desember 2019

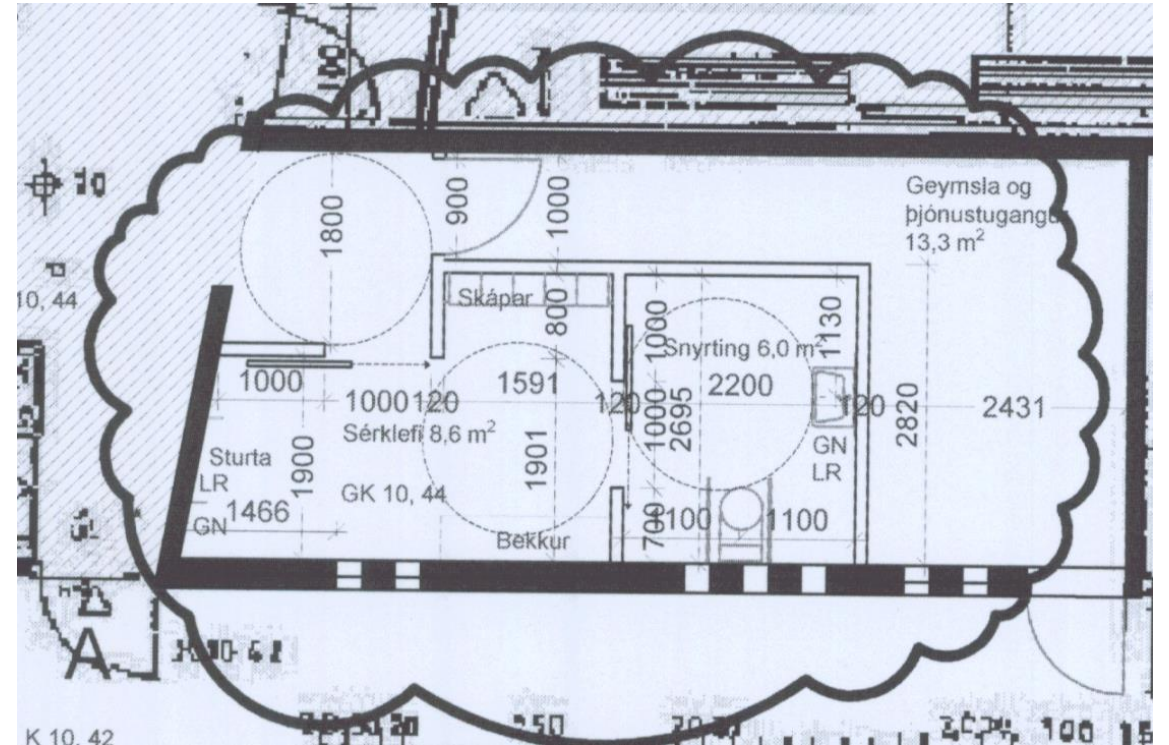

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við framkvæmd sé 10.666.667 ISK

Beiðni kemur frá eldri ferlinefnd vegna umbóta á aðstöðu við sundlaugar

Réttarholtsskóli

ÁÆTLUN

Aðlaga þarf bygginguna að nemandi sem kemur eftir sumarið í göngu grind og hjólastól.

Handrið vantar á skábrautir, rafmagnsopnanir á 6 innganga ásamt aðstöðu í heimilisfræði fyrir hann að athafa sig í.

Áætluð verklok: Ágúst 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 8.156.852 ISK

Beiðni kemur frá skólastjórn vegna ábendinga frá stuðningsfulltrúa drengsins

Melaskóli

ÁÆTLUN

Í Melaskóla vantar tvær sterkar rafmagnspumpur á innganga

- Bættir aðgengi
- Öryggisatriði

Áætluð verklok: Ágúst 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkið sé 1.360.000 ISK

Beiðni kemur frá umsjónarmanni fasteignar vegna öryggis- og aðgengismála

Breiðholtslaug

ÁÆTLUN

Bæta þarf aðstöðu við Breiðholtslaug. Nýir steyptir setubekkir fyrir utan inngang sem falla í umhverfið og eru fallhætta fyrir sjónskerta og blinda.

Bæta þarf lyftubúnað fyrir aðgengi hreyfihamlaða í sundlauginni.

Áætluð verklok: September 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Verkþættir eru metnir á: 1.066.667 ISK

Beiðni kemur frá umsjónarmanni fasteignar vegna öryggis- og aðgengismála

Laugarlækjarskóli

ÁÆTLUN

Í Laugarlækjarskóla stendur til að setja rafmagnspumpur á tvær hurðir sem standa við sama inngang.

Á næstu vikum stendur til að greina og taka út lóð og umhverfi til kynningar fyrir Aðgengis- og samráðsnefnd Reykjavíkurborgar.

Áætluð verklok: September 2019

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Heildarkostnaður við rafmagnsopnanir eru 986.667 ISK



Beiðni kemur frá umsjónarmanni fasteignar vegna öryggis- og aðgengismála

Bólstaðarhlíð 43

ÁÆTLUN

Í Bólstaðarhlíð er þjónustumiðstöð fyrir aldraða. Aðgengi að aðalinngangi og út í garð er ábótavant.

Að framan er þörf á að jafna hellur betur og gera kanta sýnilegri.

Í bakgarðinum vantar skábraut þar sem kanturinn út í garð er hár og á fólk erfitt með að koma sér út í garð

Áætluð verklok: September 2019



KOSTNAÐARÁÆTLUN

Heildarkostnaður við verkið sé 1.026.667 ISK

Beiðni kemur frá verkefnistjóra félagsmiðstöðvarinnar

Leikskólinn Bjartarhlíð


ÁÆTLUN

Töluverðar úrbætur vantar á lóð.

Afmarka þarf fallhættur, bæta lýsingu, mála táþrep og jafna hellur þar sem það á við.

Laga þarf gönguleiðir um lóð með tillit til sjónskertra og útbúa handrið á skábrautir.

Áætluð verklok: Ágúst 2019

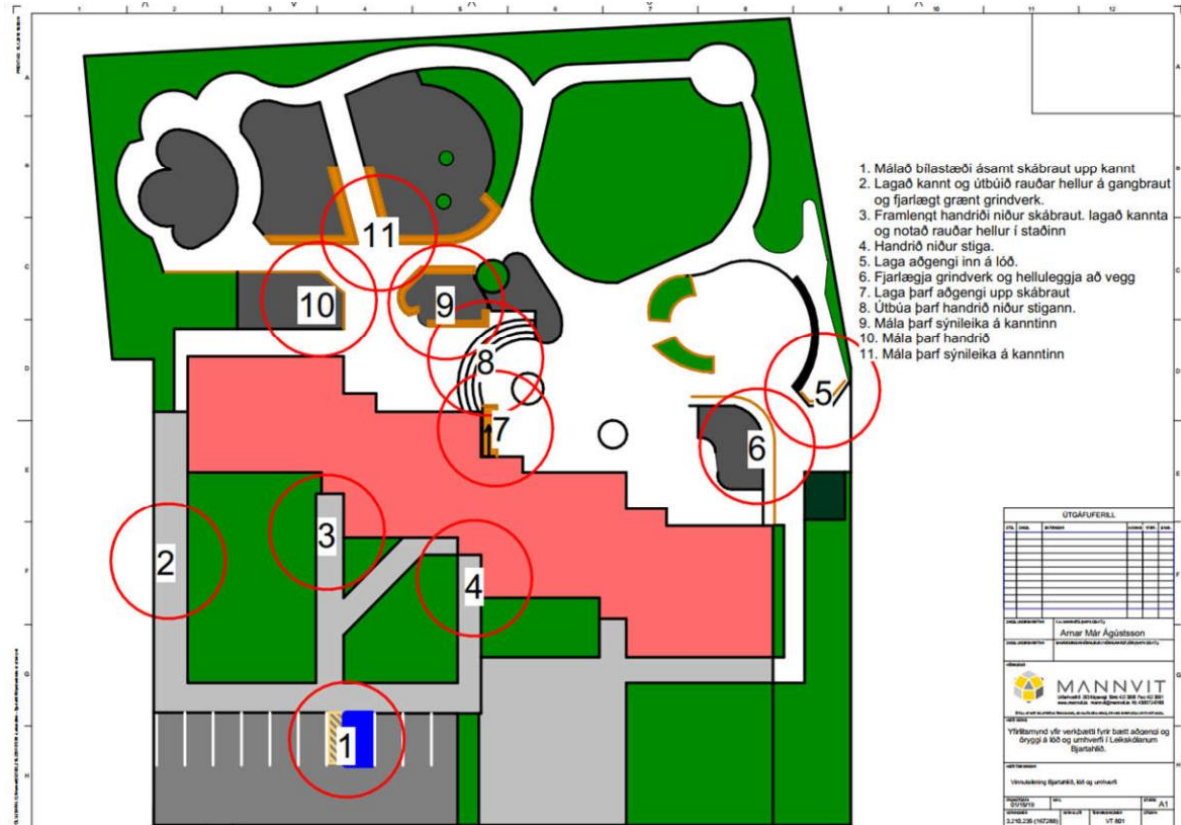

KOSTNAÐARÁÆTLUN

Heildarkostnaður við framkvæmdir sé 6.666.667 ISK

Beiðni kemur frá leikskólalastjóra vegna öryggismála sjónskertra og blinda

Kostnaðargreining

- Áætlun fyrir 2019 er 69 milljónir
- Staðan í dag er 59 milljónir
- Forgangsráða þarf framkvæmdum fyrir árið 2019
- Einhverjar framkvæmdir þurfa að færast yfir á næsta ár

Verkefni	Heildarkostnaður	Áætlun
Sérkelfi í vesturbæjarlaug	10.666.667 ISK	
Breiðholtsskóli	9.946.460 ISK	
Árbæjarlaug	8.269.460 ISK	
Réttarholtsskóli	8.156.852 ISK	
Hólabrekkuskóli	8.103.600 ISK	
Leikskólinn Bjartahlíð	6.666.667 ISK	
Árbæjarsafn	6.339.863 ISK	
Norðlingaskóli	2.634.104 ISK	
Sæmundarskóli	2.421.797 ISK	
Aðalstræti 10	1.827.821 ISK	
Hellirinn	1.730.497 ISK	
Melaskóli	1.360.000 ISK	
Breiðholtslaug	1.066.667 ISK	
Bólstaðarhlíð	1.026.667 ISK	
Laugarlækjaskóli	986.667 ISK	
Laugarnesskóli	0 ISK	
_Áætlun		69.000.000 ISK
_Staðan		-10.110.895 ISK
Total	71.203.788 ISK	58.889.105 ISK



MARKMIÐ

MARKMIÐ MEÐ
VERKEFNINU ER BETRA
AÐGENGI FYRIR ALLA



STEFNA

Tengist stefnu borgarinnar í
aðgengismálum



Aðgengis- og samráðsnefnd

Ferlimál í vinnslu

TAKK FYRIR
