




Verkefnaráð, Fylkið og forgangsröðun

Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Hvað er verkefnaráð?

- Fyrsta útgáfa verkefnaráðs varð til 2019 og hefur verið í þróun síðan
- Í verkefnaráði er fjallað um fjárfestingaverkefni sviðsins
- Stafrænir leiðtogar koma áskorunarstrigum/verkefnatillögum á dagskrá ráðsins
- Verkefnastjórar, framleiðendur og þau sem leiða verkefni á einhvern hátt geta komið verkefnum sínum á dagskrá varðandi stöðuskýrslur, áhættuflagganir og annað sem varðar stórar ákvarðanir í verkefnum
- Verkefnaráð tekur ákvarðanir um forgangsröðun verkefna og framvindu útfrá heildarhagsmunum borgarinnar
- Verkefnaráð fylgir stefnum borgarinnar í ákvarðanatöku með notkun Fylkisins
- Öll verkefni sem fara í gegnum verkefnaráð fara á verkefnaskrá sviðsins
- Verkefnaráð starfar á tveggja hliða (e. gates) ákvarðanatöku áður en til framkvæmdar kemur
- Í verkefnaskránni má sjá hvað er unnið hvar og hver staðan er á baklista
- Náðst hefur mikill verkefnaumsýslulegur (e. project governance) þroski með þessari aðferðarfræði

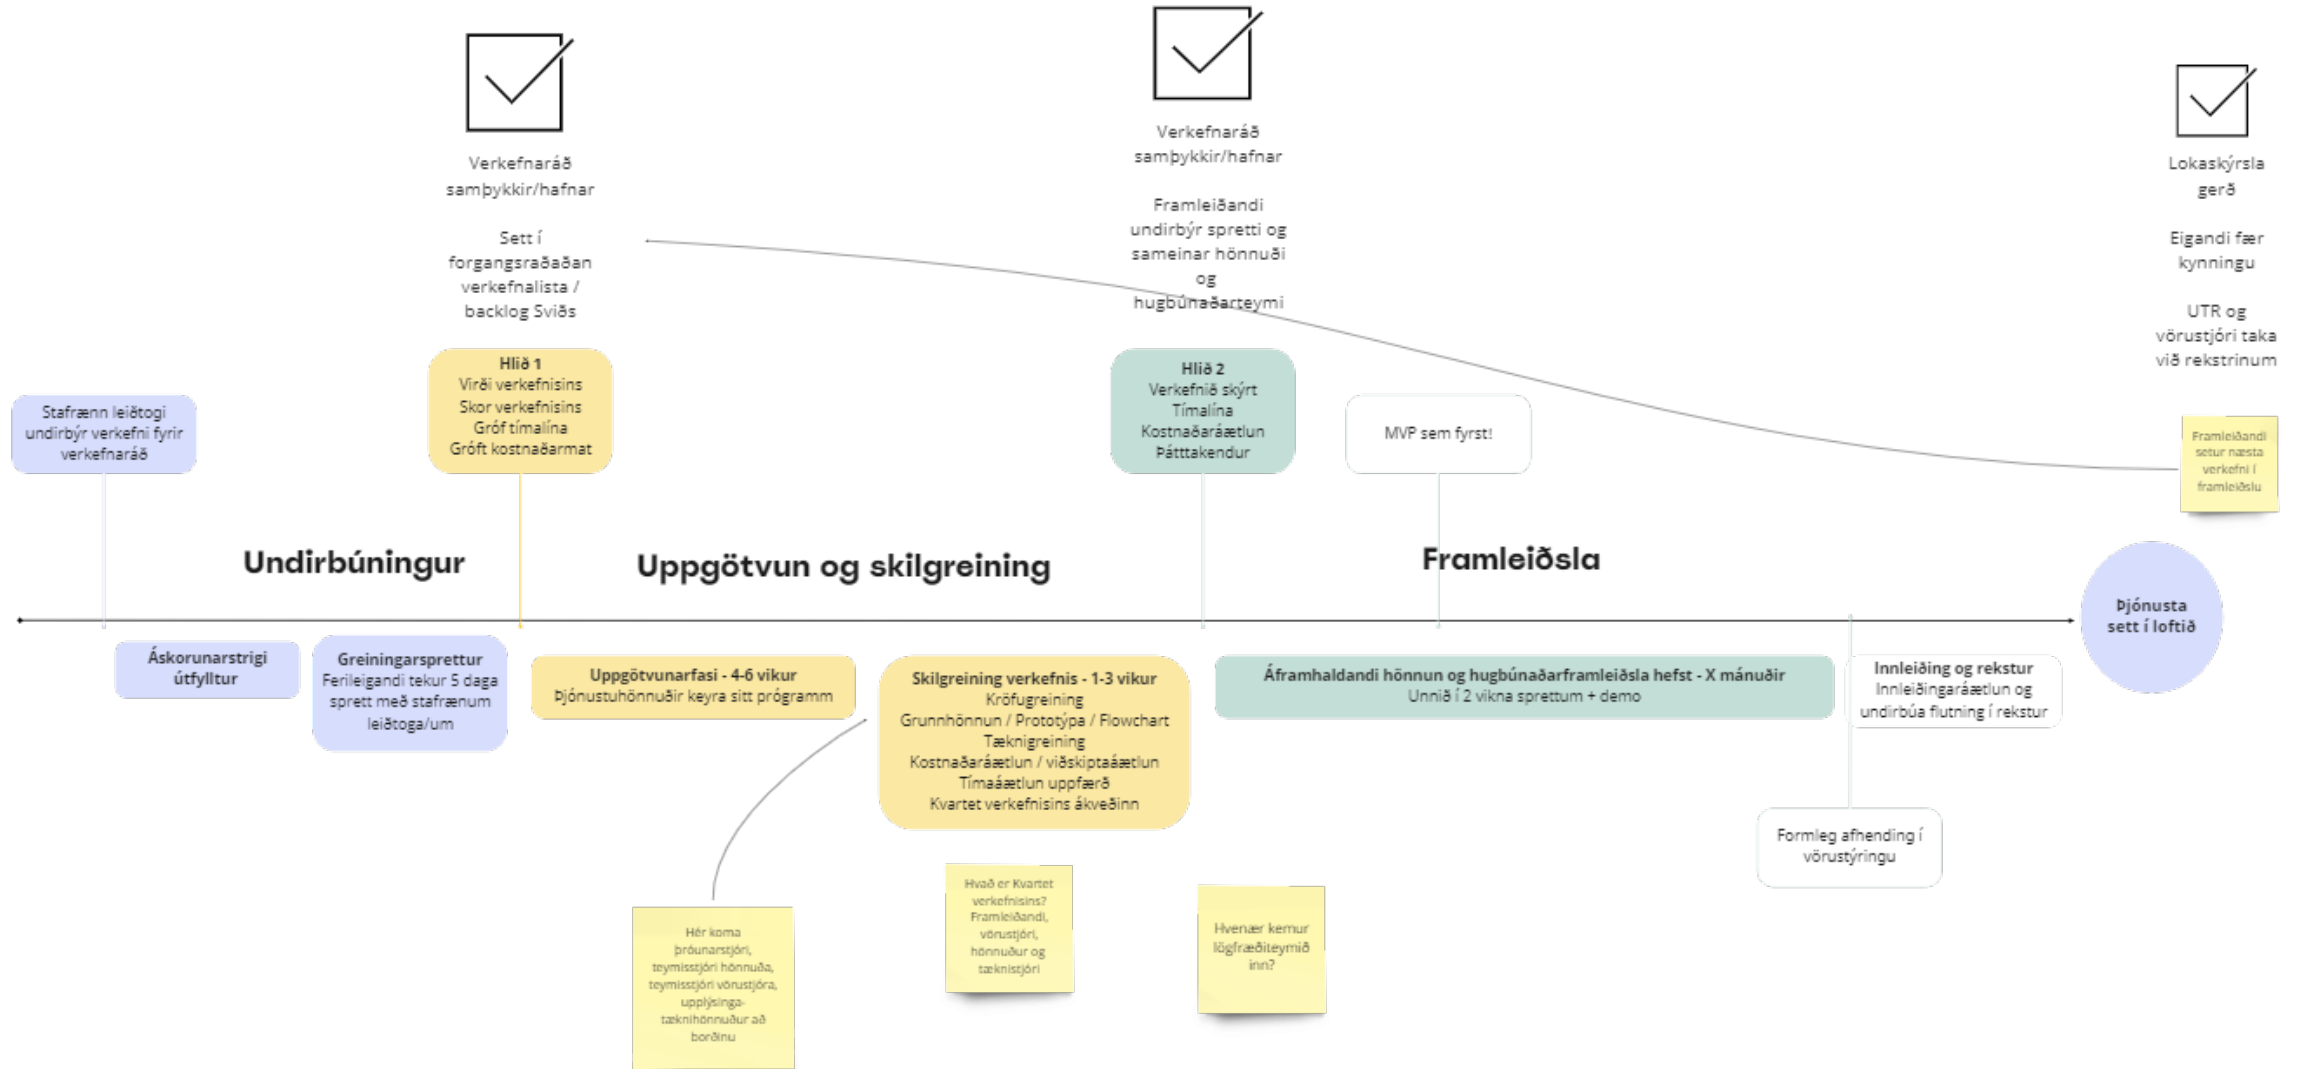




Hvernig komast verkefni á dagskrá?

PON-SSR-FER-00007

Markmið: Tryggja gæði ákvarðana og eftirfylgni fjárfestingarverkefna PON

Ferilseigandi/Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri Stafrænnar Reykjavíkur

Kerfi: Hlaðan, M365, Agresso

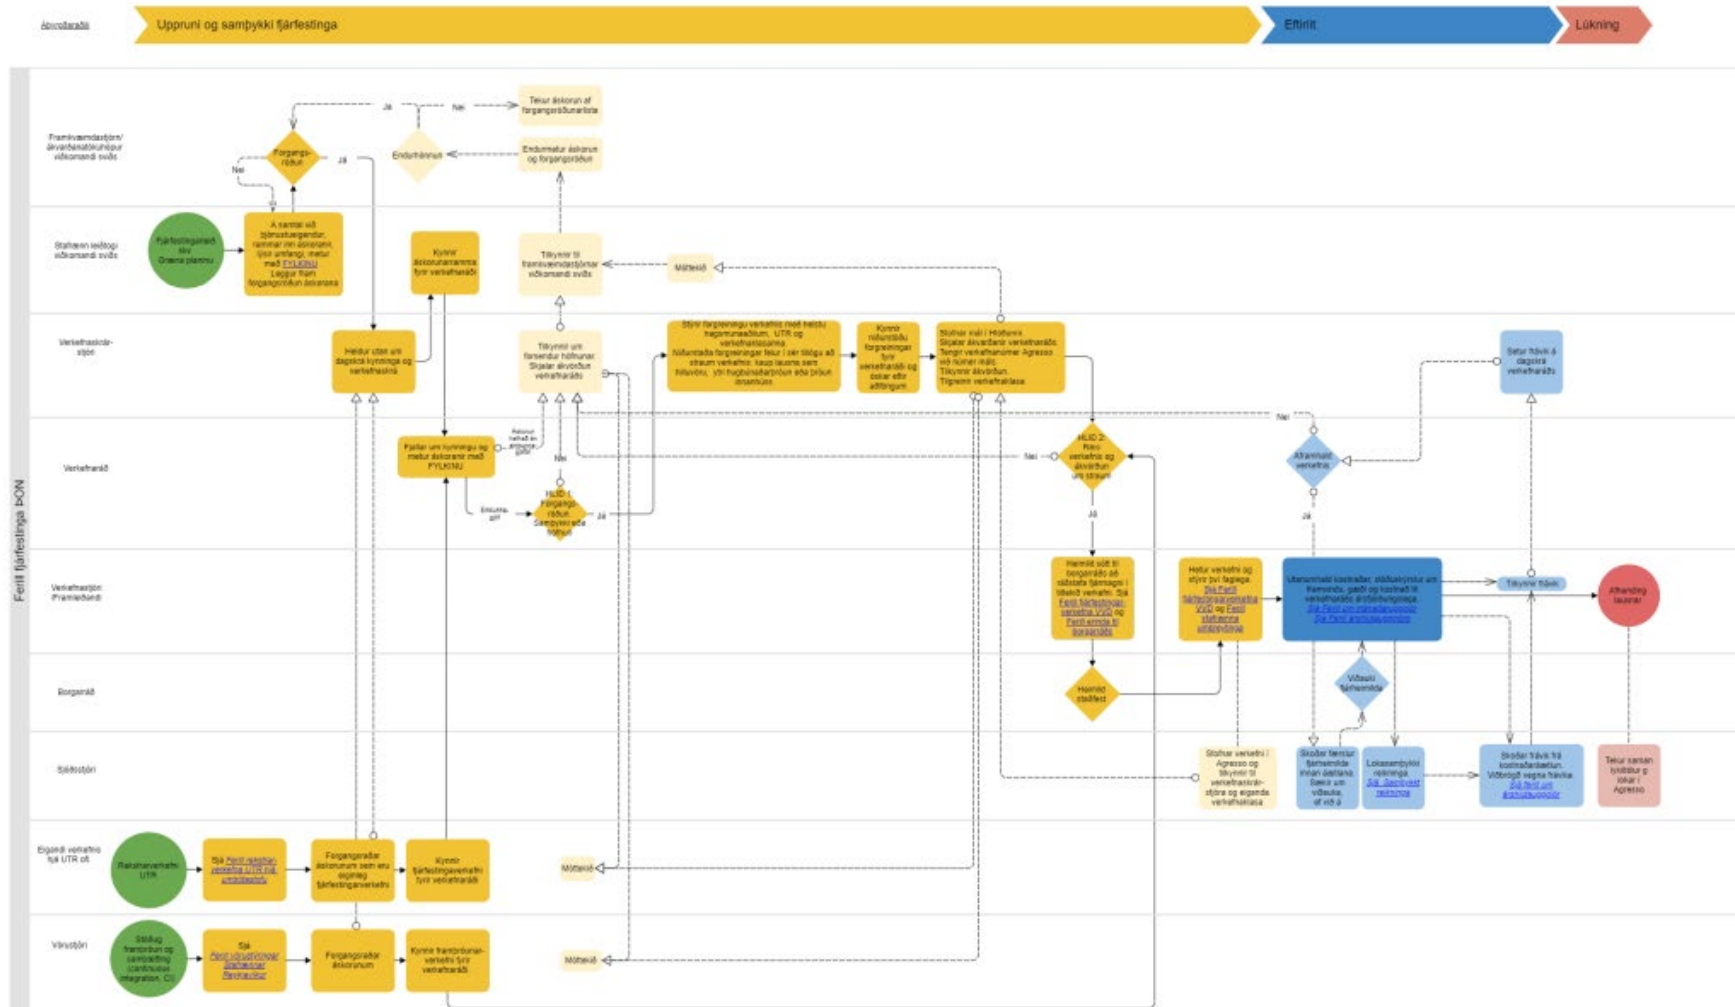



Hvernig lítur áskorunarstrigi út?

- Hér á eftir er dæmi um áskorunarstriga/verkefnatillögu sem berst til verkefnaráðs.
- Þessi tillaga snýst um innkaup/próun/innleiðingu á kerfi til að halda utan um aðsókn í félagsmiðstöðvar borgarinnar.
- Áskorunin snýr bæði að því að starfsfólk hefur ekki yfirsýn yfir væntingar og aðsókn
- Einnig vantar viðmót fyrir foreldra og notendur með greiðslumöguleikakerfi
- Í fylgigögnum sem kom út úr forgreiningu kom fram að fjöldi notenda/barna er allt að 10.000 einstaklingar auk foreldra þeirra og svo fjöldi starfsfólks.
- Vitað er af einum innlendum aðila á markaði sem getur leyst áskoruninni.
- Verkefnið var samþykkt áfram í frekari greiningu og opinberan innkaupaferil.
- Verkefnið skoraði 3,60 í Fylkinu af 5,0 mögulegum. Þar vóg hæst áhrif á þjónustu og fjöldi notenda og mögulegt rekstrarhagræði eða virðisauki.
- Í frekari greiningu á að kanna hvort að möguleg lausn geti nýst fleirum, t.d. frístundaheimilum, skólahljómsveitum osfrv.
- Verkefnastofa stafrænnar Reykjavíkur vinnur verkefnið áfram að næsta ákvarðanahliði.



Félagsmiðstöðvarkerfi

Dagsetning
14.06.2022

Svið/skrifstofa
SFS

Tegund

Vefverkefni
Umbreyting
Innkaup
Gagnaverkefni

Þátttakendur

Fristundaskrifstofa
Stafrænn leiðtogi
Starfsfólk fri - borgarmiðstöð
Starfsfólk - félagsmiðstöðva

Hver er áskorunin?

Í dag eru tæplega 10.000 nemendur sem eiga möguleika á að sækja félagsmiðstöð. Ekkert kerfi er til að halda utan um starfið og til að vera í samskiptum við forsýraraðila og nemendur. Mikil þörf er til að fara þetta til nútímans og þörf er fyrir að geta tekið á móti greiðslum til að fjármagna L.d. rútuferð í Bláfjöll o.fl.

Nánari lýsing

Svarið eftirfarandi spurningum:

- Hver er staðan í dag?
 - Ekkert kerfi er til staðar til að halda utan um starfið, fylgjast með matningu, taka á máli skráningum og innheimta greiðslu. Notast er við Excel skjöl, samfélagsmiðla og síðan er skólinn fenginn til að senda tölvupásta til þess að ná til krakkanna. Innheimt er fyrir viðburði með peningagreiðslum með tilheyrandi dhættum. Starfið er mjög takmarkað í dag sökum stöðunnar.
- Hvað hefur gerst?
 - Þú ert að framkvæma þarfagreiningu fyrir 2 árum síðan sem nýtist fyrir þetta verkefni, en gæti þurft að stílla af. Undanfarið hefur markaðurinn verið kannaður og skoðaðir möguleikar á að nýta nýjar lausnir sem eru til á markaðnum í dag og hafa sumhver þegar gríðarlega útbreiðslu.
- Hvaða lausnir eru í notkun?
 - Excel skjöl, samfélagsmiðlar, tölvupóstlistar hjá Mentor.
- Hvað gerist ef við gerum ekki neitt?
 - Afram engin vettvangur fyrir starfið, mjög takmarkandi og erfitt að ná til þjónustuþega
- Hvern hefur þetta áhrif á?
 - Starfsfólk, nemendur og forsýraraðila

Stuðningsspurningar

- Hvað?
- Hvernig?
- Hvenær?
- Afhverju?
- Hver?

Þekkingarstriqi

Ef þörf á djúpri greiningu er gott að nota þekkingarstrigann

Hagaðillar

Merkið inn á hagaðilakortið.

Hverjir eru:

- Ómissandi: Nemendur, forsýraraðilar og starfsfólk
- Mikilvægir: Fristundaskrifstofa borgartúni og borgarmiðstöðva
- Athyglisverðir: Tölræðideild SFS, forvarnarstarf.

Eigandi

Hver er eigandi? - Soffía Pálsdóttir, fagstýra fristundaskrifstofu

Eigandi veitir verkefni brautargengi á verkefninu á sviðinu þínu? Tekur ákvarðanir og leggur til starfsfólk.

Notendur

Hverjir eru notendur lausnarinnar?

Nemendur 10.000
Forsýraraðilar 20.000
Starfsfólk 250

Stærð / Umfang



Fjármagn

Óskað er eftir að PON fjármagni verkefnastjórn á verkefninu og þann kostnaða sem felur fram að og við innleiðingu. Þegar lausnin er komin rekstur tekur sviðið við. (t.d. vinna við útböð, GDPR o.fl.)



Forgangsröðun útfrá stefnum og gildum

STEFNA	LÝSING	ÁHRIF					STEFNA
		1 = ENGIN	2 = LÍTIL	3 = MIÐLUNGS	4 = MIKIL	5 = MJÖG MIKIL	
1	Virðisauki	Enginn eða óverulegur ábati eða virðisauki. Jafnvel bara kostnaður	Einhver virðisauki eða ábati fyrir starfsfólk eða starfsemi Reykjavíkur eða fyrir íbúa	Einhver virðisauki eða ábati fyrir starfsfólk, starfsemi Reykjavíkurborgar og íbúa	Mikill virðisauki eða ábati fyrir starfsfólk og starfsemi Reykjavíkur eða fyrir íbúa	Mikill virðisauki eða ábati, bæði fyrir starfsfólk og starfsemi Reykjavíkur og fyrir íbúa	Áhersla Reykjavíkurborgar
2	Stuðningur við grunnrekstur, upplýsingatækninnviði og gagnadrifna ákvarðanatöku	Enginn stuðningur við og/eða er ótengt upplýsingatækninnviðum og/eða skapar rekstrarþörf og eykur tæknilegt flækjustig	Lítill stuðningur við upplýsingatækninnviði og lítill ábati í rekstri eða tæknilegri einföldun og hefur áhrif á fáa starfsmenn	Töluverður stuðningur og einföldun á upplýsingatækninnviðum og hefur áhrif á litla starfseiningu innan borgarinnar	Mikill stuðningur, útfösun kerfis, einföldun rekstrarumhverfis og hefur áhrif fyrir stóra einingu og/eða fjölda starfsmanna	Mjög mikill stuðningur, útfösun kerfa, einföldun rekstrarumhverfis. Hefur áhrif bæði fyrir starfsmenn og íbúa jafnframt sem það stuðlar að sjálfvirknivæðingu og gagnadrifinni ákvarðanatöku	Stefna um nýtingu upplýsingatækni og gagnastefna
3	Lagalegar kröfur	Ekki lagalegar kröfur að fara í verkefni	Lagaleg krafa er til staðar	Lagaleg krafa milli 5 til 10 ára	Lagaleg krafa innan 3 ára	Lagaleg krafa sem við erum ekki að uppfylla	Lagalegar kröfur
4	Áhrif á þjónustu og fjöldi notenda	Engin áhrif á upplifun	Jákvæð áhrif á lítinn hóp innan eða utan Reykjavíkurborgar	Jákvæð áhrif á lítinn hóp innan og utan Reykjavíkurborgar	Mjög jákvæð áhrif á stóran hóp innan og/eða utan Reykjavíkur	Mjög jákvæð áhrif á stóran hóp innan og utan Reykjavíkur	Þjónustustefna / Mannauðsstefna
5	Styður við Græna planið	Styður ekki við græna planið		Styður að mestu leyti við græna planið		Styður við Græna Planíð og aðrar stefnur borgarinnar sem eiga við tillöguna	Græna planið
6	Stuðlar að auknu jafnrétti og/eða mannréttindum	Viðheldur misrétti eða stuðlar að auknu misrétti	Stuðlar að jafnrétti að litlu leyti	Lyftir jaðarsettum hópum eða kynjum til móts við kerfið	Sveigir kerfið í átt að jaðarsettum hópum eða kynjum	Lyftir upp jaðarsettum hópum og sveigir kerfið	Jafnréttisstefna / Mannréttindastefna



VERKEFNI	TEGUND VERKEFNIS	SVIÐ/DEILD	ÁHRIF Á STEFNU							HEILDAR SKOR
			Virðisauki 20%	Stuðningur við grunnrekstur, upplýsingatækninnviði og gagnadrifna ákvarðanatöku 27%	Lagalegar kröfur 33%	Áhrif á þjónustu og fjöldi notenda 7%	Styður við Græna planið 7%	Stuðlar að auknu jafnrétti og/eða mannréttindum 7%		
Heimþjónusta og búsetukerfi	Verkefnastofa	VEL	5	5	5	5	5	5	5,00	
Innritun í Grunnskóla	Umbreyting	SFS	5	5	5	5	5	5	5,00	
Betri borg fyrir börn - Skólaþjónustan	Umbreyting	VEL / SFS	4	5	5	5	5	5	4,80	
Rafrænar undirritanir	Umbreyting	PON	5	5	2	5	5	5	4,00	
Stafræn umbreyting á akstursþjónustu	Forgreining	VEL	5	5	2	5	5	5	4,00	
Humarinn	Forgreining	SSB	5	5	2	4	5	2	3,73	
Sundlaugar Reykjavíkur - Gögn og sjálfsafgreiðsla - P	Umbreyting / Gagnaþjónusta	ÍTR	5	5	1	5	5	5	3,67	
Upplýsingagjöf til foreldra eða forráðamanna leikskólabarna	Vefverkefni	SFS	5	4	2	5	5	4	3,67	
Hverfasjá	Verkefnastofa	USK	5	4	2	5	5	4	3,67	
Mínar síður - Container	Umbreyting	PON	5	5	1	5	5	3	3,53	
Gagnavinnslustöð *	Gagnaþjónusta	PON	5	5	1	5	5	3	3,53	
Nýjar tengingar á vef borgarbókasafns	Vefverkefni	MOF	3	3	4	3	5	4	3,53	
Hvati - Gagnatenging og framsetning / Mínar síður - A	Gagnaþjónusta	ÍTR	4	4	2	5	5	4	3,47	
Álagninga og málakerfi (Íbúakort/sambætting)	Verkefnastofa	USK	5	5	1	5	5	2	3,47	
Misferilsgátt	Verkefnastofa	SBB	3	1	5	3	5	5	3,40	

Ekki kynnt og skorað
Ekki farið af stað
Farið af stað
Lokið



STÓÓRA

MYNDIN



Verkefnum lokið

Verkefnaskrá PON

Staða verkefnis

Multiple selections

Bucket

All

User

All

Label


All

Staða verkefna




Lokið

Bucket

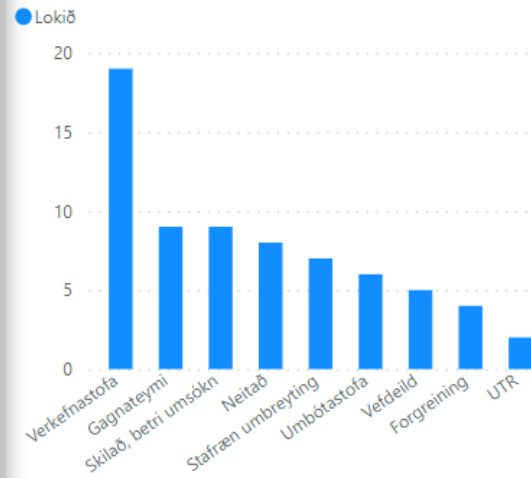

Lokið

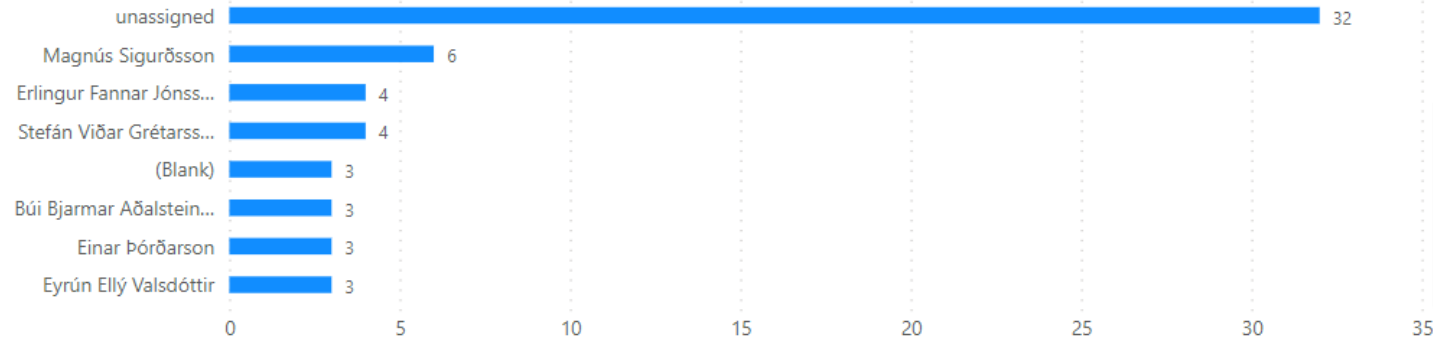

Verkefnaheiti

Verkefnaheiti	Stofnað	Hófst	Skilafrestur	Skiladagur
Álagninga og málakerfi og afgreiðsla íbúakorta bílastæðasjóðs - USK	12.10.2020 13:04:31	12.10.20		30.08.22
Bakendi á fjárhagsaðstoð - VEL	12.10.2020 11:16:51	12.10.20		02.12.21
Beiðnakerfi (Jira) - PON (UTR)	14.10.2020 11:07:01	14.10.20		08.03.22
Betri borg fyrir börn: Tæknilegur ráðgjafi - VEL	16.11.2020 13:10:50	01.11.20		08.03.22
Business Books - Innleiðing vefviðmóts Agresso - FÁST	12.11.2020 10:58:20	01.01.20	28.02.21	22.04.21
CRM kerfi fyrir Kosningar - SBS	26.10.2020 15:22:57	21.01.21		30.08.22
DevOps - Uppsetning á þróunarumhverfi - PON	20.1.2022 09:27:37			23.06.22
Dokobit - Rafrænar undirritanir - Starfsmannagátt	23.8.2021 10:13:56	25.08.21	30.09.21	24.02.22
Fjárhagsaðstoð - Fasi 2	23.8.2021 10:15:10			23.06.22
Flutningur barnaverndar	8.3.2022 09:10:05	01.12.21	31.08.22	31.08.22
Fönix, endurfæddur Fróði: Nýr innri vefur fyrir starfsmenn sem er hugsaður uppá nýtt frá grunni. - MOS	15.10.2020 14:59:44	15.10.20		18.08.21
Fræðsla og miðlun í fjölskyldu- og húsdýragarði	20.9.2021 11:05:07			02.12.21
Frístundastyrkur - aðgengi og upplýsingar	20.9.2021 11:04:32	29.11.21	17.02.22	11.08.22
Gaunavinnslustöð - PON (Gaunabiðnusta)	13.10.2020 09:43:12	13.10.20		08.03.22

Lokið

Lokið 69



Verkefni í vinnslu

Verkefnaskrá PON

Staða verkefnis

Multiple selections

Bucket

All

User

All

Label

All


Staða verkefna




Í vinnslu

Bucket

Í vinnslu

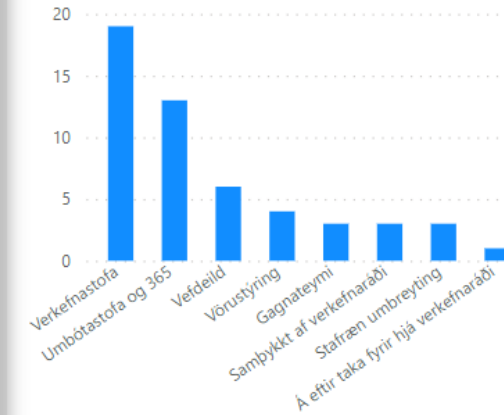

Í vinnslu

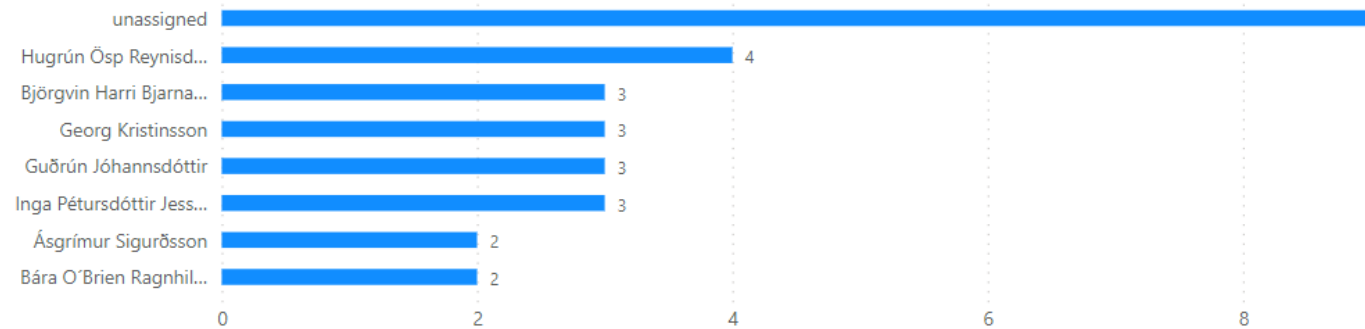

Verkefnaheiti

Verkefnaheiti	Stofnað	Hófst	Skilafrestur	Skiladagur
Álagninga og málakerfi og afgreiðsla íbúakorta bílastæðasjóðs - USK	12.10.2020 13:04:31	12.10.20		
Alþjónusta við prentumhverfi	8.3.2022 09:06:14	30.11.21	01.04.23	
Betri borg fyrir börn - Skólaþjónustan	7.9.2021 09:39:47	17.01.22		
CRM kerfi fyrir Kosningar - SBS	26.10.2020 15:22:57	21.01.21		
Eignaumsjónakerfi	12.11.2020 11:02:55	01.02.19	30.11.22	
Eldhúsumsjónakerfi Reykjavíkurborgar - VEL & SFS + Matarstefnuhópur	12.11.2020 11:13:51	01.10.19		
Endurskipulagning fjármála UTR - PON	12.11.2020 11:30:26	01.10.20	31.12.22	
Erindreki - USK	12.11.2020 11:21:36	01.01.20		
Fjárhagsaðstoð	20.1.2022 09:25:43	01.02.22	20.04.22	
Flutningur barnaverndar	8.3.2022 09:10:05	01.12.21	01.05.22	
Fræðslukerfi Reykjavíkur - TORGIÐ - MOS	12.11.2020 11:22:34	01.08.20	31.10.22	
Hvirfilvindur: umbætur á viðburðadagtalni borgarinnar - MOF	30.10.2020 16:04:10	01.04.20	30.09.22	
Innleiðing á fjarfundarbúnaði	8.3.2022 09:11:25	01.09.21	31.12.23	
Innleiðina HIðönnar - PON	12.11.2020 11:12:53	01.10.19		

Ekki hafið & Í vinnslu

Ekki hafið & Í vinnslu 52



Hvaða verkefni eru í gangi núna?

Afgreiðslukerfi+birgðarkerfi f MOF	1	HR	Hugrún Ösp Reynisdóttir
Alþjónusta við prentumhverfi	3/10	RG	Ragnheiður Þórdís Gylfadóttir
Atlassian / Jira - Þjónustulausn UTR / ÞON / Reykjavíkur	1	SK	Snædís Zanoria Kjartansdóttir
Betri borg fyrir börn - Skólaþjónustan	1	HG	Helga Lára Grétarsdóttir
Dýraþjónusta RVK	1	HR	Hugrún Ösp Reynisdóttir
Eignaumsjónakerfi	1	HH	Hugrún Elfa Hjaltadóttir
Eitt auðkenni fyrir starfsfólk		SG	Sævar Guðbergsson
Eldhúsumsjónakerfi Reykjavíkurborgar - VEL & SFS + Matarstefnuhópur		GK	Georg Kristinsson
Endurskipulagning fjármála UTR - ÞON		BB	ÓB
Endurskoðuð tillaga um frístund.is + úrræðakort	3	EJ	JJ
Erindreki - USK		KJ	Kristjana Nanna Jónsdóttir
Fjárhagsaðstoð	1	IJ	Inga Pétursdóttir Jessen
Framhlið íbúalýðræðis	1	SL	ÁB
Framkvæmdasjá - USK	1		
Fræðslukerfi Reykjavíkur - TORGIÐ - MOS		SK	ÓE
Félagsmiðstöðvar - greining á kerfi	1	SG	JJ
Gagnsjá - SSB		JÁ	Jóhann Jökull Ásmundsson
Grunngagnaverkefni SAP	2	HR	Hugrún Ösp Reynisdóttir
Heimaþjónusta og búsetukerfi	1	ÞÓ	Þröstur Elvar Óskarsson
Hraðamælinga og talningagögn á myndrænt form í Borgarvefsjá - USK	1/2	VA	Velina Apostolova
Hverfasjá - USK	3	SL	Salvör Gyða Lúðvíksdóttir

Task title ↓		Assigned to
Hraðamælinga og talningagögn á myndrænt form í Borgarvefsjá - USK	1/2	VA Velina Apostolova
Hverfasjá - USK	3	SL Salvör Gyða Lúðvíksdóttir
Hverfið mitt 2.0 - MAR	1	SL Salvör Gyða Lúðvíksdóttir
Hvirfilvindur: umbætur á viðburðadag tali borgarinnar - MOF	0/1	IE Ingunn Eyþórsdóttir
Innleiðing Hlöðunnar - ÞON	6/6	KJ Kristjana Nanna Jónsdóttir
Innleiðing á fjarfundarbúnaði		
Innritun í grunnskóla - SFS		KB HE
Jafnlaunakerfi á ytri vef		ÓH Ólafur Sólimann Helgason
Jira innleiðing		SK Snædís Zanoria Kjartansdóttir
Kennsla, reglur og leiðbeiningar fyrir 365		RS RL
Leikskólainnritun		JJ KB
Lóðaumsóknir - SBB	1	
Miðlægt atvikaskráningarkerfi fyrir Reykjavíkurborg - FAS	0/1	HH Hugrún Elfa Hjaltadóttir
Myndræn framsetning á innkaupaferli - FÁST		HR Hugrún Ösp Reynisdóttir
Mælaborð borgarbúa 2.0		HE Heiðar Atli Emilsson
Mínar síður		EG Erla Rós Gylfadóttir
Mötuneytiskerfi - FÁST	1/2	
Netskápar - útskipting		EP LL
Nýjar tengingar á vef Borgarþókasafnsins - MOF	0/1	GJ Guðrún Jóhannsdóttir



Hvaða verkefni eru í gangi núna?

Nýr vefur Borgarskjalasafnsins: breytingar á verkefninu	AS	Ásgrímur Sigurðsson
Nýr vefur fyrir Borgarskjalasafnið - ÞON	AS	Ásgrímur Sigurðsson
Poc verkefni - kannanahugbúnaður	HS AF	
Poc verkefni - Tilkynningakerfi UTR þjónusta	AG KK	
Rafræn jafnréttisskimun - MAR	IG	Inga Rós Gunnarsdóttir
Rafrænar beiðnabækur - FAS		
Rafrænar byggingarleyfisumsóknir - USK	EV	Eyrún Elly Valsdóttir
Rafrænar jafnréttisskimanir	IG	Inga Rós Gunnarsdóttir
Rafrænar Undirritanir	HE	Heiðar Atli Emilsson
Rafrænt samþykki - ÞON		
Reykjavíkurfest: Hátíðarvefir borgarinnar - MOF	GI	Guðrún Jóhannsdóttir
Ráðgjafinn part 2	U	Inga Pétursdóttir Jessen
Saltfiskur 2.0	KJ	Kristjana Nanna Jónsdóttir
Sameignardrif /Sharepoint	RS	Ragna Stefánsdóttir
Samráðsgátt - MAR	SL	Salvör Gyða Lúðvíksdóttir
Samskiptalausn fyrir framlínuþjónustu v2.0 - ÞON	JÁ	Jóhann Jökull Ásmundsson
Sjálfvirkt eignaskráningarkerfi (Insight) - ÞON (UTR)	BB	Björgvin Harri Bjarnason
Sjálfvirkt eignaskráningarkerfi (Insight) - ÞON (UTR)	BB	Björgvin Harri Bjarnason
Skipuritsleikar: Framsetning skipurita á vefnum - SSB	AS	Ásgrímur Sigurðsson

Spjallmenni - greining	AG SH	
Spálíkön velferðarsviðs	IG	Inga Rós Gunnarsdóttir
Stafræn gróska	HS	Helen Símonardóttir
Starfsmannagátt Reykjavíkurborgar - MOS		
Starfsumsóknakerfi	SL	Salvör Gyða Lúðvíksdóttir
Starfsumsóknarkerfi - MOST	SL	Salvör Gyða Lúðvíksdóttir
Starfsvottorð, vefumsóknarform og afhending - FÁST	BA HT	
Stofnskrá	BB	Björgvin Harri Bjarnason
Stofnskrá - réttleiki gagna	BB SG	
Styrkjagátt - FÁST	GK	Georg Kristinsson
Talgreinaþjónusta Borgarstjórnarfunda	AB HR	
TeamsVoice - Símkkerfi	JÁ AG	
Tæknileg innleiðing 365	SS	Sigurlaug Björg Stefánsdóttir
Umbreyting á akstursþjónustu - VEL	U	Inga Pétursdóttir Jessen
Umferðagreining úr núverandi myndavélab únaði - USK	VA	Velina Apostolova
Umsóknir fyrir húsnæðisþjónustu - VEL	ÓH	Ólafur Sólimann Helgason
Upplýsingagjöf til foreldra eða forráðamanna leikskólalabarna - SFS	GI	Guðrún Jóhannsdóttir
Uppsetning og rekstur á áhættustjórnunarkerfi fyrir borgina - FÁST	HH	Hugrún Elfa Hjaltadóttir
Ut anumhald hugbúnaðarleyfa - SAM	AG	Árni Björn Gestsson
Uthýsing á vélasal	BR	Bára O'Brien Ragnhildardóttir
Vefur borgarsögusafns og listasafns Reykjavíkur - MOF	IE	Ingunn Eyþórsdóttir



Hvaða verkefni eru í gangi núna?

<input type="radio"/>	Verkefnastjóri með umbreytingu og innsetningu gagna í Scope umslukerfið - ...	1/1	
<input type="radio"/>	Verkefnastjórnunartól - Jira Solutions		SK Snædís Zanoria Kjartansdóttir
<input type="radio"/>	Verslunar og aðgangveitingavefur - ÞON	0/2	SK ÁG
<input type="radio"/>	Vinnsluskráning Reykjavíkurborgar		HH Huguína Elfa Hjaltadóttir
<input type="radio"/>	ÍTR - sjálfsafgreiðsla og sjálfvirkni í sölu á sundkortum	1	ÞÓ Þróstur Elvar Óskarsson
<input type="radio"/>	Útboð á færsluhirðingu - FÁST	0/1	HR Huguína Ösp Reynisdóttir
<input type="radio"/>	Útgjöld borgarinnar - Eftirlit		IG Inga Rós Gunnarsdóttir
<input type="radio"/>	Þráðlausir punktar og mælingar í skólum		LL EP



Sýnileiki og áhrif verkefna á starfsemi

High Profile – Low Impact

- Stafræn sundkort og sjálfsafgreiðsla
- Samræmd vefmál á rvk.is

High Profile – High Impact

- Stafræn gróska
- Stafrænt ráðningakerfi
- Heimapjónustu og búsetukerfi

Low Profile – High Impact

- Grunnagnaverkefni SAP
- Samræmd stafræn eldhúsumsjón
- Torgið stafrænt fræðslukerfi
- M365 innleiðingin
- Framhlið íbúalýðræðis
- Stafrænt eignausmsjónakerfi




Það sem gengur mjög vel núna

- Skriðþungi og skilningur á sviðunum
- Stafrænir leiðtogar
- Þroski á verkefnaumsýslu (project governance)
- Leikskólavefir og miðstýrðir vefir
- Stafræn gróska
- Horft á verkefni út frá stóru myndinni (mötuneytisumsýslan)
- Grunngagnaverkefnið
- Vörustýringarhugtakið er að skila sér inn alls staðar
- M365 umhverfið og Hlaðan
- Rannís styrkur vegna þróunar pólsks-íslensks þýðingarminnis



Stórar áskoranir núna

- Ákveðinn skortur á umbreytingarafli á sviðunum
- Fjöldi verkefnatillagna sem snýr að innri þjónustu – mikil tækifæri
- Stafræn gróska og persónuvernd (Google Classroom og Chromebooks)
- Að setja stafræna þróun í miðjuna á stefnumótun og starfsemi nokkurra sviða
- Að setja mikinn kraft í hvers konar gagnainnviði



Reykjavík
