



Borgarráð

Umsögn um fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins vegna bragga og umsögn um fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og áheyrnarfulltrúa Miðflokksins og Flokks fólksins um yfirlit yfir framkvæmdir við braggann í Nauthólsvík.

Á fundi borgarráðs 6. september sl. lagði áheyrnarfulltrúi Flokk fólksins fram eftirfarandi fyrirspurn:

„Óskað er eftir upplýsingum um umframkostnað vegna bragga að Nauthólsvegi 100.“

Á fundi borgarráðs 6. september sl. lögðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins og Miðflokksins fram eftirfarandi fyrirspurn:

„Óskað er eftir sundurliðuðu og rekjanlegu yfirliti yfir framkvæmdir við braggann í Nauthólsvík frá því þær hófust. Lögð var fram í borgarráði þann 6. september 2018 fundargerð Innkauparáðs sem innihélt m.a. yfirlit skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar vegna Nauthólsvegar 100, með vísan í bókun á síðasta fundi ráðsins þar sem óskað var eftir því að fá yfirlit yfir allar greiðslur sem Reykjavíkurborg hefur innt af hendi vegna Nauthólsvegar 100 á árunum 2017 og 2018. (Bragginn í Nauthólsvík). Fulltrúar stjórnarandstöðunnar óskuðu eftir að fá yfirlitið sent og þegar það er skoðað er það ákaflega ófullkomið í ljósi upplýsinga sem borgarfulltrúar verða að hafa til að geta sinnt eftirlitsskyldu sinni með fjárstjórnarvaldi borgarinnar. Einungis eru gefnir upp verkliðir og upphæðir.“

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Með deiliskipulagsbreytingu árið 1998 voru húsin sem um ræðir í Nauthólsvík friðuð. Um er að ræða endurbyggingu á bragga, skemmu og svokölluðu náðhúsi auk nýrrar tengibyggingar þar á milli. Bragginn er einungis um þriðjungur af framkvæmdinni og því ekki hægt að tala um braggann sem eina byggingu.

Í deiliskipulagi var gert ráð fyrir að þarna yrði stríðsminjasafn. Ljóst var að húsin voru illa farin og voru þau nýtt að hluta undir geymslur fyrir ÍTR en jafnframt nýtti Svifflugfélag Íslands húsin. Litlar leigutekjur voru af húsunum og var viðhald þeirra ekkert. Útlit þeirra á þessum stað var alls ekki forsvaranlegt, þau voru útkrotuð og þegar upp kom brúni í þeim varð útlit þeirra enn hrörlegra. Það var þess vegna farið að huga að því með hvaða hætti mætti gera húsin upp og finna þeim einhverja þá notkun sem að hæfði. Ekki var áhugi á að opna þarna stríðsminjasafn og var því ákvæði deiliskipulagsins breytt en ekki var aflétt svæðisverndun af húsunum.

Árið 2013 var auglýst eftir áhugasömum aðilum til að sjá um rekstur í húsunum. Ekki náðust samningar við þá aðila sem að lögðu inn hugmyndir. Þá var ástand húsanna orðið þannig að

ekki varð við unað og ljóst að það þurfti að finna einhverja lausn. Svæðisverndun húsanna væri að öðrum kosti tilgangslaus þar sem þau voru að grotna niður. Var þá leitað eftir samningum við Háskólann í Reykjavík (HR) um aðkomu að notkun húsanna enda skólinn í stuttu göngufæri við húsinn og líklegt að skólinn gæti nýtt húsnaðið þannig að tryggja mætti viðvarandi starfsemi þar.

Hluti Nauthólsvegar 100, braggi, skemma og náðhús var því leigt til HR með leigusamningi dags. 25.09.2015. Í leigusamningi kemur fram leiguupphæð grundvölluð á frumkostnaðaráætlun Verkfræðistofunnar Eflu þar sem breytingakostnaðurinn er áætlaður kr. 158.000.000 (kr. 169.000.000 á núverandi verðlagi). Auk þess eru í leigusamningnum ákvæði um að umframkostnaður muni að 1/3 leiða til hækkunar leigu en að 2/3 muni Reykjavíkurborg taka á sig hækkun framkvæmdakostnaðar. Til grundvallar frumkostnaðaráætlunar voru eingöngu þær hugmyndir um endurgerð sem fram koma í umræddum samningi, en ekki lágu fyrir hönnunargögn og öllum ljóst að mikil óvissa var í kostnaðaráætluninni.

Þann 12.07.2017 voru samþykktar fyrstu bygginganefndarteikningar af breytingum á húsunum. Þær víkja nokkuð frá þeim hugmyndum sem fram koma í samningi, en þær voru unnar í samstarfi við HR og ákveðið að hafa fullbúnara eldhús sem krafðist t.d. meira útsogs, fituskilju og sterkara inntaks rafmagns en ella.

Við útfærslu hönnunar var haft samráð við Minjastofnun og borgarminjavörð sem komu með ábendingar sem farið var eftir þó þær útheimtu dýrari útfærslur en ella, t.d. eru ekki þakrennur á skemmunni heldur er þakjárnið teyggt út fyrir útvegginn sem gerir meiri kröfur um festingu þess, járngluggar voru endursmíðaðir í upprunalegri gerð, og haldið var eftir því sem mögulegt var af upprunalegu byggingunum. Sótt hafði verið um heimild til byggingafulltrúa um fá að að rífa eitt húsið sem hafði brunnið, náðhúsið, sem var vísað til Minjastofnunar og var svar stofnunarinnar túlkað sem höfnun. Þá var hannað stálvirki um húsið þar sem útveggir þess uppfylltu ekki kröfur um að standast álag, sama stálvirki myndar burð fyrir þakið sem húsið stóð ekki undir. Þetta allt kallaði í umtalsverðan aukakostnað. Þeirri byggingu er ekki lokið og vantar um 20-30% uppá að ljúka henni. Að öðru leyti er breytingunum lokið af hálfu Reykjavíkurborgar.

Kostnaðaráætlun var endurskoðuð í lok árs 2016 og gerði Verkfræðistofan Efla endurskoðaða kostnaðaráætlun kr. 215.000.000. Hún var svo aftur endurskoðuð í júní 2017 um svipað leyti og bygginganefndarteikningar lágu fyrir og þá var áætlunin kr. 237.000.000. Kostnaður vegna minjaverndar (friðunar) þá var kominn í tæplega kr.70.000.000.

Ákveðið var að fara í hönnun og gerð lóðar sem myndi hæfa húsunum og var valið að nota efni sem til hafði fallið við endurgerð húsanna að hluta, t.d. ber við augu að efni úr bragganum, sem var tekinn niður að hluta, sem mynda bogadregin form á steypum skjólveggjum. Kostnaður vegna lóðarinnar var því talsvert hár eða kr. 27.000.000.

Allan hönnunar- og verktímann voru haldnir verkfundir með HR.

HR hefur síðan farið í framkvæmdir á sinn kostnað og samkvæmt eigin vali á innréttingum í húsunum, má þar nefna setbekki, ljósakappa o.fl. Eftir er að ganga frá uppgjöri á smíði bars/afgreiðsluborðs þar sem HR ber helming kostnaðar vegna óska um búnað og gerð sem fór fram úr áætlunum um kr. 1.500.000.

Skýra má mismun á fyrstu og annari kostnaðaráætlun sem aukningu við endanlega bráðabirgða hönnun húsanna og mismun frá annari kostnaðaráætlun til núverandi niðurstöðu sem aukningu vegna lóðar og fjölmörgum óvissuliðum, sem ekki koma fram í áætlunum.

Einnig er miðlægur kostnaður borgarinnar kr. 12.500.000 inn í þessum tölum.

Á verktímanum september 2015 - september 2018 hefur launavísitala Hagstofunnar hækkað um 24% og byggingavísitala um 9%. Það jók svo enn á vandann að ekki var kostur á að bjóða verkefnið út enda verkþættir smáir og sérhæfðir og nánast í hönnun á verktíma vegna eðli bygginganna. Því til viðbótar var verið að vinna þetta á tíma þar sem mikil þensla og launaskrið var í byggingarstarfsemi og drógust framkvæmdir því mikið.

Borgarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. ágúst 2018 auknar fjárveitingar til verkefnisins.

Óli Jón Hertervig

Hjálagt:

Sundurliðun kostnaðar vegna endurbyggingar dags. 17.09.2018

Minnisblað dags. 6. september 2018 vegna tilboða fyrir endurbyggingu við Nauthólsveg 100

Bréf Minjastofnunar Íslands frá 25. júlí 2016

Húsaleigusamningur við Grunnstoð ehf. dótturfélag Háskólans í Reykjavík dags. 25. september 2015

Viðgerðartillögur og Frumkostnaðaráætlun verkfræðistofunar EFLU dags. júlí 2015

Fornleifaskrá og húsakönnun Minjasafn Reykjavíkur skýrsla nr. 161, október 2013

Nauthólsvegur 100

Minnisblað vegna tilboða í enduruppbyggingu við Nauthólsveg 100 17. september 2018

Minnisblað þetta er unnið fyrir Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar. Því er ætlað að lýsa verkefninu og grein fyrir því hvernig staðið var að uppbyggingunni.

Verkefnið fólst í:

1. Endurbyggingu á bragga frá stríðsárunum með steypu anddyri.
2. Endurbyggingu á skála frá stríðsárunum.
3. Endurbyggingu á náðhúsi frá stríðsárunum.
4. Byggingu þriggja nýbygginga sem tengja saman ofantaldar byggingar. Það eru:
 - a. Inngangsbygging sem hýsir auk anddyris, tæknirými fyrir allar byggingarnar
 - b. Millibygging sem tengir saman húsin þrjú. Hún inniheldur öll votrými, þ.e. snyrtingar og fullbúið veitingaeldhús.
 - c. Útbygging á skála sem hýsir fundaraðstöðu.
5. Gerð umsvifamikils útisvæðis sem þjónar öllum borgarbúum.

Helstu framkvæmdaaðilar

Gerður var samningur við: arkitekta, landslagsarkitekt, verkfræðinga og verkefnisstjóra á grundvelli umsamins tímagjalds.

Gerður var samningur við: verktaka, byggingastjóra og húsasmíðameistara á grundvelli umsamins tímagjalds.

Aðrir meistara á verkinu: múrarmeistari, rafvirkjameistari, málarmeistari, pípulagningameistari og blikksmíðameistari voru ráðnir ýmist á grundvelli einingaverða, tilboðsverða eða umsamins tímagjalds.

Helstu verkþættir

- Niðurrif á bragga og hreinsun á skemmu.
- Jarðvinna á lóð.
- Lóðarframkvæmd
- Uppbygging og efniskaup.
- Stálsmíði á gluggum fyrir náðhús og skála.
- Innréttinga- og innihurðasmíði

Stutt yfirlit yfir verkefnið

Segja má að um sé að ræða þyrpingu húsa. Verið er að gera upp og endurbyggja þrjú hús frá stríðsárunum, byggja þjár nýbyggingar og úbúa útirými fyrir almenning.

Strax í upphafi verks reyndist ógerlegt annað en að endurbyggja braggann (sem nú hefur fengið hlutverk veitingastaðar) að undanskildum austurgaflvegg og steinsteyptum inngangi í tengslum við hann. Bragginn þjónaði sem matsalur Winston Hótels, flugvallarhótels sem reist var í stríðslok.

Bragginn var tekinn niður á varfærnislegan hátt svo nýta mætti upprunalegt efni hans annars staðar og þrýðir það nú lóðina. Farið var í að endurbyggja braggann með nýjum sökklum, steypu gólfi með gólfhita og nýju stálburðarvirki. Bragginn er einangraður og klæddur með bárujárni. Reynt var að fá nýja klæðningu sem var eins og upprunalega klæðningin (læst báruklæðning) en það gekk því miður ekki þar sem hætt hefur verið framleiðslu á henni. Gluggar voru sérsníðaðir í takt við þá sem fyrir voru með minjavernd að leiðarljósi. Steinsteypt inngangsbygging í bragga var einangruð að utan og múruð. Til þess að upprunalegur veggur fengi að njóta sín að innan. Sníðaðir voru nýir timburgluggar og hurðir. Þak inngangsbyggingar var einnig endurnýjað.

Skálinn (frumkvöðlarsetur), sem er með veglegum arni, var setustofa flughótelsins. Farið var í umfangsmiklar steypuviðgerðir á útveggjum og þeir einangraðir og klæddir að innan með gifsi. Skipta þurfti um þak, einangra og klæða með bárujárni. Allir stálgluggar voru endurnýjaðir í upprunalegri mynd. Stór útsýnisgluggi á suðurgaflvegg var sníðaður og þak yfir glugga endurnýjað.

Niðurtekið loft var fjarlægð þannig að burðarsperrur fengju notið sín en við þessa aðgerð hækkaði lofthæðin til muna. Í loft voru settar hljóðísogplötur til að tryggja góða hljóðvist í opnu vinnustofurými frumkvöðlarsetursins. Sett var upp ofnakerfi og saga þurfti í gólf fyrir lögnum. Upprunalegt gólf var slípað upp. Byggð var lítil útbygging við skálann sem þjónar sem fundarherbergi.

Náðhús (fyrirlestra- og fjölnotasalur) var eins og nafnið segir til um salerni hótelsins. Húsið brann en eftir stóðu steinsteyptir útveggir og brenndar burðarsperrur í þaki. Steyptir útveggir voru styrktir með stálburðarvirki og langhlið endursteypt, sérsníðaðir stálgluggar í takt við þá sem fyrir voru og sníðað nýtt þak sem lyft var upp frá útveggjum þannig að brenndar sperrur fengju notið sín. Sperrurnar setja sterkan svip á salinn.

Millibyggingin sem er nýbygging tengir bragga, náðhús og skála saman og hýsir veitingaeldhús með tilheyrandi stoðrymum, salerni fyrir gesti auk starfsmannarýma. Byggingin stingur sér inn í skálann og ofan á henni er tæknirými sem hýsir loftræsikerfi bæði fyrir skálann og eldhúsið. Byggingin er lágreist með sléttu þaki (lágmarkshalli) og klædd með svörtum sementsplötum.


Inngangur og tæknirými er einnig í nýbyggingu, staðsett við norðurhlið bragga. Tæknirými með niðurgroflu lagnarými þjónar allri húsaþyrpingunni. Þessi byggingarluti er lágreistur eins og aðrar nýbyggingar, klæddar sementsplötum.

Þriðja nýbyggingin er byggð til norðurs frá skála og þjónar sem fundarherbergi fyrir frumkvöðlasetrið. Hún er með sama byggingarlagi og þær sem á undan er lýst.

Allar byggingarnar að meðtöldum nýbyggingum og þeirra bygginga sem gerðar voru upp og/eða endurbyggðar hafa ólíka byggingartækni. Hvert og eitt hús er flókið og samskeyti húsabyrpinga mismunandi sem kallar á sértækar lausnir hvers húss fyrir sig.

Verkefnið var unnið með sterk minjasjónarmið í huga þar sem um er að ræða merkar svæðisverndaðar herminjar frá stríðsárunum. Verkið var unnið í nánú samráði við Minjastofnun Íslands og Borgarsögusafn Reykjavíkur. Markmiðið er að gera grein fyrir sögu húsanna bæði innan dyra og á lóð til þess að almenningur geti glöggvað sig á sögu þessara merku bygginga á auðveldan hátt.

Margrét Leifsdóttir arkitekt FAÍ

A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is written in a cursive, flowing style and reads "Margrét Leifsdóttir".

A arkitektar
Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir arkitekt
Margrét Leifsdóttir arkitekt
Tómasarhaga 31
107 Reykjavík



Minjastofnun
Íslands

Reykjavík, 25. júlí 2016
Tilvísun: 201607-0052

Nauthólsvegur 100, Winston hotel, endurbygging húsa frá lokum seinni heimsstyrjaldar

Í tölvupósti 20. júlí 2016 leitar Hólmfríður Jónsdóttir arkitekt eftir umsögn Minjastofnunar Íslands um aðaluppdrætti A arkitekta af endurbyggingu Nauthólsvegar 100, Reykjavík, sem fylgja með erindinu.

Um er að ræða endurbyggingu á þremur húsum sem eftir standa af hóteli sem loftflutningadeild breska flughersins reisti á árunum 1944-45. Vegna aldurs falla byggingarnar ekki undir ákvæði laga um menningarminjar nr. 80/2012. Í húsakönnun Minjasafns Reykjavíkur um Vatnsmýri frá 2012 er bent á að umræddar byggingar myndi heildstæða þyrpingu ásamt öðrum mannvirkjum í Nauthólsvík frá hernámsárunum. Lagt er til að svæðið sem braggarnir standi á njóti svæðisverndar í milligulum flokki skv. Húsverndarskrá Reykjavíkur. Samkvæmt fram komnum tillögum stendur til að endurbyggja þrjá hluta hótelsins, bragga, skemmu og náðhús, og tengja saman með nýbyggingu.

Minjastofnun Íslands hefur að frumkvæði A arkitekta fylgst með mótun hugmynda um endurbyggingu hluta flugvallarhótelsins að Nauthólsvegi 100 og veitt álit á ýmsum atriðum á vinnslustigi hönnunar. Stofnunin fagnar farsælli lausn á endurbyggingu húsanna og telur að í fyrirliggjandi tillögu takist vel að varðveita sérkenni merkra sögulegra minja frá stríðsárunum um leið og húsin eru endurbyggð og aðlöguð nýrri starfsemi. Minjastofnun leggur áherslu á að hæð nýrrar tengibyggingar verði ekki meiri en sem nemur vegg hæð skemmu og náðhúss til að unnt sé að vera að tengja hin þrjú ólíku húsform saman með farsælum hætti. Vegna þess verður lofthæð í nokkrum vot- og gangrýmum minni en áskilið er í reglugerð. Í því sambandi vísar Minjastofnun til undanþáguákvæða byggingar-reglugerðar er varða breytingar á eldri byggingum með sérstakt varðveislugildi.

Virðingarfyllt,
f.h. Minjastofnunar Íslands


Pétur H. Ármannsson
sviðsstjóri umhverfis og skipulags

Afrit í tölvupósti :
Borgarsögusafn Reykjavíkur (minjavarsla@reykjavik.is)
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík (byggingarfulltrui@reykjavik.is)
Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir (frida@arkibullan.is)
Margrét Leifsdóttir (margret@arkibullan.is)

Ákvarðanir Minjastofnunar Íslands sem byggja á lögum um menningarminjar nr. 80/2012, gr. 29., 30., 31., 32., 33., 34. og 35. eru kæranlegar til æðra stjórnvalds, þ.e. forsætisráðuneytis. Jafnframt er vakin athygli á því að skv. 21. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 getur aðili máls óskað eftir skriflegum rökstuðningi stjórnvalds fyrir ákvörðun hafi slíkur rökstuðningur ekki fylgt ákvörðuninni þegar hún var tilkynnt. Beiðni um rökstuðning fyrir ákvörðun skal bera fram innan 14 daga frá því að aðila var tilkynnt ákvörðunin og skal stjórnvald svara henni innan 14 daga frá því hún barst.

HÚSALEIGUSAMNINGUR

landnúmer: 219038, fastanúmer: 202-9677, matshlutar 01, 02, 08 og 09

Undirritaðir gera með sér eftirfarandi samning um leigu á hluta fasteignar að Nauthólsvegi 100, 101 Reykjavík:

Samningsaðilar

Leigusali: Reykjavíkurborg kt. 530269-7609 f.h. Eignasjóðs Reykjavíkurborgar kt. 621102-0220, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Leigutaki: Grunnstoð ehf, dótturfélag Háskólans í Reykjavík (HR), kt 701211-1030, Menntavegi 1, 101 Reykjavík

1. gr.

Hið leigða

Hið leigða er hluti af Nauthólsvegi 100, fastanúmer 202-9677. Um er að ræða fjóra matshluta af eigninni, samtals um 450 fermetrar:

- 01 0101 145,0m²
- 02 0101 210,0 m²
- 08 0101 58,0m²
- 09 0101 33,0m²

2. gr.

Leiguskilmálar og afnot leigutaka

Leigusali er eigandi húseignarinnar að Nauthólsvegi 100, en ástand húsnæðisins er mjög bágborið og þarfnast mikils viðhalds og endurbyggingar. Grunnstoð ehf, dótturfélag Háskólans í Reykjavík (HR) sem leigutaki tekur húsnæðið á leigu f.h. HR undir aðstöðu fyrir nemendur og fyrir frumkvöðla- og nýsköpunarsetur. Nýting húsnæðisins verður tvíþætt. Annars vegar verður aðstaða fyrir viðburði og veitingasölu á vegum HR og nemenda HR. Hins vegar verður aðstaða fyrir nýsköpunar- og rannsóknastarfsemi þar sem nemendur HR, starfsmenn HR og fleiri geta unnið að verkefnum, sprotum, ráðgjöf og öðru því sem tengist nýsköpun og frumkvöðlastarfi.

Leigutaka er heimilt að leigja hluta húsnæðisins út til stúdentafélags HR og til sprotafyrirtækja sem eru í samstarfi við HR. Aðrar tekjur leigutaka verða fyrst og fremst af veitingasölu, og er leigutaka heimilt að vinna með þriðja aðila að framkvæmd veitingasölu.



3.gr.

Leigutími

Leigutímabilið hefst þegar framkvæmdum er lokið og leigutaki tekur við húsnæðinu. Þá fer fram formleg úttekt á húsnæðinu og leigutaki og leigusali skulu verða ásáttir um að húsnæðið sé tilbúið til leigu og lokaúttekt byggingarfulltrúa liggi fyrir. Stefnt er að því að það verði ekki síðar en 1. september 2016. Samningur þessi er til 10 ára, en að þeim tíma liðnum framlengist hann ótímabundið, en gagnkvæmur uppsagnarfrestur eru 12 mánuðir. Taki leigutaki húsnæðið í notkun að hluta til eða allt áður en framkvæmdum er lokið greiðir leigutaki leigu frá þeim tíma að hluta til eða öllu leiti.

4.gr.

Leigukjör

Húsaleiga skal vera kr. 450.000.- á mánuði og greiðist fyrirfram með gjalddaga 1. hvers mánaðar.

Beri gjalddaga upp á frídag skal miða við næsta virka dag þar á eftir. Húsaleigu skal greiða samkvæmt útsendum greiðsluseðlum Reykjavíkurborgar og fylgja reglum um dráttarvexti. Húsaleigan miðast við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar eins og hún er þann 1. maí 2015 (426,4 stig) og breytist með henni til hækkunar eða lækkunar á eins mánaðar fresti.

Leiga miðast við breytingakostnað að fjárhæð 158 milljónir króna á verðlagi september 2015. Ef endurbyggja þarf hluta húsnæðisins með tilliti til friðunar verður sá kostnaður að falla á leigusala. kostnaðarmat var unnið af verkfræðistofunni Eflu skv. fylgiskjali II. Kostnaðarmat skal endurmetið í lok árs 2015 og aftur þann 1. mars 2016. Ef stefnir þá í veruleg frávik frá upphaflegri áætlun skulu aðilar leitast við að lækka framkvæmdakostnað, en húsnæðið verður þó ávallt að vera nothæft til rekstrar miðað við þau áform sem eru uppi. Þegar niðurstaða framkvæmdakostnaðar liggur fyrir skal leigutaki taka á sig 1/3 hækkunar sem kann að verða umfram áætlun um framkvæmdir sem er 158 milljónir króna. Hækkun leigugreiðslna endurspeglar þá hlutfallslega þann kostnaðarauka.

5.gr.

Ástand hins leigða húsnæðis við afhendingu þess til leigutaka

Leigusali mun fyrir afhendingu endurbæta húsnæðið og endurbyggja að hluta í samráði við leigutaka. Leigutaki sér um og kostar allar lausar innréttingar innanhúss

Breytingar á húsnæðinu, hönnun og framkvæmdir, verði gerðar í samstarfi við leigutaka og starfsmenn HR. Leigutaki og HR hefur fulltrúa í byggingnefnd/verkefnastjórn verkefnisins. Leigutaki og leigusali skulu hafa samráð við val á hönnuðum þar með talið um arkitekt við hönnunina.

Framkvæmdakostnaður sem fellur á leigusala er áætlaður á bilinu 146-158 milljónir króna sbr. kostnaðarmat, sjá fylgiskjal II með leigusamningi. Miðað er við meðfylgjandi skissu í fylgiskjali 1 af breytingum á húsnæðinu. Gerð verður nánari skilalýsing samhliða endanlegri hönnun húsnæðisins.

Leigusali mun ákveða efnisval í samráði við leigutaka.



6.gr.

Viðhald

Leigutaka er skylt að fara vel með hið leigða húsnæði og í samræmi við umsamin afnot þess.

Leigutaki annast á sinn kostnað allt nauðsynlegt og eðlilegt viðhald hins leigða innahúss og á lóð. Sérstakt samþykkti leigusala þarf fyrir framkvæmdum er varða hið leigða húsnæði.

Leigusali sér um og lætur framkvæma viðhald utandyra. Leigutaki leggi árlega fram beiðni um viðhaldsþörf húsnæðis. Leigusali stefnir á að ástand húsnæðis verði að engu lakara hverju sinni en það er í upphafi leigutímans.

Starfsmenn leigusala hafa heimild til að ganga um hið leigða með hæfilegum fyrirvara til eftirlits eða til þess að framkvæma úrbætur.

7.gr.

Greiðsla rekstrarkostnaðar

Leigusali greiðir skatta, gjöld og lögboðnar brunatryggingar vegna hins leigða.

Leigutaki greiðir allan annan rekstrarkostnað, þar með talið hita og rafmagn fyrir hina leigðu eign. Leigutaki sér líka um rekstur og viðhald á lóð, snjómokstur og annan hefðbundinn rekstur.

8.gr.

Tryggingar og ábyrgð

Leigusali er með lögbundnar tryggingar s.s. brunatryggingar.

Leigutaki annast allar tryggingar á eignum sínum í leiguhúsnæðinu sem og vegna tjóns sem þriðji aðili kann að verða fyrir í tengslum við starfsemi leigutaka.

Leigusali ber í engum tilvikum ábyrgð á tjóni er kann að verða á eignum leigutaka í hinu leigða húsnæði vegna óhappa svo sem vatnstjóns, elds, reyks og þess háttar skal leigutaki tryggja sig fyrir tjónum af þessu tagi. Leigutaka ber að fara varlega með eld í húsinu og önnur hættuleg efni og gæta þess að ekki stafi hætta af rafleiðslum, vélum eða öðrum hlutum er hann hefur og notar í húsinu. Leigusali skal annast úttekt og gerð eldvarna sem hluta af endurbyggingu húsnæðis. Leigutaki skal síðan annast á sinn kostnað allar nauðsynlegar eldvarnir eða aðrar slíkar ráðstafanir í hinu leigða húsnæði sem Eldvarnareftirlitið eða aðrar opinberar stofnanir kunna að gera kröfu til vegna starfsemi leigutaka.

Leigutaki skal bæta leigusala það tjón, sem hið leigða húsnæði kann að verða fyrir á leigutímanum sem sannarlega er af hans völdum, starfsmanna eða starfssemi hans.

9.gr.

Umgengni

Leigutaka, starfsmönnum og öðrum á þeirra vegum er skylt að fara í hvívetna með hið leigða og lóð þess á þann hátt sem samræmist góðum og viðteknum venjum um umgengni hreinlæti og hollustuhætti. Að leigutíma liðnum ber leigutaka að skila hinu leigða aftur í ekki lakara ástandi en það var við upphaf leigutímans, nema sem leiðir af venjulegri notkun. Leigutaka eru óheimilar allar breytingar á hinu leigða, án samþykkis leigusala. Allar breytingar verða að eign leigusala í lok leigutíma.



Leigusali skuldbindur sig ekki til kaupa á innréttingu og/eða öðru sem leigutaki lætur í té hinu leigða á leigutíma.

10.gr.

Vanefndir, riftun

Standi leigutaki ekki í skilum með greiðslu leigugjalds og/eða verðbóta, eða gangi illa um hið leigða, eða hagnýtir húsnæðið gegn ákvæðum samnings þessa eða brýtur á annan hátt verulega gegn skyldum sínum, er leigusala heimilt að rifta leigusamningi þessum. Á sama hátt er leigutaka heimil riftun, ef leigusali brýtur verulega gegn skyldum sínum samkvæmt samningi þessum.

Komi til þess að fasteignin verði seld á leigutímanum skulu ákvæði þessa samnings standa óbreytt. Leigutaka skal ávallt haldið upplýstum um öll áform um sölu á eigninni. Allar breytingar á samningi þessum skulu vera skriflegar. Um vanefndir, tilkynningarskyldu vegna þeirra, svo og vanefndaúrræði hvors aðila um sig, fer skv. ákvæði húsaleigulaga á hverjum tíma sbr. nú XII. kafla húsaleigulaga nr. 36/1994.

11.gr.

Tilkynningar

Hvers kyns tilkynningar, kröfur eða annað sem tilkynna þarf tilkynnist skriflega með sannanlegum hætti eða til:

Til leigtaka:

Grunnstoð ehf.

Heimilisfang: Menntavegi 1, 101 Reykjavík

Bt. Þorkels Sigurlaugssonar

Netfang: tsi@hr.is

Til leigusala:

Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar

Heimilisfang: Tjarnargötu 11

Bt. Óla Jóns Hertervig

Netfang: oli.jon.hertervig@reykjavik.is

12.gr.

Framleiga

Leigutaka er óheimilt að framleigja hið leigða til annarar starfsemi en fyrir HR nema í samráði við leigusala. Þó skal leigusali almennt samþykkja framleigu ef ekki er um veruleg frávik á starfsemi er að ræða skv. grein 2.

13. gr.

Annað

Að öðru leyti en hér er kveðið á um hafa leigutaki og leigusali þær skyldur og réttindi sem húsaleigulög nr. 36/1994 kveða á um með síðari breytingum eftir því sem við getur átt.




Leigutaki ábyrgist að fyrirhuguð starfsemi í hinu leigða húsnæði sé í samræmi við gildandi lög og reglur.

Rísi mál út af samningi þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, eitt handa hvorum aðila fyrir sig.

Öllu framangreindu til staðfestingar rita fyrirsvarsmenn aðila nöfn sín hér undir í viðurvist þar til kvaddra vitundarvotta.

Reykjavík, 25. september 2015.

F.h. leigutaka



F.h. leigusala




Samkvæmt samþykkt borgarráðs
dags 16. júlí 2015.

Vottar að réttri dagsetningu
og undirskrift aðila.

Elisabet Ekeneldóttir 180192-2589

Erla Hardardóttir 101193-2089

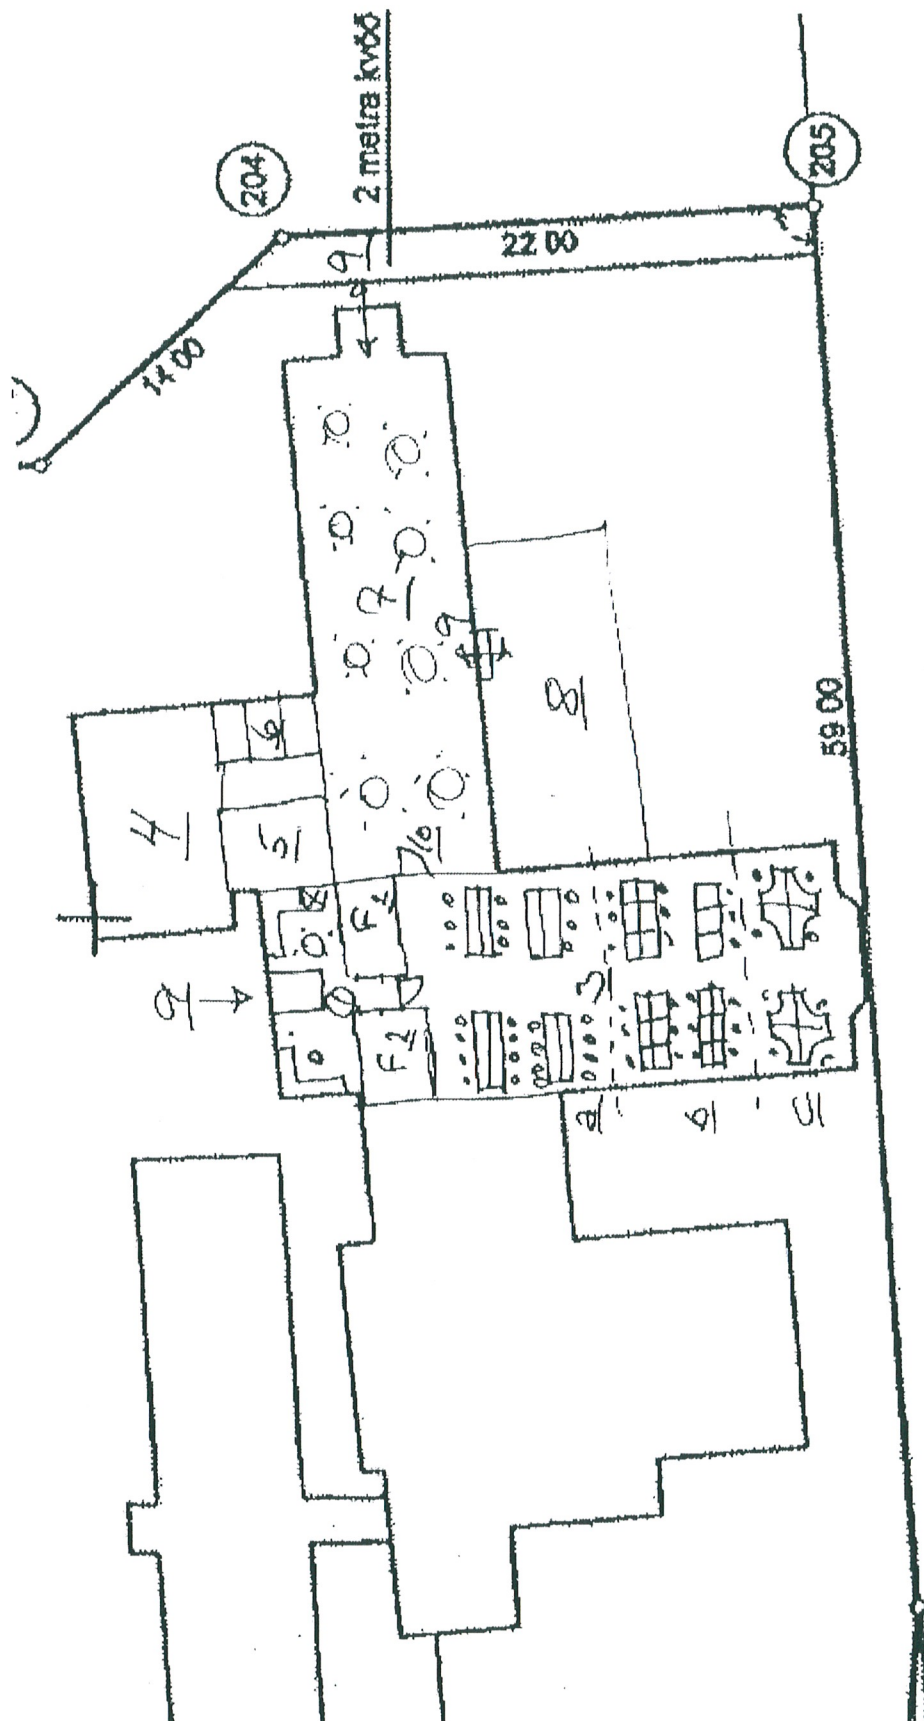

Handwritten signature

Fylgiskjal II


Nauthólsvegur 100

Endurbætur á húsnæði

Viðgerðartillögur

Frumkostnaðaráætlun

Júlí 2015

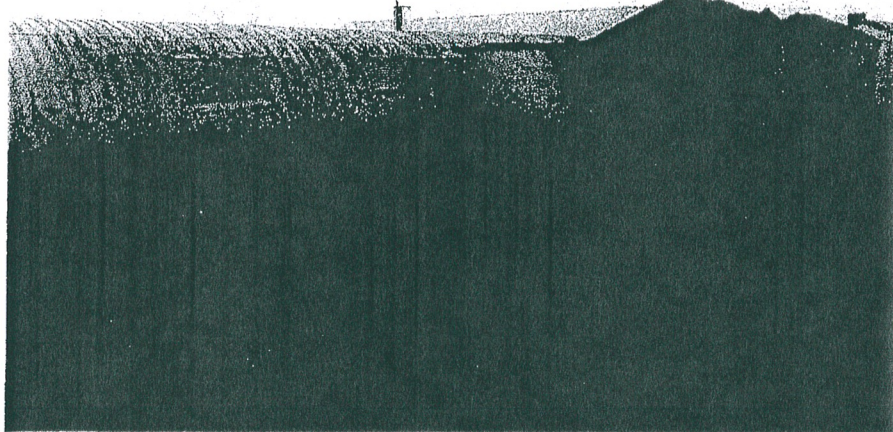

 **EFLA**
VERKFRÆÐISTOFA




Inngangur.

Undirritaður hefur að beiðni Óla Jóns Hertervig og Óla Arnars Eiríkssonar hjá Skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar (SEA) framkvæmt ástandsmat á húseignum þeim sem staðsettar eru við Nauthólsveg 100 í Reykjavík. Einnig hefur verið gerð frumkostnaðaráætlun fyrir endurbyggingu húseignanna.

Um er að ræða þrjá byggingahluta úr stærri heildarþyrpingu sem er á svæðinu.

- Hús / skemma, stærð 220 m²
- Braggi, stærð 140 m²
- Viðbygging, stærð 90 m²

Heildarflatarál húsanna þriggja er um 450 m².

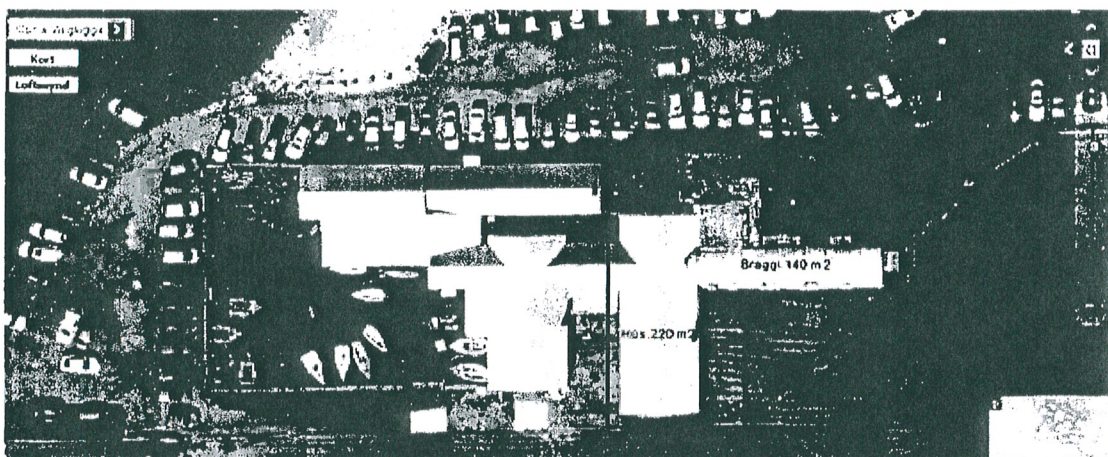

Yfirlitsmynd af svæðinu

2. Ástandsmat bygginga og áætlaður kostnaður við endurbyggingu



Við skoðun á húsnæðinu sem fram fór föstudaginn 12. júlí komu fram eftirfarandi atriði varðandi ástand húsanna. Einnig hefur verið lagt mat á kostnað við endurbyggingu húsanna.

2.1 Viðbygging

Um er að ræða 90 m² byggingu sem stendur á steypum sökklum. Þak hússins hefur verið borið uppi af steypum súlum. Milli súlna hafa útveggir verið hlaðnir með léttum hleðslusteini, sandsteini.

Ástand hússins er afar bágborið eftir eldsvoða sem varð í húsinu fyrir nokkrum árum síðan. Þakið er farið af stórum hluta hússins auk þess sem útveggir þess eru mikið skemmdir og að stórum hluta fallnir saman.


Ekki getur talist raunæft að endurbyggja húsarústirnar vegna kostnaðar og þeirra miklu skemmda sem orðið hafa á húsinu sem gera endurbyggingu óraunhæfa. Sé ætlunin að koma upp 90 m² húsnæði undir þá starfsemi sem fram hafa komið má gera ráð fyrir að kostnaður við niðurrif og nýbyggingu á húsinu getið orðið um um 380 -400 þús kr. á m² 34 til 36 millj króna



Úthliðar viðbyggingar

2.2 Braggi.

Á svæðinu er 140 m² braggi frá því á stríðsárunum sem notaður hefur verið fyrir ýmsa starfsemi á liðnum áratugum. Um er að ræða hefðbundinn bragga sem reistur var á hernámsárunum. Bragginn hvílir á einföldum undirstöðum. Í bragganum er moldargólf sem hefur verið lagt krossviðplötum. Húsið er óeinangrað, allir gluggar og hurðir ónýtt. Ekkert hitakerfi hitakerfi í húsinu og rafmagnið er afar bágborið. Ekki er vitað hvernig frarennslislum er háttað í húsinu.

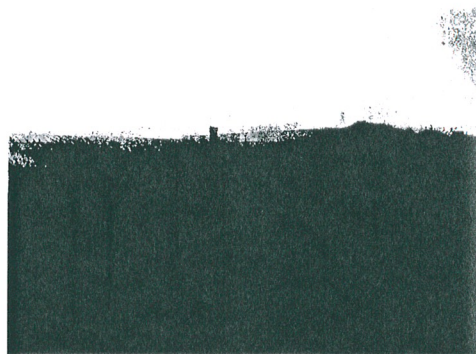

Úthliðar bragga





Sé ætlunin að halda sama útliti á svæðinu og núna er er lagt er til að bragginn verði rifinn og fjarlægður. Grafið verði fyrir nýjum steyptum undirstöðum og gólfplötu. Keyptur verði nýr braggi og reistur á grunni þess gamla. Við hönnun á innra skipulagi braggans verði miðað við einfaldar útfærslur í lausnum, engir innveggir, sýnilegar lagnir á veggjum og lofti, náttúruleg loftræsing, gólfplata verði máluð.

Gera má ráð fyrir að kostnaður við að endurnýjun á bragga geti orðið um 250 – 280 þús kr á m² eða um 35 – 39 millj. króna

2.3 Hús - skemma

Þriðji byggingahlutinn á svæðinu er 220 m² steypthús. Þessi húshluti er sá heillegasti á svæðinu, og sá hluti sem getur verið hagkvæmt að endurbyggja í stað niðurrifs á húsinu. Húsið er með steypa / hlaðna útvegg og steypa botnplötu. Þakjárn hússins ásamt þakburðarvirki var endurnýjað fyrir nokkrum árum og er í ágætu ástandi. Gluggar hússins eru ónýtir.

Handwritten signature or initials.



Helstu verkþættirnir við endurbyggingu hússins myndu vera;

Utanhúss

- Endurnýjun glugga
- Múrviðgerðir
- Málun veggja
- Endurnýja útihurðir

Innanhúss

- Hreinsun út úr húsi
- Einangrun þaks
- Endunýja frárennsli
- Endurnýjun raflagna og lagna
- Klæðning útveggja og lofta
- Gólfílögn og málun

Varðandi kostnað við endurbætur á húsnæðinu má gera ráð fyrir að hann verði um 300 - 330 þús kr á m² eða um 66 til 71 millj króna.

AJ
20

Samantekt.

Eftir heildarskoðun á húsunum er talið hagkvæmast að rífa bæði viðbygginguna og braggann og byggja mannvirkin aftur í uppranalegri mynd. Rétt væri að skoða hvort útfæra megi skipulag viðbyggingar a hagkvæmari hátt en núna er, etv mætti sleppa endurbyggingu hennar eða framlengja skemmuna í núverandi mynd. Slík útfærsla gæti verið hagkvæmari, myndi falla betur að umverfinu og myndi nýtast væntanlegri starfsemi betur. Við útfærslu á lausnum verði leitast við að framkvæma verkið á sem hagkvæmastan hátt með einfaldleikann að leiðarljósi.

Samantekt á áætluðum heildarkostnaði.

2.1 Endurnýjun á viðbyggingu	34 til 36 millj.
2.2 Endurnýjun á bragga	35 til 39 millj
2.3 Endurbætur á skemmu	66 til 71 millj
Endurbætur á lóð næst húsum	10 til 12 millj
Samtals áætlaður heildarkostnaður	146 – 158 millj

Allar tölur innifela efni og vinnu með vsk.

Jóhannes Benediktsson

byggingartæknifræðingur



Helga Maureen Gylfadóttir
Anna Lís Guðmundsdóttir
Guðný Gerður Gunnarsdóttir

Vatnsmýri – Seljamýri – Öskjuhlíð

Byggðakönnun
Fornleifaskrá og húsakönnun



Reykjavík 2013

Minjasafn Reykjavíkur
Skýrsla nr. 161

Fyrsti eigandi Breska setuliðið

Hönnun Ókunnur

Upphafleg notkun
Transit Camp /Gistihús

Upphafleg gerð

Útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Stálgrindarhús

Einlyft

Saga

Þyrping húsa við Nauthólsvík í útjaðri Reykjavíkurflugvallar e skráð undir heitinu Nauthólsvegur 100 í Fasteignaskrá með landnúmerið 219038. Þetta er steinsteypt og hlaðið hús ásamt áföstum bragga af bandarískri BUTLER gerð.

Hér er um að ræða allmörg hús sem reist voru veturinn 1942-1943 sem gistihús sem nefndist *Hótel Winston* og var notað fyrir flugmenn og aðra þá sem áttu leið um Reykjavíkurflugvöll. Það var tekið notkun í júlí 1945. Eftir að flugmálastjórn tók við rekstri flugvallarins var flugvallarhótelíð rekið á vegum flugmálastjórnar og nefnt *Hótel Ritz* um tíma. Rekstrinum var hætt árið 1951.

Varðveislumat:

Byggingarstíll: Braggi - herskáli og einföld steinsteypuhús.

Menningarsögulegt gildi: Tengist sögu hernámsára í Reykjavík, sögu Reykjavíkurflugvallar og hótelsreksturs í Reykjavík.

Umhverfisgildi: Mikilvægt kennileiti í umhverfinu. Hluti af þyrpingu bragga í Nauthólsvík.

Upprunaleg gerð: Hefur tekið breytingum, en heldur upprunalegum byggingarstíl.

Varðveislugildi: Lagt er til að svæðið sem braggarnir standa á njóti verndar í gulum flokki. Braggarnir mynda heildstæða þyrpingu ásamt öðrum mannvirkjum í Nauthólsvík frá hernámsárunum í Reykjavík og vísar til upphafs Reykjavíkurflugvallar.

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
126049608	21.12.2016	201612	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Járnavinna sökkjar v/ Braggi Nauthólsvik	30534	Ari Oddsson ehf	0001671	506.320,00	506.320,00	0,00
126057642	8.2.2017	201805	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Járnavinna v/ Bragginn Nauthólsvik	30534	Ari Oddsson ehf	0001277	255.889,00	255.889,00	0,00
125054880	8.12.2016	201612	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Inndæling í sprungur Bragginn Nauthólsvegi	30534	Ari Oddsson ehf	0001663	734.999,00	734.999,00	0,00
125060947	2.6.2017	201706	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrvíðgerðir ofl. v. Nauthólsvegur 100	30534	Ari Oddsson ehf	0001812	4.824.135,00	4.824.135,00	0,00
125061776	2.8.2017	201708	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrvinna v. Braggi Nauthólsvegur 100	30534	Ari Oddsson ehf	0001884	3.409.718,00	3.409.718,00	0,00
125061777	31.7.2017	201708	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Slipun og lökkun gólfa Nauthólsvegur 100	30534	Ari Oddsson ehf	0001880	3.330.997,00	3.330.997,00	0,00
125057530	1.2.2017	201702	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrverk og steypa v. Braggi Nauthólsvik	30534	Ari Oddsson ehf	0001714	2.150.938,00	2.150.938,00	0,00
126052272	10.7.2017	201707	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Braggi Nauthólsvegi vegna vinnu 26.maí-10.júlí 2017	30534	Ari Oddsson ehf	0001855	9.761.985,00	9.761.985,00	0,00
126054149	28.9.2017	201709	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrverk Nauthólsvik Braggi/Náðhús	30534	Ari Oddsson ehf	0001927	1.928.680,00	1.928.680,00	0,00
126055558	8.12.2017	201712	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	v/ Nauthólsvik múrverk og steypa	30534	Ari Oddsson ehf	0001989	1.309.464,00	1.309.464,00	0,00
126057041	7.4.2018	201804	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	v/ Nauhólsvegur 100 múrverk og flisalagnir	30534	Ari Oddsson ehf	0002106	4.417.968,00	4.417.968,00	0,00
126057621	1.6.2018	201806	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrverk Bragginn Nauthólsvegi apríl til júní 2018	30534	Ari Oddsson ehf	0002167	3.815.194,00	3.815.194,00	0,00
									Ari Oddsson ehf				36.446.287,00	36.446.287,00	0,00
127035830	20.6.2017	201705	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnun í maí v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0395	189.189,00	189.189,00	0,00
126053696	6.9.2017	201709	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna: Eftirlit í júní, júlí og ágúst v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0401	906.432,00	906.432,00	0,00
126053697	6.9.2017	201709	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna: hönnun í júní, júlí, ágúst og fundir v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0399	538.194,00	538.194,00	0,00
125064028	1.11.2017	201711	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0408	391.635,00	391.635,00	0,00
125059645	1.4.2017	201704	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0383	414.090,00	414.090,00	0,00
125059646	1.4.2017	201704	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0382	676.347,00	676.347,00	0,00
125059305	1.3.2017	201703	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0379	1.587.345,00	1.587.345,00	0,00
125045223	1.3.2016	201603	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.vinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0346	1.747.147,00	1.747.147,00	0,00
125048439	1.6.2016	201606	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0356	2.681.081,00	2.681.081,00	0,00
126048888	1.11.2016	201610	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnun og fundir í sept-okt v.Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0368	1.166.412,00	1.166.412,00	0,00
126046667	1.5.2016	201604	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektatj.pj. v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0351	2.180.599,00	2.180.599,00	0,00
125046148	1.4.2016	201604	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0348	1.026.949,00	1.026.949,00	0,00
125050920	5.9.2016	201609	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0364	822.300,00	822.300,00	0,00
127034065	10.2.2016	201602	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektav. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0344	1.753.092,00	1.753.092,00	0,00
126048012	1.8.2016	201608	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 - hönnun, fundir o.fl.	27254	Arkibúllan ehf	0359	1.889.127,00	1.889.127,00	0,00
125060566	1.5.2017	201705	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0388	263.228,00	263.228,00	0,00
126049648	21.12.2016	201612	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvik 100 - hönnun, uppfæra módel o.fl.	27254	Arkibúllan ehf	0371	1.145.649,00	1.145.649,00	0,00
125064759	13.12.2017	201712	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0420	661.434,00	661.434,00	0,00
127039633	7.2.2018	201802	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnunarvinna við Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0431	673.118,00	673.118,00	0,00
125065714	8.3.2018	201803	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektarbj. - Hönnunarvinna við Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0439	440.760,00	440.760,00	0,00
126056715	8.3.2018	201803	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektarbj. - Vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0440	555.651,00	555.651,00	0,00
125067932	30.3.2018	201804	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0449	250.002,00	250.002,00	0,00
126057036	30.3.2018	201803	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektarbj. vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0446	419.121,00	419.121,00	0,00
127039078	30.12.2017	201712	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnunarvinna við Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0426	153.090,00	153.090,00	0,00
125068418	30.4.2018	201804	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0452	213.440,00	213.440,00	0,00
127035829	20.6.2017	201705	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Umsjón og eftirlit apríl-maí v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0391	539.539,00	539.539,00	0,00
125064027	1.11.2017	201711	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit og fundir v. Nauthólsvegur 100 framkv.	27254	Arkibúllan ehf	0409	587.452,00	587.452,00	0,00
125059306	1.3.2017	201703	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit v. framkv. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0378	779.869,00	779.869,00	0,00
126048887	1.11.2016	201610	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Umsjón og eftirlit í sept-okt v.Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0367	413.671,00	413.671,00	0,00
126049649	21.12.2016	201612	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvik 100 - Eftirlit með framkvæmdum	27254	Arkibúllan ehf	0374	324.370,00	324.370,00	0,00
127038619	31.12.2017	201712	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit v/Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0421	298.890,00	298.890,00	0,00
127039632	7.2.2018	201802	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0432	563.370,00	563.370,00	0,00
125068419	30.4.2018	201804	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit v. framkv. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0453	507.840,00	507.840,00	0,00
127041916	30.6.2018	201806	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0457	956.800,00	956.800,00	0,00
125069568	30.7.2018	201807	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Vinna við eftirlit og verkefnisstjórn fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0461	250.240,00	250.240,00	0,00
125059644	1.4.2017	201704	5490	Prentun, fjölríttun, bókbáand, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun og plöstun teikninga v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0385	115.159,00	115.159,00	0,00
125064276	4.11.2017	201711	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Ljós v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0416	281.686,00	281.686,00	0,00
									Arkibúllan ehf				28.364.318,00	28.364.318,00	0,00
47977884	9.5.2017	201705	5589	Önnur tæki og búnaður	1108	20805	123038	13099	Greiða Berlinord 8.450 EUR	110150	Berlinord	090517-1	956.619,00	956.619,00	0,00
									Berlinord				956.619,00	956.619,00	0,00
127040534	25.4.2018	201804	5542	Blikksmíði	1108	20805	123038	13099	Einangruð þaklúga - Nauthólsvik	11570	Blikksmíðurinn hf	0026742	339.373,00	339.373,00	0,00
125056602	31.12.2016	201612	5553	Viðhalds- og þjónustusamningur	1108	20805	123038	13099	Vinna v. loftræsting Nauthóli braggi	11570	Blikksmíðurinn hf	0023111	1.852.206,00	1.852.206,00	0,00
125067681	31.3.2018	201804	5553	Viðhalds- og þjónustusamningur	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 - veitingastaður loftræsting	11570	Blikksmíðurinn hf	0026609	13.679.205,00	13.679.205,00	0,00
									Blikksmíðurinn hf				15.870.784,00	15.870.784,00	0,00
91020443	31.3.2017	201703	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Vinna við hönnun lóðar Nauthólsveg 100	95893	Dagný Land Design ehf	0000125	587.500,00	587.500,00	0,00
91029441	6.9.2017	201709	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Plöntuval á lóð v. Nauthólsvegur 100	95893	Dagný Land Design ehf	0000145	140.690,00	140.690,00	0,00
91031009	30.10.2017	201710	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Aukaverk, breyting á teikningu v. Nauthólsvegur 100	95893	Dagný Land Design ehf	0000152	324.000,00	324.000,00	0,00
125059599	7.3.2017	201703	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnun lóðar v. Nauthólsveg 100 40% af tilboði (sjá fylgiskjal)	95893	Dagný Land Design ehf	0000123	485.460,00	485.460,00	0,00
91029633	2.10.2017	201710	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræ											

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
91017323	31.10.2016	201610	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR051589	3.565.545,00	3.565.545,00	0,00
91016543	30.9.2016	201609	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf. þj. 3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR050270	820.215,00	820.215,00	0,00
91013494	30.4.2016	201604	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR046229	499.298,00	499.298,00	0,00
91012526	31.3.2016	201603	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR045361	305.900,00	305.900,00	0,00
91015605	31.8.2016	201608	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR049118	557.260,00	557.260,00	0,00
91012117	29.2.2016	201602	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR044933	693.544,00	693.544,00	0,00
91015294	31.7.2016	201607	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR048854	886.490,00	886.490,00	0,00
91018752	31.12.2016	201612	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR053591	1.064.650,00	1.064.650,00	0,00
91019465	31.1.2017	201701	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR054489	2.822.000,00	2.822.000,00	0,00
91021285	30.4.2017	201704	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR056976	396.430,00	396.430,00	0,00
91026441	30.6.2017	201707	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR059347	482.195,00	482.195,00	0,00
91018251	30.11.2016	201612	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR052784	2.418.191,00	2.418.191,00	0,00
91030733	30.9.2017	201709	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR062071	1.264.285,00	1.264.285,00	0,00
91034421	30.11.2017	201711	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat - þóknun f. verkfr.þj.	11091	Efla hf	SR064139	623.995,00	623.995,00	0,00
91032355	31.10.2017	201711	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Þóknun f. verkfr.þj. v. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR063022	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00
91034806	31.12.2017	201712	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat. Þóknun f. verkfr.þj.	11091	Efla hf	SR064456	94.325,00	94.325,00	0,00
91041999	30.4.2018	201804	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat Verkbnr: 123038 Þóknun fyrir verkfræðipjónustu 01.04.18 - 30.04.18	11091	Efla hf	SR068474	77.175,00	77.175,00	0,00
91036438	31.1.2018	201801	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkfærðipj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR065696	1.164.764,00	1.164.764,00	0,00
91039105	28.2.2018	201802	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR066884	300.125,00	300.125,00	0,00
91041439	31.3.2018	201803	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.þj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR068078	463.050,00	463.050,00	0,00
91043756	31.5.2018	201805	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.þj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR069320	179.762,00	179.762,00	0,00
91047601	31.7.2018	201807	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Brunahönnun, Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR071702	30.624,00	30.624,00	0,00
91045745	30.6.2018	201806	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.þj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR070508	289.298,00	289.298,00	0,00
										Efla hf			26.887.763,00	26.887.763,00	0,00
125068877	30.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Borðplata v. Nauthólsvegur 100	111878	Fell síf.	0000158	421.600,00	421.600,00	0,00
										Fell síf.			421.600,00	421.600,00	0,00
127037247	9.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Bárujárn og pappi á bragga vinna v/Nauthólsvegur 100	109849	Fílísar og steinn ehf.	SR000689	2.799.800,00	2.799.800,00	0,00
127040448	15.4.2018	201804	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Bárujárn og pappi á bragga v/Nauthólsveg 100	109849	Fílísar og steinn ehf.	SR000766	855.350,00	855.350,00	0,00
										Fílísar og steinn ehf.			3.655.150,00	3.655.150,00	0,00
125056591	15.1.2017	201701	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Flutningur á vörum v. endurgerð Nauthólsvegur 100	108894	Fraktlausnir ehf.	0001569	14.201,00	14.201,00	0,00
126049565	15.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Flutningsgjöld v.skemmuþaks v/Nauthólsvegur 100	108894	Fraktlausnir ehf.	0001441	156.608,00	156.608,00	0,00
										Fraktlausnir ehf.			170.809,00	170.809,00	0,00
125047774	9.5.2016	201605	5439	Önnur sérfræðipjónusta	1108	20805	123038	13099	Textagerð v. Nauthólsvegur 100	106841	Friðþór Eydal	20160504	100.000,00	100.000,00	0,00
										Friðþór Eydal			100.000,00	100.000,00	0,00
127037262	9.11.2017	201711	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Frágangur lóðar, Nauthólsvegi 100	99267	Garðvélar ehf.	100700	8.490.900,00	8.490.900,00	0,00
125065479	31.12.2017	201712	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 frágangur lóðar	99267	Garðvélar ehf.	100767	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
125069354	25.6.2018	201806	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - aukaverk í verkstöðu 4	99267	Garðvélar ehf.	100808	3.168.300,00	3.168.300,00	0,00
125069922	15.8.2018	201808	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - Aukaverk skv. meðf. Verstöðu 5	99267	Garðvélar ehf.	100826	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
125068302	25.4.2018	201804	5562	Útboðsverk, aukaverk	1108	20805	123038	13099	Aukaverk Nauthólsvegur 100 frágangur lóðar	99267	Garðvélar ehf.	100777	3.307.890,00	3.307.890,00	0,00
125069354	25.6.2018	201806	5562	Útboðsverk, aukaverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - aukaverk í verkstöðu 4	99267	Garðvélar ehf.	100808	1.675.900,00	1.675.900,00	0,00
125069922	15.8.2018	201808	5562	Útboðsverk, aukaverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - Aukaverk skv. meðf. Verstöðu 5	99267	Garðvélar ehf.	100826	150.000,00	150.000,00	0,00
										Garðvélar ehf.			20.982.990,00	20.982.990,00	0,00
125058713	7.3.2017	201703	5525	Vélaleiga	1108	20805	123038	13099	Grafíð fyrir þró Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000757	218.488,00	218.488,00	0,00
125054232	2.12.2016	201612	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvinna Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000708	369.148,00	369.148,00	0,00
127035841	2.6.2017	201706	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Vinna við að grafa skurð, sanda og ganga frá aftur v. Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000796	605.229,00	605.229,00	0,00
125058714	24.2.2017	201702	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvegsskipti of. Nauthólsvíkurvegi 100	75696	GÓ Verk ehf	0000745	3.757.329,00	3.757.329,00	0,00
125057529	9.2.2017	201702	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvinna v. Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000744	2.851.082,00	2.851.082,00	0,00
127036824	23.10.2017	201710	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Grafa skurð og mæta á fund v/Nauthólsvíkur	75696	GÓ Verk ehf	0000863	257.058,00	257.058,00	0,00
										GÓ Verk ehf			8.058.334,00	8.058.334,00	0,00
126052443	30.6.2017	201707	5524	Vörubílar, dráttarbílar, festivagnar	1108	20805	123038	13099	Flutningur á stálstyrkinum	36736	Hamar ehf	SR17001954	62.488,00	62.488,00	0,00
126055071	14.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiða tengjárn í mæni v. Nauthólsvegur 100	36736	Hamar ehf	SR17003689	111.018,00	111.018,00	0,00
127040977	24.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiði á gólf í tæknirími v/Nauthólsvegur 100	36736	Hamar ehf	SR18001447	752.757,00	752.757,00	0,00
127042294	10.7.2018	201807	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smið á gjörðum utan um náðhús	36736	Hamar ehf	SR18002014	469.989,00	469.989,	

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
127039758	25.2.2018	201802	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Lofbitar í skemmu hreinsaðir og málaðir v/Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1479	640.870,00	640.870,00	0,00
126056938	8.4.2018	201804	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Málningarvinna v. Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1486	625.904,00	625.904,00	0,00
127040771	6.5.2018	201805	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Steinn málaður v/Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1492	395.240,00	395.240,00	0,00
126057626	3.6.2018	201806	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Arin hreinsaður og oliuborinn. Gólfistar málaðir og annar lokafrágangur v. Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1495	336.898,00	336.898,00	0,00
125067406	25.3.2018	201803	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Málningarvinna Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1484	905.107,00	905.107,00	0,00
125068562	20.5.2018	201805	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Málningarvinna Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1494	306.873,00	306.873,00	0,00
127041519	18.6.2018	201806	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Ýmis lokafrágangur innan og utanhúss v/Nauthólsveg 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1498	388.217,00	388.217,00	0,00
125057855	31.1.2017	201701	5524	Vörubílar, dráttarbílar, festivagnar	1108	20805	123038	13099	Flutningur v. Nauthólsvegur 100	109377	Július Jónsson	1638	4.700,00	4.700,00	0,00
126057876	12.6.2018	201806	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	116231	Július Jónsson		4.700,00	4.700,00	0,00
126057938	30.4.2018	201806	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	116231	Landið okkar ehf.	16	4.506.019,00	4.506.019,00	0,00
91032771	30.11.2017	201711	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	50196	Landið okkar ehf.	13	1.231.972,00	1.231.972,00	0,00
91034813	31.12.2017	201712	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Sérfr.vinna v. Nauthólsvik	50196	Landið okkar ehf.		5.737.991,00	5.737.991,00	0,00
125055805	30.12.2016	201612	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vörur v. Nauthólsvegur 100 framkvæmdir	85244	Landmótun sf	105486	136.697,00	136.697,00	0,00
127034669	11.1.2017	201701	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vörur v. Nauthólsvegur 100 framkvæmdir	85244	Landmótun sf	105586	36.475,00	36.475,00	0,00
125053709	31.10.2016	201610	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Pak á skemmu Nauthólsvegur 100	85244	Landmótun sf		173.172,00	173.172,00	0,00
125053803	5.11.2016	201611	5455	Móttöku- og eyðingargjöld	1108	20805	123038	13099	Sorpa og hringrás v rif á bragga ofl Nauthólsvik	66141	Limtré Virnet ehf	VR008676	733.817,00	733.817,00	0,00
125053804	11.10.2016	201610	5455	Móttöku- og eyðingargjöld	1108	20805	123038	13099	Sorpa v. rif á bragga ofl. Nauthólsvik (get ekki sundurl. akstur í Sorpu)	66141	Limtré Virnet ehf	VR008702	458.096,00	458.096,00	0,00
125056177	1.1.2017	201701	5513	Áhald- og verkfæraleiga + verkallar og mót	1108	20805	123038	13099	Leiga á skástifum ofl. v. Nauthólsvegur 100	66141	Limtré Virnet ehf	VR008376	2.670.145,00	2.670.145,00	0,00
127043781	15.8.2018	201808	5513	Áhald- og verkfæraleiga + verkallar og mót	1108	20805	123038	13099	Leiga á skáskífum og stífusteinum og fl. vegna stífunar náðhúss. Nauthólsvegur 100	66141	Limtré Virnet ehf		3.862.058,00	3.862.058,00	0,00
126049189	25.10.2016	201611	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvik - Vinna við rif á bragga o.fl.	66141	MG-hús ehf	1733	182.027,00	182.027,00	0,00
125053801	22.10.2016	201610	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Sala á efni v. Nauthólsvik rif á bragga	66141	MG-hús ehf	1727	103.374,00	103.374,00	0,00
125053803	5.11.2016	201611	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. rif á bragga ofl Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1763	130.118,00	130.118,00	0,00
125053804	11.10.2016	201610	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Sorpa v. rif á bragga ofl. Nauthólsvik (get ekki sundurl. akstur í Sorpu)	66141	MG-hús ehf	1928	248.376,00	248.376,00	0,00
125047338	4.5.2016	201605	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vinna við gólf, veggi og loft Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1749	6.573.023,00	6.573.023,00	0,00
127043780	1.8.2018	201808	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1735	38.321,00	38.321,00	0,00
125053802	21.10.2016	201610	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvinna v. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1733	150.729,00	150.729,00	0,00
125056176	9.11.2016	201612	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvegspúðar undir sökkli Nauthólsvegur 100	66141	MG-hús ehf	1727	7.525.499,00	7.525.499,00	0,00
125051791	11.9.2016	201609	5557	Lóð	1108	20805	123038	13099	Smiða vinnugirðingar v. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1595	6.009.653,00	6.009.653,00	0,00
125058925	2.3.2017	201703	5439	Önnur sérfræðipjónusta	1108	20805	123038	13099	Mæling v. lóðarhönnun Nauthólsvegur 100	10369	MG-hús ehf	1929	635.762,00	635.762,00	0,00
126056956	31.3.2018	201803	5417	Sendibílar - vöruflutningar	1108	20805	123038	13099	Sótt efni í Þ. Þorgrímsson og ekið á Nauthólsveg	11753	MG-hús ehf	1728	1.675.200,00	1.675.200,00	0,00
126056957	31.3.2018	201803	5417	Sendibílar - vöruflutningar	1108	20805	123038	13099	Sótt efni í Þ. Þorgrímsson og ekið á Nauthólsveg 100 v/ Bragga	11753	MG-hús ehf	1762	2.503.304,00	2.503.304,00	0,00
126057252	30.4.2018	201804	5417	Sendibílar - vöruflutningar	1108	20805	123038	13099	Sóttar hurðir í sprautun og ekið á Nauthólsveg	11753	MG-hús ehf	1705	4.073.358,00	4.073.358,00	0,00
91034016	13.12.2017	201712	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Nýja sendibílastöðin hf	006227	8.330,00	8.330,00	0,00
91031929	13.11.2017	201711	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Nýja sendibílastöðin hf	006224	9.130,00	9.130,00	0,00
91039557	13.3.2018	201803	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Nýja sendibílastöðin hf	007615	15.150,00	15.150,00	0,00
91041429	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q1 - RAFMAGN -	98713	Nýja sendibílastöðin hf		32.610,00	32.610,00	0,00
91041435	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q2 - RAFMAGN -	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20177110737	234,00	234,00	0,00
91041436	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q3 - RAFMAGN -	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20177013480	15,00	15,00	0,00
91041262	11.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186246863	247,00	247,00	0,00
91046498	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186386182	3.987,00	3.987,00	0,00
91046499	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186386180	9.967,00	9.967,00	0,00
91046497	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186386181	3.987,00	3.987,00	0,00
91046762	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186343344	239,00	239,00	0,00
91035454	11.1.2018	201801	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676734	4.944,00	4.944,00	0,00
91037003	13.2.2018	201802	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676735	4.944,00	4.944,00	0,00
91042821	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676733	12.359,00	12.359,00	0,00
91042848	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186634212	247,00	247,00	0,00
91042849	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186535556	247,00	247,00	0,00
91042568	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186150295	223,00	223,00	0,00
91045009	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186440113	247,00	247,00	0,00
91044686	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186482726	4.944,00	4.944,00	0,00
91044720	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186482727	4.944,00	4.944,00	0,00
91044721	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186482725	12.359,00	12.359,00	0,00
91047932	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186579652	4.822,00	4.822,00	0,00
91048290	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186537077	239,00	239,00	0,00
91048291	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186579650	11.960,00	11.960,00	0,00
91047976	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186579651	4.822,00	4.822,00	0,00
91033658	13.12.2017	201712	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186731347	247,00	247,00	0,00
91031962	13.11.2017	201711	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186773854	4.944,00	4.944,00	0,00
91039380	13.3.2018	201803	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186773855	4.944,00	4.944,00	0,00
91041428	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186773853	12.359,00	12.359,00	0,00
91041433	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.		108.471,00	108.471,00	0,00
91041434	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171824443	1.329,00	1.329,00	0,00
91040689	11.4.2018	201804	5270	Rafmagn											

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Víd2	Víd3	Víd4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
91046668	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181106466	5.618,00	5.618,00	0,00
91046377	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181106465	5.618,00	5.618,00	0,00
91046376	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181106464	12.388,00	12.388,00	0,00
91035312	11.1.2018	201801	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180096247	1.328,00	1.328,00	0,00
91037143	13.2.2018	201802	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180254307	1.200,00	1.200,00	0,00
91042730	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180789199	5.587,00	5.587,00	0,00
91042450	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180789198	12.311,00	12.311,00	0,00
91042676	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180728543	1.328,00	1.328,00	0,00
91044600	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180947632	5.408,00	5.408,00	0,00
91044883	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180947633	5.408,00	5.408,00	0,00
91044882	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180947631	11.914,00	11.914,00	0,00
91044541	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180886973	1.287,00	1.287,00	0,00
91048101	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181204605	1.330,00	1.330,00	0,00
91048453	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181265276	12.388,00	12.388,00	0,00
91048454	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181265277	5.618,00	5.618,00	0,00
91048455	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181265278	5.618,00	5.618,00	0,00
91033704	13.12.2017	201712	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171883608	30.815,00	30.815,00	0,00
91031837	13.11.2017	201711	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171723345	42.873,00	42.873,00	0,00
91039433	13.3.2018	201803	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180471838	31.134,00	31.134,00	0,00
91041068	11.4.2018	201804	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180629536	30.168,00	30.168,00	0,00
91046375	11.7.2018	201807	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181105187	31.517,00	31.517,00	0,00
91035545	11.1.2018	201801	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180155454	31.134,00	31.134,00	0,00
91037184	13.2.2018	201802	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180313528	28.232,00	28.232,00	0,00
91042449	14.5.2018	201805	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180787905	31.134,00	31.134,00	0,00
91044881	13.6.2018	201806	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180946340	30.168,00	30.168,00	0,00
91048491	13.8.2018	201808	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181264001	31.517,00	31.517,00	0,00
91033399	13.12.2017	201712	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171883607	4.269,00	4.269,00	0,00
91032001	13.11.2017	201711	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171723344	5.924,00	5.924,00	0,00
91039432	13.3.2018	201803	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180471837	4.369,00	4.369,00	0,00
91040750	11.4.2018	201804	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180629535	4.244,00	4.244,00	0,00
91046666	11.7.2018	201807	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181105186	4.465,00	4.465,00	0,00
91035544	11.1.2018	201801	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180155453	4.369,00	4.369,00	0,00
91037183	13.2.2018	201802	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180313527	3.954,00	3.954,00	0,00
91042448	14.5.2018	201805	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180787904	4.394,00	4.394,00	0,00
91044880	13.6.2018	201806	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180946339	4.244,00	4.244,00	0,00
91048490	13.8.2018	201808	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181264000	4.465,00	4.465,00	0,00
126051144	24.5.2017	201705	5549	Vinna Orkuveitu Reykjavíkur	1108	20805	123038	13099	Ný heimlögn v. Nauthólsvegur 100	24659	Orkuveita Reykjavíkur	4018652	820.303,00	820.303,00	0,00
125066027	29.1.2018	201801	5549	Vinna Orkuveitu Reykjavíkur	1108	20805	123038	13099	Breyting á heimlögn rafmagn Nauthólsvegur 100	24659	Orkuveita Reykjavíkur	4019444	1.363.273,00	1.363.273,00	0,00
125065738	12.12.2017	201712	5710	Fundargjöld	1108	20805	123038	13099	Útl. kostnaður v. veitingar v. Nauthólsvegur 100	17177	Ólafur I Halldórsson	201716	43.966,00	43.966,00	0,00
91031121	31.10.2017	201710	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR092737	3.162,00	3.162,00	0,00
91030947	25.10.2017	201710	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun og plöstun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR092282	5.972,00	5.972,00	0,00
91031383	8.11.2017	201711	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR093020	4.743,00	4.743,00	0,00
91031141	31.10.2017	201710	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun í lit v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR092670	1.581,00	1.581,00	0,00
91032911	7.12.2017	201712	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR094639	4.032,00	4.032,00	0,00
91041858	30.4.2018	201804	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR101934	3.516,00	3.516,00	0,00
91036447	12.2.2018	201802	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR097990	911,00	911,00	0,00
91038849	28.2.2018	201802	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR098570	978,00	978,00	0,00
91040646	13.4.2018	201804	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR101040	759,00	759,00	0,00
91037349	16.2.2018	201802	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR098176	1.214,00	1.214,00	0,00
91040514	10.4.2018	201804	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR100706	1.518,00	1.518,00	0,00
91040304	31.3.2018	201803	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun, Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR100349	3.508,00	3.508,00	0,00
91048762	24.8.2018	201808	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR106750	379,00	379,00	0,00
126050560	3.5.2017	201705	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Tilboð í stálsmiðina á stál-gluggum í BRAGGA-skemmu Nauthólsvík	36340	Pixel ehf		32.273,00	32.273,00	0,00
127042039	30.6.2018	201806	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Braggi Nauthólsvík barborð	103628	Prófilstál ehf	007314	4.586.515,00	4.586.515,00	0,00
125068874	28.5.2018	201805	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Raflagnaefni v. Nauthólsvegur 100	103628	Raflís ehf.	1249	121.999,00	121.999,00	0,00
126057812	8.6.2018	201807	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Raflagnavinna: Braggi Nauthólsvík	103628	Raflís ehf.	1208	190.062,00	190.062,00	0,00
127042565	13.7.2018	201807	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Rafvirkjavinna og efniskaup, Nauthólsvegur	103628	Raflís ehf.	1226	492.986,00	492.986,00	0,00
125047598	13.5.2016	201605	5553	Víðhalds- og þjónustusamningur	1108	20805	123038	13099	Víðhald raflögn Skemma Nauthólsvík niðurri raflagna	13397	Raflís ehf.	1259	286.948,00	286.948,00	0,00
126052832	3.8.2017	201708	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. Nauthóll 100	12005	Raflýsing ehf	011822	98.828,00	98.828,00	0,00
127034727	30.12.2016	201701	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. Nauthóll 100	12005	Raflýsing ehf		98.828,00	98.828,00	0,00
126049609	19.12.2016	201612	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Tilf.víðh.raflagna - vinna v/lampa, ljósingar o.fl. v.Nauthóll 100	12005	Rafrún ehf	000243	5.177.346,00	5.177.346,00	0,00
127037853	13.12.2017	201712	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Vinna við raflagnir Nauthóll	12005	Rafrún ehf	001868	132.131,00	132.131,00	0,00
125066223	5.2.2														

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Víd2	Víd3	Víd4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
200009716	31.1.2018	201802	5471	Auglýsingar (birting)	1108	20805	123038	13099	Útl. kostn. v/auglýsingar skipulagsáætla	11853	Reykjavíkurborg	89698784	42.300,00	42.300,00	0,00
200005834	20.4.2016	201603	5472	Ljósmyndun, myndbanda- og kvikmyndagerð	1108	20805	123038	13099	Myndaafgreiðsla - Nauthólsvík braggar	11853	Reykjavíkurborg	89241955	24.678,00	24.678,00	0,00
126054697	6.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Staurar v/ Nauthólsvegur 100	11853	Reykjavíkurborg	89635660	100.000,00	100.000,00	0,00
200009075	6.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Staurar v/ Nauthólsvegur 100	11853	Reykjavíkurborg	89635659	124.000,00	124.000,00	0,00
17015502	6.11.2017	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Bakf. #200009075 v. Krafa #89635659 var bakf. í RK sjá #17513145	11853	Reykjavíkurborg		-124.000,00	0,00	124.000,00
91024994	20.6.2017	201706	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Yfirferð raflagnateikninga, Erindi :BN051425 Nauthólsvegur 100	11853	Reykjavíkurborg	89555871	22.000,00	22.000,00	0,00
200006834	5.10.2016	201610	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Byggingarleiðf, Erindi :BN051425 Nauthólsvegur 100 Endurbýgging bragga og náðhúss	11853	Reykjavíkurborg	89352112	152.257,00	152.257,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Lokaúttekt, Erindi :BN051425	11853	Reykjavíkurborg	89320408	19.200,00	19.200,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Yfirferð sérteikninga, Erindi :BN051425	11853	Reykjavíkurborg	89320408	45.000,00	45.000,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Vottorð um lokaúttekt erindi BN051425 Nauthólsvegur 100 - Endurbýgging bragga og náðhúss	11853	Reykjavíkurborg	89320408	16.500,00	16.500,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Áfangaúttektir, Erindi :BN051425 8 x 9600 kr/útt.	11853	Reykjavíkurborg	89320408	76.800,00	76.800,00	0,00
200007518	7.2.2017	201702	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Lágmarksgjald, Erindi :BN052326 Nauthólsvegur 100 breyting á áður samþykktum teikningum	11853	Reykjavíkurborg	89451856	11.000,00	11.000,00	0,00
200009716	31.1.2018	201802	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostn. v/verul. breytinga á delisikupil.	11853	Reykjavíkurborg	89698784	315.000,00	315.000,00	0,00
200009893	28.3.2018	201803	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Lágmarksgjald, Erindi :BN054450 - Nauthólsvegur 100 - Reyndarteikningar - Byggl.umsókn - Nauthólsv. 100	11853	Reykjavíkurborg	89748734	11.000,00	11.000,00	0,00
											Reykjavíkurborg		835.735,00	959.735,00	124.000,00
127040476	28.3.2018	201804	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	PP0487838 Nauthólsvegur 100	10741	Securitas hf	PR+18071804	606.954,00	606.954,00	0,00
127040477	9.4.2018	201804	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	PP0491668 Nauthólsvegur 100	10741	Securitas hf	PR+18072562	145.599,00	145.599,00	0,00
125068851	30.4.2018	201805	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 búnaður	10741	Securitas hf	PR+18090585	1.075.944,00	1.075.944,00	0,00
127042423	12.6.2018	201807	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	- KREDIT	10741	Securitas hf	PRK032750	-143.602,00	0,00	143.602,00
											Securitas hf		1.684.895,00	1.828.497,00	143.602,00
127039939	28.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiði á bargrind í bragga Nauthólsvík v/feb	31456	Sérsmiði ehf	1655	550.000,00	550.000,00	0,00
127041134	29.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við bar Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1688	369.520,00	369.520,00	0,00
127039273	29.1.2018	201801	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiði á bargrind í bragga Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1640	300.000,00	300.000,00	0,00
127040593	30.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Uppsetning á bar Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1674	1.055.240,00	1.055.240,00	0,00
127042431	10.7.2018	201807	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Glerskermur og uppsetning við barborð, Braggi Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1698	245.080,00	245.080,00	0,00
											Sérsmiði ehf		2.519.840,00	2.519.840,00	0,00
125059203	17.3.2017	201703	5541	Járnsmiði	1108	20805	123038	13099	Skihti v. Nauthólsvegur 100	88154	Signa ehf	0007233	33.478,00	33.478,00	0,00
											Signa ehf		33.478,00	33.478,00	0,00
91019532	23.2.2017	201702	5544	Pípulögn	1108	20805	123038	13099	V/Nauthólsveg 100 Verk.nr.123038 Unnið 15/2 Um Mynda lagrir	35946	Skolphreinsun Ásgeirs sf	0021058	36.803,00	36.803,00	0,00
											Skolphreinsun Ásgeirs sf		36.803,00	36.803,00	0,00
125068897	5.6.2018	201806	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Vinna forvarnsviðs lokaúttekt 14& 2018 Nauthólsvegur 100	30388	Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs	78508	26.870,00	26.870,00	0,00
											Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs		26.870,00	26.870,00	0,00
125054478	2.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Framkvæmdir Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	30 - 16	1.055.642,00	1.055.642,00	0,00
127034670	13.1.2017	201701	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna vegna Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	1 - 17	2.302.985,00	2.302.985,00	0,00
126050425	30.3.2017	201704	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 10	108467	Smiðurinn þinn slf.	9 - 17	1.825.630,00	1.825.630,00	0,00
127035825	16.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	15 - 17	2.919.524,00	2.919.524,00	0,00
125060954	2.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthóll 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	14 - 17	6.527.268,00	6.527.268,00	0,00
125053887	8.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	28 - 17	1.234.005,00	1.234.005,00	0,00
126054925	27.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	34 - 17	4.590.647,00	4.590.647,00	0,00
125059626	24.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100 - grindu upp veggi ofl.	108467	Smiðurinn þinn slf.	8 - 17	2.037.871,00	2.037.871,00	0,00
125060722	19.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. breytinga Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	13 - 17	3.405.753,00	3.405.753,00	0,00
125059090	10.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna ísetning á gluggum skemma Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	7 - 17	1.849.171,00	1.849.171,00	0,00
126050658	5.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	11 - 17	2.592.196,00	2.592.196,00	0,00
125058716	24.2.2017	201702	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Endurbætur Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	4 - 17	2.284.523,00	2.284.523,00	0,00
126049096	18.11.2016	201611	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna vegna Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	28 - 16	1.221.150,00	1.221.150,00	0,00
125053609	4.11.2016	201611	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsvegur 100 endurgerð og starfsábyrgðartrygging byggingastj	108467	Smiðurinn þinn slf.	27 - 16	854.302,00	854.302,00	0,00
125057869	10.2.2017	201702	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. endurgerð Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	3 - 17	2.507.983,00	2.507.983,00	0,00
126053054	4.8.2017	201708	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	24 - 17	1.401.640,00	1.401.640,00	0,00
127034729	27.1.2017	201701	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	2 - 17	2.234.564,00	2.234.564,00	0,00
126052274	14.7.2017	201707	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	21 - 17	1.656.460,00	1.656.460,00	0,00
126049607	16.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna vegna Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	34 - 16	2.932.023,00	2.932.023,00	0,00
125055577	30.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. framkvæmdir Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	38 - 16	2.049.013,00	2.049.013,00	0,00
125060122	21.4.2017	201704	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	10 - 17	4.886.287,00	4.886.287,00	0,00
126051840	30.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	17 - 17	1.406.037,00	1.406.037,00	0,00
125063451	9.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. veggi, glugga ofl. Nauthólsvegi 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	32 - 17	2.332.225,00	2.332.225,00	0,00
127037850	8.12.2017	201712	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Útseld vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	40-17	4.850.024,00	4.850.024,00	0,00
126054021	22.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	29 - 17	702.944,00	702.944,00	0,00
125055304	24.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	38 - 17	2.813.363,00	2.813.363,00	0,00
127037254	10.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	36-17	3.721.006,00	3.721.006,00	0,00
126055431	13.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Afrit: Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	33 - 17	2.323.016,00	2.323.016,00	0,00
126055839	28.12.2017	201712	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	41 - 17	3.058.734,00	3.058.734,00	0,00
126057185	20.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	16 - 18	3.410.372,00	3.410.372,00	0,00
125066026	26.1.2018	201801	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	2 - 18	2.462.417,00	2.462.417,00	0,00
127040027	9.3.2018														

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
125067210	26.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Sérsmiði hurðir og innréttingar Nauthólsvegur 100	110823	Smiðurinn þinn slf.		105.519.443,00	105.519.443,00	0,00
125068455	1.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Eldhúsinnrétting á starfsmannasvæði Nauthólsvegur 100	110823	Tréborg ehf.	0000374	1.787.500,00	1.787.500,00	0,00
127039865	27.2.2018	201802	5556	Endurnýjun áhalds, búnaðar og innréttinga	1108	20805	123038	912	Innborgun v/hurða og innréttinga v/Nauthólsvegur 100	110823	Tréborg ehf.	0000402	1.534.700,00	1.534.700,00	0,00
											Tréborg ehf.	0000360	480.000,00	480.000,00	0,00
91039038	6.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	v/ Nauthólsvegur 100	11173	Tréborg ehf.		3.802.200,00	3.802.200,00	0,00
125068973	28.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	KREDIT v. skil á vöru v. Nauthólsvegur 100	11173	Vélar og verkfæri ehf	R024566	968.230,00	968.230,00	0,00
91040097	19.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Lás - lásarhús v. Nauthólsvegur 100	11173	Vélar og verkfæri ehf	KR001774	-49.307,00	0,00	49.307,00
127040731	12.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	- KREDIT - R024566	11173	Vélar og verkfæri ehf	R025367	30.614,00	30.614,00	0,00
											Vélar og verkfæri ehf	KR001618	-729.461,00	0,00	729.461,00
125066408	20.2.2018	201802	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Fílisar v. Nauthólsvegur 100	12479	Vélar og verkfæri ehf		220.076,00	998.844,00	778.768,00
											Vidd ehf	0196106	478.538,00	478.538,00	0,00
											Vidd ehf		478.538,00	478.538,00	0,00
91031042	26.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Viroc black plötur v. Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0053629	18.536,00	18.536,00	0,00
91021146	8.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	v/Nauthólsvegur 100 Umb. Margrét Leifsdóttir Plötur og skrúfur	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0049001	239.048,00	239.048,00	0,00
91021158	9.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	v/Nauthólsvegur 100 Umb. Margrét Leifsdóttir Plötur og skrúfur	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0049055	292.877,00	292.877,00	0,00
91021159	9.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	KREDIT v. r. 0049001 v/Nauthólsvegur 100 Umb. Margrét Leifsdóttir Plötur og skrúfur	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0049056	-239.048,00	0,00	239.048,00
91039959	22.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Skrúfur v/ Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0057761	25.520,00	25.520,00	0,00
91041766	4.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	V/ Nauthólsvegur 100 Umb: Sigfús	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0059025	11.642,00	11.642,00	0,00
91038835	8.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Plötur og skrúfur v. Nauthólsvegur 100 v/ Bragga	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0057237	238.027,00	238.027,00	0,00
91038961	9.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Skrúfur v. Nauthólsvegur 100 v/ Bragga	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0057283	-5.810,00	0,00	5.810,00
91043688	24.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Plötur v/ Nauthólsvegur 100 Umb. Sigfús	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0059657	28.706,00	28.706,00	0,00
91037468	26.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	V/ Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0056888	952.023,00	952.023,00	0,00
91040159	3.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Viroc Brut plötur v/ Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0058030	17.971,00	17.971,00	0,00
											Þ.Porgímsson og Co ehf		1.579.492,00	1.824.350,00	244.858,00
125062921	18.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við þak Nauthólsvegi 100	109783	Þór Gunnarsson	20170940	379.905,00	379.905,00	0,00
126054834	28.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	45	679.830,00	679.830,00	0,00
125059625	24.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. spennur og grind Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170327	611.196,00	611.196,00	0,00
125059799	17.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. bragga Nauthólsvegi 100	109783	Þór Gunnarsson	20170328	434.372,00	434.372,00	0,00
125060723	20.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170530	623.844,00	623.844,00	0,00
126051406	31.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	31	571.857,00	571.857,00	0,00
125061520	17.7.2017	201707	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. þak Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170736	195.951,00	195.951,00	0,00
125060123	25.4.2017	201704	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170429	303.676,00	303.676,00	0,00
126051832	27.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	34	403.899,00	403.899,00	0,00
127036181	30.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	20170632	607.848,00	607.848,00	0,00
126054210	1.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	42	645.417,00	645.417,00	0,00
126054209	1.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	43	60.724,00	60.724,00	0,00
125063452	10.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við glugga ofl. Nauthólsvegi 100	109783	Þór Gunnarsson	20171044	383.904,00	383.904,00	0,00
127037350	23.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	46	740.308,00	740.308,00	0,00
125064430	30.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	2017-49	801.718,00	801.718,00	0,00
127040467	30.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	7	449.320,00	449.320,00	0,00
127039534	1.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	50	813.055,00	813.055,00	0,00
127039535	1.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Tryggingar v/Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	1	183.568,00	183.568,00	0,00
127040028	12.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	3	684.678,00	684.678,00	0,00
125067718	6.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	201804	855.848,00	855.848,00	0,00
127041025	28.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg	109783	Þór Gunnarsson	9	774.542,00	774.542,00	0,00
127039677	19.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	2	607.652,00	607.652,00	0,00
126057240	7.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	8	449.320,00	449.320,00	0,00
125069200	19.6.2018	201806	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	10	672.311,00	672.311,00	0,00
											Þór Gunnarsson		12.934.743,00	12.934.743,00	0,00
77006251	16.3.2016	201602	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		95.810,00	95.810,00	0,00
17012970	30.6.2016	201606	5422	Verkfærðæðingar og tæknifræðæðingar	1108	20805	123038		Verkfætþj.v Nauthólsvegur 100 kostnaður v ástandsmats flutt á ksn.stað 1108			-445.560,00	0,00	445.560,00	0,00
17012970	30.6.2016	201606	5422	Verkfærðæðingar og tæknifræðæðingar	1108	20805	123038		Verkfætþj.v Nauthólsvegur 100 kostnaður v ástandsmats 2015 flutt á framk.sv.		umsýsluþóknun		445.560,00	445.560,00	0,00
77006930	15.12.2016	201611	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		683.735,00	683.735,00	0,00
79066049	31.10.2016	201610	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		786.648,00	786.648,00	0,00
77006920	13.12.2016	201611	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		113.230,00	113.230,00	0,00
77007047	24.1.2017	201612	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		235.170,00	235.170,00	0,00
79071175	31.5.2017	201705	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		256.594,00	256.594,00	0,00
79071136	30.4.2017	201704	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		526.710,00	526.710,00	0,00
79071511	31.7.2017	201707	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		501.082,00	501.082,00	0,00
79059400	30.4.2016	201604	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		254.863,00	254.863,00	0,00
79065141	30.9.2016	201609	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		209.192,00	209.192,00	0,00
79064358	31.8.2016	201608	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		95.831,00	95.831,00	0,00
79057775	31.3.2016	201603	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		199.946,00	199.946,00	0,00
79057758	31.3.2016	201603	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		302.011,00	302.011,00	0,00
79063482	31.7.2016	201607	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		18.344,00	18.344,00	0,00
79060378	30.6.2016	201606	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýsluþóknun		247.661,00	247.6	

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
79072108	30.11.2017	201711	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		261.812,00	261.812,00	0,00
79071633	31.8.2017	201708	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		134.728,00	134.728,00	0,00
79071922	31.10.2017	201710	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		132.371,00	132.371,00	0,00
77008832	16.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		91.920,14	91.920,14	0,00
77008829	15.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		111.389,00	111.389,00	0,00
77008828	15.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		203.406,00	203.406,00	0,00
77009047	19.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		179.869,02	179.869,02	0,00
77008830	15.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		53.273,00	53.273,00	0,00
79072798	31.3.2018	201803	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		516.337,00	516.337,00	0,00
79073238	30.6.2018	201806	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		686.189,00	686.189,00	0,00
79072698	28.2.2018	201802	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		358.152,00	358.152,00	0,00
79072698	28.2.2018	201802	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038		Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		11.576,00	11.576,00	0,00
79072694	31.1.2018	201801	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		343.353,00	343.353,00	0,00
79072919	30.4.2018	201804	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		825.219,00	825.219,00	0,00
79073049	31.5.2018	201805	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		288.945,00	288.945,00	0,00
79073408	31.7.2018	201807	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		20.449,00	20.449,00	0,00
umsýslubóknun													12.114.682,58	12.560.242,58	445.560,00
Heildarsumma													403.992.836,58	405.729.624,58	1.736.788,00

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
126049608	21.12.2016	201612	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Járnavinna sökkjar v/ Braggi Nauthólsvik	30534	Ari Oddsson ehf	0001671	506.320,00	506.320,00	0,00
126057642	8.2.2017	201805	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Járnavinna v/ Bragginn Nauthólsvik	30534	Ari Oddsson ehf	0001277	255.889,00	255.889,00	0,00
125054880	8.12.2016	201612	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Inndæling í sprungur Bragginn Nauthólsvegi	30534	Ari Oddsson ehf	0001663	734.999,00	734.999,00	0,00
125060947	2.6.2017	201706	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrvíðgerðir ofl. v. Nauthólsvegur 100	30534	Ari Oddsson ehf	0001812	4.824.135,00	4.824.135,00	0,00
125061776	2.8.2017	201708	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrvinna v. Braggi Nauthólsvegur 100	30534	Ari Oddsson ehf	0001884	3.409.718,00	3.409.718,00	0,00
125061777	31.7.2017	201708	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Slipun og lökkun gólfa Nauthólsvegur 100	30534	Ari Oddsson ehf	0001880	3.330.997,00	3.330.997,00	0,00
125057530	1.2.2017	201702	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrverk og steypa v. Braggi Nauthólsvik	30534	Ari Oddsson ehf	0001714	2.150.938,00	2.150.938,00	0,00
126052272	10.7.2017	201707	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Braggi Nauthólsvegi vegna vinnu 26.maí-10.júlí 2017	30534	Ari Oddsson ehf	0001855	9.761.985,00	9.761.985,00	0,00
126054149	28.9.2017	201709	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrverk Nauthólsvik Braggi/Náðhús	30534	Ari Oddsson ehf	0001927	1.928.680,00	1.928.680,00	0,00
126055558	8.12.2017	201712	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	v/ Nauthólsvik múrverk og steypa	30534	Ari Oddsson ehf	0001989	1.309.464,00	1.309.464,00	0,00
126057041	7.4.2018	201804	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	v/ Nauhólsvegur 100 múrverk og flisalagnir	30534	Ari Oddsson ehf	0002106	4.417.968,00	4.417.968,00	0,00
126057621	1.6.2018	201806	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Múrverk Bragginn Nauthólsvegi apríl til júní 2018	30534	Ari Oddsson ehf	0002167	3.815.194,00	3.815.194,00	0,00
									Ari Oddsson ehf				36.446.287,00	36.446.287,00	0,00
127035830	20.6.2017	201705	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnun í maí v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0395	189.189,00	189.189,00	0,00
126053696	6.9.2017	201709	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna: Eftirlit í júní, júlí og ágúst v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0401	906.432,00	906.432,00	0,00
126053697	6.9.2017	201709	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna: hönnun í júní, júlí, ágúst og fundir v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0399	538.194,00	538.194,00	0,00
125064028	1.11.2017	201711	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0408	391.635,00	391.635,00	0,00
125059645	1.4.2017	201704	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0383	414.090,00	414.090,00	0,00
125059646	1.4.2017	201704	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0382	676.347,00	676.347,00	0,00
125059305	1.3.2017	201703	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0379	1.587.345,00	1.587.345,00	0,00
125045223	1.3.2016	201603	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.vinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0346	1.747.147,00	1.747.147,00	0,00
125048439	1.6.2016	201606	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0356	2.681.081,00	2.681.081,00	0,00
126048888	1.11.2016	201610	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnun og fundir í sept-okt v.Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0368	1.166.412,00	1.166.412,00	0,00
126046667	1.5.2016	201604	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektatj.pj. v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0351	2.180.599,00	2.180.599,00	0,00
125046148	1.4.2016	201604	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0348	1.026.949,00	1.026.949,00	0,00
125050920	5.9.2016	201609	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0364	822.300,00	822.300,00	0,00
127034065	10.2.2016	201602	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektav. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0344	1.753.092,00	1.753.092,00	0,00
126048012	1.8.2016	201608	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 - hönnun, fundir o.fl.	27254	Arkibúllan ehf	0359	1.889.127,00	1.889.127,00	0,00
125060566	1.5.2017	201705	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0388	263.228,00	263.228,00	0,00
126049648	21.12.2016	201612	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvik 100 - hönnun, uppfæra módel o.fl.	27254	Arkibúllan ehf	0371	1.145.649,00	1.145.649,00	0,00
125064759	13.12.2017	201712	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0420	661.434,00	661.434,00	0,00
127039633	7.2.2018	201802	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnunarvinna við Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0431	673.118,00	673.118,00	0,00
125065714	8.3.2018	201803	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektarbj. - Hönnunarvinna við Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0439	440.760,00	440.760,00	0,00
126056715	8.3.2018	201803	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektarbj. - Vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0440	555.651,00	555.651,00	0,00
125067932	30.3.2018	201804	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0449	250.002,00	250.002,00	0,00
126057036	30.3.2018	201803	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektarbj. vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0446	419.121,00	419.121,00	0,00
127039078	30.12.2017	201712	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnunarvinna við Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0426	153.090,00	153.090,00	0,00
125068418	30.4.2018	201804	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0452	213.440,00	213.440,00	0,00
127035829	20.6.2017	201705	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Umsjón og eftirlit apríl-maí v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0391	539.539,00	539.539,00	0,00
125064027	1.11.2017	201711	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit og fundir v. Nauthólsvegur 100 framkv.	27254	Arkibúllan ehf	0409	587.452,00	587.452,00	0,00
125059306	1.3.2017	201703	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit v. framkv. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0378	779.869,00	779.869,00	0,00
126048887	1.11.2016	201610	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Umsjón og eftirlit í sept-okt v.Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0367	413.671,00	413.671,00	0,00
126049649	21.12.2016	201612	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvik 100 - Eftirlit með framkvæmdum	27254	Arkibúllan ehf	0374	324.370,00	324.370,00	0,00
127038619	31.12.2017	201712	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit v/Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0421	298.890,00	298.890,00	0,00
127039632	7.2.2018	201802	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0432	563.370,00	563.370,00	0,00
125068419	30.4.2018	201804	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Eftirlit v. framkv. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0453	507.840,00	507.840,00	0,00
127041916	30.6.2018	201806	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Vinna við eftirlit fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0457	956.800,00	956.800,00	0,00
125069568	30.7.2018	201807	5438	Eftirlit sérfræðinga	1108	20805	123038	13099	Vinna við eftirlit og verkefnisstjórn fyrir Nauthólsveg 100	27254	Arkibúllan ehf	0461	250.240,00	250.240,00	0,00
125059644	1.4.2017	201704	5490	Prentun, fjölríttun, bókbáand, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun og plöstun teikninga v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0385	115.159,00	115.159,00	0,00
125064276	4.11.2017	201711	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Ljós v. Nauthólsvegur 100	27254	Arkibúllan ehf	0416	281.686,00	281.686,00	0,00
									Arkibúllan ehf				28.364.318,00	28.364.318,00	0,00
47977884	9.5.2017	201705	5589	Önnur tæki og búnaður	1108	20805	123038	13099	Greiða Berlinord 8.450 EUR	110150	Berlinord	090517-1	956.619,00	956.619,00	0,00
									Berlinord				956.619,00	956.619,00	0,00
127040534	25.4.2018	201804	5542	Blikksmíði	1108	20805	123038	13099	Einangruð þaklúga - Nauthólsvik	11570	Blikksmíðurinn hf	0026742	339.373,00	339.373,00	0,00
125056602	31.12.2016	201612	5553	Viðhalds- og þjónustusamningur	1108	20805	123038	13099	Vinna v. loftræsting Nauthóli braggi	11570	Blikksmíðurinn hf	0023111	1.852.206,00	1.852.206,00	0,00
125067681	31.3.2018	201804	5553	Viðhalds- og þjónustusamningur	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 - veitingastaður loftræsting	11570	Blikksmíðurinn hf	0026609	13.679.205,00	13.679.205,00	0,00
									Blikksmíðurinn hf				15.870.784,00	15.870.784,00	0,00
91020443	31.3.2017	201703	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Vinna við hönnun lóðar Nauthólsveg 100	95893	Dagný Land Design ehf	0000125	587.500,00	587.500,00	0,00
91029441	6.9.2017	201709	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Plöntuval á lóð v. Nauthólsvegur 100	95893	Dagný Land Design ehf	0000145	140.690,00	140.690,00	0,00
91031009	30.10.2017	201710	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Aukaverk, breyting á teikningu v. Nauthólsvegur 100	95893	Dagný Land Design ehf	0000152	324.000,00	324.000,00	0,00
125059599	7.3.2017	201703	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Hönnun lóðar v. Nauthólsveg 100 40% af tilboði (sjá fylgiskjal)	95893	Dagný Land Design ehf	0000123	485.460,00	485.460,00	0,00
91029633	2.10.2017	201710	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræ											

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
91017323	31.10.2016	201610	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR051589	3.565.545,00	3.565.545,00	0,00
91016543	30.9.2016	201609	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf. þj. 3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR050270	820.215,00	820.215,00	0,00
91013494	30.4.2016	201604	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR046229	499.298,00	499.298,00	0,00
91012526	31.3.2016	201603	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR045361	305.900,00	305.900,00	0,00
91015605	31.8.2016	201608	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR049118	557.260,00	557.260,00	0,00
91012117	29.2.2016	201602	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR044933	693.544,00	693.544,00	0,00
91015294	31.7.2016	201607	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat Nauthóls	11091	Efla hf	SR048854	886.490,00	886.490,00	0,00
91018752	31.12.2016	201612	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR053591	1.064.650,00	1.064.650,00	0,00
91019465	31.1.2017	201701	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat Nauthólsvegur 100	11091	Efla hf	SR054489	2.822.000,00	2.822.000,00	0,00
91021285	30.4.2017	201704	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR056976	396.430,00	396.430,00	0,00
91026441	30.6.2017	201707	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR059347	482.195,00	482.195,00	0,00
91018251	30.11.2016	201612	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR052784	2.418.191,00	2.418.191,00	0,00
91030733	30.9.2017	201709	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	3336-808 Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR062071	1.264.285,00	1.264.285,00	0,00
91034421	30.11.2017	201711	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat - þóknun f. verkfr.þj.	11091	Efla hf	SR064139	623.995,00	623.995,00	0,00
91032355	31.10.2017	201711	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Þóknun f. verkfr.þj. v. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR063022	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00
91034806	31.12.2017	201712	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat. Þóknun f. verkfr.þj.	11091	Efla hf	SR064456	94.325,00	94.325,00	0,00
91041999	30.4.2018	201804	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat Verkbnr: 123038 Þóknun fyrir verkfræðipjónustu 01.04.18 - 30.04.18	11091	Efla hf	SR068474	77.175,00	77.175,00	0,00
91036438	31.1.2018	201801	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkfærðipj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR065696	1.164.764,00	1.164.764,00	0,00
91039105	28.2.2018	201802	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR066884	300.125,00	300.125,00	0,00
91041439	31.3.2018	201803	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.þj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR068078	463.050,00	463.050,00	0,00
91043756	31.5.2018	201805	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.þj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR069320	179.762,00	179.762,00	0,00
91047601	31.7.2018	201807	5422	Verkfærðingar og tæknifræðingar	1108	20805	123038	13099	Brunahönnun, Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR071702	30.624,00	30.624,00	0,00
91045745	30.6.2018	201806	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Verkf.þj. Nauthólsvegur 100 ástandsmat	11091	Efla hf	SR070508	289.298,00	289.298,00	0,00
										Efla hf			26.887.763,00	26.887.763,00	0,00
125068877	30.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Borðplata v. Nauthólsvegur 100	111878	Fell síf.	0000158	421.600,00	421.600,00	0,00
										Fell síf.			421.600,00	421.600,00	0,00
127037247	9.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Bárujárn og pappi á bragga vinna v/Nauthólsvegur 100	109849	Fílísar og steinn ehf.	SR000689	2.799.800,00	2.799.800,00	0,00
127040448	15.4.2018	201804	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Bárujárn og pappi á bragga v/Nauthólsveg 100	109849	Fílísar og steinn ehf.	SR000766	855.350,00	855.350,00	0,00
										Fílísar og steinn ehf.			3.655.150,00	3.655.150,00	0,00
125056591	15.1.2017	201701	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Flutningur á vörum v. endurgerð Nauthólsvegur 100	108894	Fraktlausnir ehf.	0001569	14.201,00	14.201,00	0,00
126049565	15.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Flutningsgjöld v.skemmuþaks v/Nauthólsvegur 100	108894	Fraktlausnir ehf.	0001441	156.608,00	156.608,00	0,00
										Fraktlausnir ehf.			170.809,00	170.809,00	0,00
125047774	9.5.2016	201605	5439	Önnur sérfræðipjónusta	1108	20805	123038	13099	Textagerð v. Nauthólsvegur 100	106841	Fríðþór Eydal	20160504	100.000,00	100.000,00	0,00
										Fríðþór Eydal			100.000,00	100.000,00	0,00
127037262	9.11.2017	201711	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Frágangur lóðar, Nauthólsvegi 100	99267	Garðvélar ehf.	100700	8.490.900,00	8.490.900,00	0,00
125065479	31.12.2017	201712	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 frágangur lóðar	99267	Garðvélar ehf.	100767	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
125069354	25.6.2018	201806	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - aukaverk í verkstöðu 4	99267	Garðvélar ehf.	100808	3.168.300,00	3.168.300,00	0,00
125069922	15.8.2018	201808	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - Aukaverk skv. meðf. Verstöðu 5	99267	Garðvélar ehf.	100826	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
125068302	25.4.2018	201804	5562	Útboðsverk, aukaverk	1108	20805	123038	13099	Aukaverk Nauthólsvegur 100 frágangur lóðar	99267	Garðvélar ehf.	100777	3.307.890,00	3.307.890,00	0,00
125069354	25.6.2018	201806	5562	Útboðsverk, aukaverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - aukaverk í verkstöðu 4	99267	Garðvélar ehf.	100808	1.675.900,00	1.675.900,00	0,00
125069922	15.8.2018	201808	5562	Útboðsverk, aukaverk	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 Frágangur lóðar, fyrsti áfangi - Aukaverk skv. meðf. Verstöðu 5	99267	Garðvélar ehf.	100826	150.000,00	150.000,00	0,00
										Garðvélar ehf.			20.982.990,00	20.982.990,00	0,00
125058713	7.3.2017	201703	5525	Vélaleiga	1108	20805	123038	13099	Grafíð fyrir þró Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000757	218.488,00	218.488,00	0,00
125054232	2.12.2016	201612	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvinna Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000708	369.148,00	369.148,00	0,00
127035841	2.6.2017	201706	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Vinna við að grafa skurð, sanda og ganga frá aftur v. Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000796	605.229,00	605.229,00	0,00
125058714	24.2.2017	201702	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvegsskipti of. Nauthólsvikurvegi 100	75696	GÓ Verk ehf	0000745	3.757.329,00	3.757.329,00	0,00
125057529	9.2.2017	201702	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvinna v. Nauthólsvegur 100	75696	GÓ Verk ehf	0000744	2.851.082,00	2.851.082,00	0,00
127036824	23.10.2017	201710	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Grafa skurð og mæta á fund v/Nauthólsvikur	75696	GÓ Verk ehf	0000863	257.058,00	257.058,00	0,00
										GÓ Verk ehf			8.058.334,00	8.058.334,00	0,00
126052443	30.6.2017	201707	5524	Vörubilar, dráttarbilar, festivagnar	1108	20805	123038	13099	Flutningur á stálstyrkinum	36736	Hamar ehf	SR17001954	62.488,00	62.488,00	0,00
126055071	14.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiða tengjárn í mæni v. Nauthólsvegur 100	36736	Hamar ehf	SR17003689	111.018,00	111.018,00	0,00
127040977	24.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiði á gólf í tæknirími v/Nauthólsvegur 100	36736	Hamar ehf	SR18001447	752.757,00	752.757,00	0,00
127042294	10.7.2018	201807	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smið á gjörðum utan um náðhús	36736	Hamar ehf	SR18002014	469.989,00</		

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
127039758	25.2.2018	201802	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Lofbitar í skemmu hreinsaðir og málaðir v/Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1479	640.870,00	640.870,00	0,00
126056938	8.4.2018	201804	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Málningarvinna v. Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1486	625.904,00	625.904,00	0,00
127040771	6.5.2018	201805	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Steinn málaður v/Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1492	395.240,00	395.240,00	0,00
126057626	3.6.2018	201806	5543	Málun	1108	20805	123038	13099	Arin hreinsaður og oliuborinn. Gólfistar málaðir og annar lokafrágangur v. Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1495	336.898,00	336.898,00	0,00
125067406	25.3.2018	201803	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Málningarvinna Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1484	905.107,00	905.107,00	0,00
125068562	20.5.2018	201805	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Málningarvinna Nauthólsvegur 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1494	306.873,00	306.873,00	0,00
127041519	18.6.2018	201806	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Ýmis lokafrágangur innan og utanhúss v/Nauthólsveg 100	16531	Jóhann Viktor Steimann	1498	388.217,00	388.217,00	0,00
125057855	31.1.2017	201701	5524	Vörubílar, dráttarbílar, festivagnar	1108	20805	123038	13099	Flutningur v. Nauthólsvegur 100	109377	Július Jónsson	1638	4.700,00	4.700,00	0,00
126057876	12.6.2018	201806	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	116231	Július Jónsson		4.700,00	4.700,00	0,00
126057938	30.4.2018	201806	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	116231	Landið okkar ehf.	16	4.506.019,00	4.506.019,00	0,00
91032771	30.11.2017	201711	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Arkitektavinna v. Nauthólsvegur 100	50196	Landið okkar ehf.	13	1.231.972,00	1.231.972,00	0,00
91034813	31.12.2017	201712	5423	Arkitektar, land- og skipulagsfræðingar	1108	20805	123038	13099	Sérfr.vinna v. Nauthólsvik	50196	Landið okkar ehf.		5.737.991,00	5.737.991,00	0,00
125055805	30.12.2016	201612	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vörur v. Nauthólsvegur 100 framkvæmdir	85244	Landmótun sf	105486	136.697,00	136.697,00	0,00
127034669	11.1.2017	201701	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vörur v. Nauthólsvegur 100 framkvæmdir	85244	Landmótun sf	105586	36.475,00	36.475,00	0,00
125053709	31.10.2016	201610	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Pak á skemmu Nauthólsvegur 100	85244	Landmótun sf		173.172,00	173.172,00	0,00
125053803	5.11.2016	201611	5455	Móttöku- og eyðingargjöld	1108	20805	123038	13099	Sorpa og hringrás v rif á bragga ofl Nauthólsvik	66141	Limtré Virnet ehf	VR008676	733.817,00	733.817,00	0,00
125053804	11.10.2016	201610	5455	Móttöku- og eyðingargjöld	1108	20805	123038	13099	Sorpa v. rif á bragga ofl. Nauthólsvik (get ekki sundurl. akstur í Sorpu)	66141	Limtré Virnet ehf	VR008702	458.096,00	458.096,00	0,00
125056177	1.1.2017	201701	5513	Áhald- og verkfæraleiga + verkallar og mót	1108	20805	123038	13099	Leiga á skástífum ofl. v. Nauthólsvegur 100	66141	Limtré Virnet ehf	VR008376	2.670.145,00	2.670.145,00	0,00
127043781	15.8.2018	201808	5513	Áhald- og verkfæraleiga + verkallar og mót	1108	20805	123038	13099	Leiga á skáskífum og stífusteinum og fl. vegna stífunar náðhúss. Nauthólsvegur 100	66141	Limtré Virnet ehf		3.862.058,00	3.862.058,00	0,00
126049189	25.10.2016	201611	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvik - Vinna við rif á bragga o.fl.	66141	MG-hús ehf	1733	182.027,00	182.027,00	0,00
125053801	22.10.2016	201610	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Sala á efni v. Nauthólsvik rif á bragga	66141	MG-hús ehf	1727	103.374,00	103.374,00	0,00
125053803	5.11.2016	201611	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. rif á bragga ofl. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1763	130.118,00	130.118,00	0,00
125053804	11.10.2016	201610	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Sorpa v. rif á bragga ofl. Nauthólsvik (get ekki sundurl. akstur í Sorpu)	66141	MG-hús ehf	1928	248.376,00	248.376,00	0,00
125047338	4.5.2016	201605	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vinna við gölf, veggi og loft Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1749	6.573.023,00	6.573.023,00	0,00
127043780	1.8.2018	201808	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1735	38.321,00	38.321,00	0,00
125053802	21.10.2016	201610	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvinna v. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1733	150.729,00	150.729,00	0,00
125056176	9.11.2016	201612	5548	Jarðvinna og yfirborðsfrágangur	1108	20805	123038	13099	Jarðvegspúðar undir sökkli Nauthólsvegur 100	66141	MG-hús ehf	1727	7.525.499,00	7.525.499,00	0,00
125051791	11.9.2016	201609	5557	Lóð	1108	20805	123038	13099	Smiða vinnugirðingar v. Nauthólsvik	66141	MG-hús ehf	1595	6.009.653,00	6.009.653,00	0,00
125058925	2.3.2017	201703	5439	Önnur sérfræðipjónusta	1108	20805	123038	13099	Mæling v. lóðarhönnun Nauthólsvegur 100	10369	MG-hús ehf	1929	635.762,00	635.762,00	0,00
126056956	31.3.2018	201803	5417	Sendibílar - vöruflutningar	1108	20805	123038	13099	Sótt efni í Þ. Þorgrímsson og ekið á Nauthólsveg	11753	MG-hús ehf	1728	1.675.200,00	1.675.200,00	0,00
126056957	31.3.2018	201803	5417	Sendibílar - vöruflutningar	1108	20805	123038	13099	Sótt efni í Þ. Þorgrímsson og ekið á Nauthólsveg 100 v/ Bragga	11753	MG-hús ehf	1762	2.503.304,00	2.503.304,00	0,00
126057252	30.4.2018	201804	5417	Sendibílar - vöruflutningar	1108	20805	123038	13099	Sóttar hurðir í sprautun og ekið á Nauthólsveg	11753	MG-hús ehf	1705	4.073.358,00	4.073.358,00	0,00
91034016	13.12.2017	201712	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	MG-hús ehf		29.848.744,00	29.848.744,00	0,00
91031929	13.11.2017	201711	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Mæling ehf	0004833	212.000,00	212.000,00	0,00
91039557	13.3.2018	201803	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Mæling ehf		212.000,00	212.000,00	0,00
91041429	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q1 - RAFMAGN -	98713	Nýja sendibílastöðin hf	006227	8.330,00	8.330,00	0,00
91041435	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q2 - RAFMAGN -	98713	Nýja sendibílastöðin hf	006224	9.130,00	9.130,00	0,00
91041436	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q3 - RAFMAGN -	98713	Nýja sendibílastöðin hf	007615	15.150,00	15.150,00	0,00
91041262	11.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Nýja sendibílastöðin hf		32.610,00	32.610,00	0,00
91046498	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20177110737	234,00	234,00	0,00
91046499	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20177013480	15,00	15,00	0,00
91046497	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186246863	247,00	247,00	0,00
91046762	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186386182	3.987,00	3.987,00	0,00
91035454	11.1.2018	201801	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186386180	9.967,00	9.967,00	0,00
91037003	13.2.2018	201802	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186386181	3.987,00	3.987,00	0,00
91042821	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186343344	239,00	239,00	0,00
91042848	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676734	4.944,00	4.944,00	0,00
91042849	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676735	4.944,00	4.944,00	0,00
91042568	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676733	12.359,00	12.359,00	0,00
91045009	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676735	4.944,00	4.944,00	0,00
91044686	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186676733	12.359,00	12.359,00	0,00
91044720	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186634212	247,00	247,00	0,00
91044721	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186535556	247,00	247,00	0,00
91047932	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186150295	223,00	223,00	0,00
91048290	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186440113	247,00	247,00	0,00
91048291	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186482726	4.944,00	4.944,00	0,00
91047976	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orka náttúrunnar ohf.	98713	Orka náttúrunnar ohf.	20186482727	4.944,00	4.944,00	0,00
91033658	13.12.2017	201712	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orka náttúrunnar ohf.	20186386180	9.967,00	9.967,00	0,00
91031962	13.11.2017	201711	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orka náttúrunnar ohf.	20186386181	3.987,00	3.987,00	0,00
91039380	13.3.2018	201803	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orka náttúrunnar ohf.	20186343344	239,00	239,00	0,00
91041428	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q1 - RAFMAGN -	98365	Orka náttúrunnar ohf.	20186537077	239,00	239,00	0,00
91041433	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q2 - RAFMAGN -	98365	Orka náttúrunnar ohf.	20186579650	11.960,00	11.960,00	0,00
91041434	16.4.2018	201804	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100, Q3 - RAFMAGN -	98365	Orka náttúrunnar ohf.	20186579651	4.822,00	4.822,00	0,00
91040689	11.4.2018	201804	5270												

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Víd2	Víd3	Víd4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
91046668	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181106466	5.618,00	5.618,00	0,00
91046377	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181106465	5.618,00	5.618,00	0,00
91046376	11.7.2018	201807	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181106464	12.388,00	12.388,00	0,00
91035312	11.1.2018	201801	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180096247	1.328,00	1.328,00	0,00
91037143	13.2.2018	201802	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180254307	1.200,00	1.200,00	0,00
91042730	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180789199	5.587,00	5.587,00	0,00
91042450	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180789198	12.311,00	12.311,00	0,00
91042676	14.5.2018	201805	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180728543	1.328,00	1.328,00	0,00
91044600	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180947632	5.408,00	5.408,00	0,00
91044883	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180947633	5.408,00	5.408,00	0,00
91044882	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180947631	11.914,00	11.914,00	0,00
91044541	13.6.2018	201806	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180886973	1.287,00	1.287,00	0,00
91048101	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181204605	1.330,00	1.330,00	0,00
91048453	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181265276	12.388,00	12.388,00	0,00
91048454	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181265277	5.618,00	5.618,00	0,00
91048455	13.8.2018	201808	5270	Rafmagn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181265278	5.618,00	5.618,00	0,00
91033704	13.12.2017	201712	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171883608	30.815,00	30.815,00	0,00
91031837	13.11.2017	201711	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171723345	42.873,00	42.873,00	0,00
91039433	13.3.2018	201803	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180471838	31.134,00	31.134,00	0,00
91041068	11.4.2018	201804	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180629536	30.168,00	30.168,00	0,00
91046375	11.7.2018	201807	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181105187	31.517,00	31.517,00	0,00
91035545	11.1.2018	201801	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180155454	31.134,00	31.134,00	0,00
91037184	13.2.2018	201802	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180313528	28.232,00	28.232,00	0,00
91042449	14.5.2018	201805	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180787905	31.134,00	31.134,00	0,00
91044881	13.6.2018	201806	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180946340	30.168,00	30.168,00	0,00
91048491	13.8.2018	201808	5271	Hiti	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181264001	31.517,00	31.517,00	0,00
91033399	13.12.2017	201712	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171883607	4.269,00	4.269,00	0,00
91032001	13.11.2017	201711	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20171723344	5.924,00	5.924,00	0,00
91039432	13.3.2018	201803	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180471837	4.369,00	4.369,00	0,00
91040750	11.4.2018	201804	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180629535	4.244,00	4.244,00	0,00
91046666	11.7.2018	201807	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181105186	4.465,00	4.465,00	0,00
91035544	11.1.2018	201801	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180155453	4.369,00	4.369,00	0,00
91037183	13.2.2018	201802	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180313527	3.954,00	3.954,00	0,00
91042448	14.5.2018	201805	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180787904	4.394,00	4.394,00	0,00
91044880	13.6.2018	201806	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20180946339	4.244,00	4.244,00	0,00
91048490	13.8.2018	201808	5387	Kalt vatn	1108	20805	123038	13099	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	98365	Orkuveita Reykjav - Veitur ohf.	20181264000	4.465,00	4.465,00	0,00
126051144	24.5.2017	201705	5549	Vinna Orkuveitu Reykjavíkur	1108	20805	123038	13099	Ný heimlögn v. Nauthólsvegur 100	24659	Orkuveita Reykjavíkur	4018652	820.303,00	820.303,00	0,00
125066027	29.1.2018	201801	5549	Vinna Orkuveitu Reykjavíkur	1108	20805	123038	13099	Breyting á heimlögn rafmagn Nauthólsvegur 100	24659	Orkuveita Reykjavíkur	4019444	1.363.273,00	1.363.273,00	0,00
125065738	12.12.2017	201712	5710	Fundargjöld	1108	20805	123038	13099	Útl. kostnaður v. veitingar v. Nauthólsvegur 100	17177	Ólafur I Halldórsson	201716	43.966,00	43.966,00	0,00
91031121	31.10.2017	201710	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR092737	3.162,00	3.162,00	0,00
91030947	25.10.2017	201710	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun og plöstun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR092282	5.972,00	5.972,00	0,00
91031383	8.11.2017	201711	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR093020	4.743,00	4.743,00	0,00
91031141	31.10.2017	201710	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun í lit v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR092670	1.581,00	1.581,00	0,00
91032911	7.12.2017	201712	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR094639	4.032,00	4.032,00	0,00
91041858	30.4.2018	201804	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR101934	3.516,00	3.516,00	0,00
91036447	12.2.2018	201802	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR097990	911,00	911,00	0,00
91038849	28.2.2018	201802	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR098570	978,00	978,00	0,00
91040646	13.4.2018	201804	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR101040	759,00	759,00	0,00
91037349	16.2.2018	201802	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Prentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR098176	1.214,00	1.214,00	0,00
91040514	10.4.2018	201804	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR100706	1.518,00	1.518,00	0,00
91040304	31.3.2018	201803	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun, Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR100349	3.508,00	3.508,00	0,00
91048762	24.8.2018	201808	5490	Prentun, fjölritun, bókkband, ljósritun og skónnun	1108	20805	123038	13099	Útprentun v. Nauthólsvegur 100	36710	Pixel ehf	SR106750	379,00	379,00	0,00
126050560	3.5.2017	201705	5560	Útboðsverk	1108	20805	123038	13099	Tilboð í stálsmiðina á stál-gluggum í BRAGGA-skemmu Nauthólsvík	36340	Pixel ehf		32.273,00	32.273,00	0,00
127042039	30.6.2018	201806	5540	Húsasmíði	1108	20805	123038	13099	Braggi Nauthólsvík barborð	103628	Prófilstál ehf	007314	4.586.515,00	4.586.515,00	0,00
125068874	28.5.2018	201805	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Raflagnaefni v. Nauthólsvegur 100	103628	Raflís ehf.	1249	121.999,00	121.999,00	0,00
126057812	8.6.2018	201807	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Raflagnavinna: Braggi Nauthólsvík	103628	Raflís ehf.	1208	190.062,00	190.062,00	0,00
127042565	13.7.2018	201807	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Rafvirkjavinna og efniskaup, Nauthólsvegur	103628	Raflís ehf.	1226	492.986,00	492.986,00	0,00
125047598	13.5.2016	201605	5553	Víðhalds- og þjónustusamningur	1108	20805	123038	13099	Víðhald raflögn Skemma Nauthólsvík niðurri raflagna	13397	Raflís ehf.	1259	286.948,00	286.948,00	0,00
126052832	3.8.2017	201708	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. Nauthóll 100	12005	Raflýsing ehf	011822	98.828,00	98.828,00	0,00
127034727	30.12.2016	201701	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. Nauthóll 100	12005	Raflýsing ehf		98.828,00	98.828,00	0,00
126049609	19.12.2016	201612	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Tilf.víðh.raflagna - vinna v/lampa, lýsingar o.fl. v.Nauthóll 100	12005	Rafrún ehf	000243	5.177.346,00	5.177.346,00	0,00
127037853	13.12.2017	201712	5545	Raflögn	1108	20805	123038	13099	Vinna við raflagnir Nauthóll	12005	Rafrún ehf	001868	132.131,00	132.131,00	0,00
125066223	5.2.20														

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Víd2	Víd3	Víd4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
200009716	31.1.2018	201802	5471	Auglýsingar (birting)	1108	20805	123038	13099	Útl. kostn. v/auglýsingar skipulagsáætla	11853	Reykjavíkurborg	89698784	42.300,00	42.300,00	0,00
200005834	20.4.2016	201603	5472	Ljósmyndun, myndbanda- og kvikmyndagerð	1108	20805	123038	13099	Myndaafgreiðsla - Nauthólsvík braggar	11853	Reykjavíkurborg	89241955	24.678,00	24.678,00	0,00
126054697	6.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Staurar v/ Nauthólsvegur 100	11853	Reykjavíkurborg	89635660	100.000,00	100.000,00	0,00
200009075	6.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Staurar v/ Nauthólsvegur 100	11853	Reykjavíkurborg	89635659	124.000,00	124.000,00	0,00
17015502	6.11.2017	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Bakf. #200009075 v. Krafá #89635659 var bakf. í RK sjá #17513145	11853	Reykjavíkurborg		-124.000,00	0,00	124.000,00
91024994	20.6.2017	201706	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Yfirferð raflagnateikninga, Erindi :BN051425 Nauthólsvegur 100	11853	Reykjavíkurborg	89555871	22.000,00	22.000,00	0,00
200006834	5.10.2016	201610	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Byggingarleiðf, Erindi :BN051425 Nauthólsvegur 100 Endurbýgging bragga og náðhúss	11853	Reykjavíkurborg	89352112	152.257,00	152.257,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Lokaúttekt, Erindi :BN051425	11853	Reykjavíkurborg	89320408	19.200,00	19.200,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Yfirferð sérteikninga, Erindi :BN051425	11853	Reykjavíkurborg	89320408	45.000,00	45.000,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Vottorð um lokaúttekt erindi BN051425 Nauthólsvegur 100 - Endurbýgging bragga og náðhúss	11853	Reykjavíkurborg	89320408	16.500,00	16.500,00	0,00
200006634	23.8.2016	201608	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Áfangaúttektir, Erindi :BN051425 8 x 9600 kr/útt.	11853	Reykjavíkurborg	89320408	76.800,00	76.800,00	0,00
200007518	7.2.2017	201702	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Lágmarksgjald, Erindi :BN052326 Nauthólsvegur 100 breyting á áður samþykktum teikningum	11853	Reykjavíkurborg	89451856	11.000,00	11.000,00	0,00
200009716	31.1.2018	201802	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostn. v/verul. breytinga á delisikupil.	11853	Reykjavíkurborg	89698784	315.000,00	315.000,00	0,00
200009893	28.3.2018	201803	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Lágmarksgjald, Erindi :BN054450 - Nauthólsvegur 100 - Reyndarteikningar - Byggl.umsókn - Nauthólsv. 100	11853	Reykjavíkurborg	89748734	11.000,00	11.000,00	0,00
											Reykjavíkurborg		835.735,00	959.735,00	124.000,00
127040476	28.3.2018	201804	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	PP0487838 Nauthólsvegur 100	10741	Securitas hf	PR+18071804	606.954,00	606.954,00	0,00
127040477	9.4.2018	201804	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	PP0491668 Nauthólsvegur 100	10741	Securitas hf	PR+18072562	145.599,00	145.599,00	0,00
125068851	30.4.2018	201805	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	Nauthólsvegur 100 búnaður	10741	Securitas hf	PR+18090585	1.075.944,00	1.075.944,00	0,00
127042423	12.6.2018	201807	5437	Öryggisvarsla	1108	20805	123038	13099	- KREDIT	10741	Securitas hf	PRK032750	-143.602,00	0,00	143.602,00
											Securitas hf		1.684.895,00	1.828.497,00	143.602,00
127039939	28.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiði á bargrind í bragga Nauthólsvík v/feb	31456	Sérsmiði ehf	1655	550.000,00	550.000,00	0,00
127041134	29.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við bar Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1688	369.520,00	369.520,00	0,00
127039273	29.1.2018	201801	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiði á bargrind í bragga Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1640	300.000,00	300.000,00	0,00
127040593	30.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Uppsetning á bar Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1674	1.055.240,00	1.055.240,00	0,00
127042431	10.7.2018	201807	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Glerskermur og uppsetning við barborð, Braggi Nauthólsvík	31456	Sérsmiði ehf	1698	245.080,00	245.080,00	0,00
											Sérsmiði ehf		2.519.840,00	2.519.840,00	0,00
125059203	17.3.2017	201703	5541	Járnsmiði	1108	20805	123038	13099	Skihti v. Nauthólsvegur 100	88154	Signa ehf	0007233	33.478,00	33.478,00	0,00
											Signa ehf		33.478,00	33.478,00	0,00
91019532	23.2.2017	201702	5544	Pípulögn	1108	20805	123038	13099	V/Nauthólsveg 100 Verk.nr.123038 Unnið 15/2 Um Mynda lagrir	35946	Skolphreinsun Ásgeirs sf	0021058	36.803,00	36.803,00	0,00
											Skolphreinsun Ásgeirs sf		36.803,00	36.803,00	0,00
125068897	5.6.2018	201806	5769	Eftirlitsgjöld og önnur opinber gjöld	1108	20805	123038	13099	Vinna forvarnsviðs lokaúttekt 14& 2018 Nauthólsvegur 100	30388	Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs	78508	26.870,00	26.870,00	0,00
											Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs		26.870,00	26.870,00	0,00
125054478	2.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Framkvæmdir Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	30 - 16	1.055.642,00	1.055.642,00	0,00
127034670	13.1.2017	201701	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna vegna Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	1 - 17	2.302.985,00	2.302.985,00	0,00
126050425	30.3.2017	201704	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 10	108467	Smiðurinn þinn slf.	9 - 17	1.825.630,00	1.825.630,00	0,00
127035825	16.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	15 - 17	2.919.524,00	2.919.524,00	0,00
125060954	2.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthóll 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	14 - 17	6.527.268,00	6.527.268,00	0,00
125053887	8.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	28 - 17	1.234.005,00	1.234.005,00	0,00
126054925	27.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	34 - 17	4.590.647,00	4.590.647,00	0,00
125059626	24.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100 - grindu upp veggi ofl.	108467	Smiðurinn þinn slf.	8 - 17	2.037.871,00	2.037.871,00	0,00
125060722	19.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. breytinga Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	13 - 17	3.405.753,00	3.405.753,00	0,00
125059090	10.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna ísetning á gluggum skemma Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	7 - 17	1.849.171,00	1.849.171,00	0,00
126050658	5.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	11 - 17	2.592.196,00	2.592.196,00	0,00
125058716	24.2.2017	201702	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Endurbætur Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	4 - 17	2.284.523,00	2.284.523,00	0,00
126049096	18.11.2016	201611	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna vegna Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	28 - 16	1.221.150,00	1.221.150,00	0,00
125053609	4.11.2016	201611	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsvegur 100 endurgerð og starfsábyrgðartrygging byggingastj	108467	Smiðurinn þinn slf.	27 - 16	854.302,00	854.302,00	0,00
125057869	10.2.2017	201702	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. endurgerð Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	3 - 17	2.507.983,00	2.507.983,00	0,00
126053054	4.8.2017	201708	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	24 - 17	1.401.640,00	1.401.640,00	0,00
127034729	27.1.2017	201701	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna og efni v. Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	2 - 17	2.234.564,00	2.234.564,00	0,00
126052274	14.7.2017	201707	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	21 - 17	1.656.460,00	1.656.460,00	0,00
126049607	16.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna vegna Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	34 - 16	2.932.023,00	2.932.023,00	0,00
125055577	30.12.2016	201612	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. framkvæmdir Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	38 - 16	2.049.013,00	2.049.013,00	0,00
125060122	21.4.2017	201704	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	10 - 17	4.886.287,00	4.886.287,00	0,00
126051840	30.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	17 - 17	1.406.037,00	1.406.037,00	0,00
125063451	9.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. veggi, glugga ofl. Nauthólsvegi 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	32 - 17	2.332.225,00	2.332.225,00	0,00
127037850	8.12.2017	201712	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Útseld vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	40-17	4.850.024,00	4.850.024,00	0,00
126054021	22.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	29 - 17	702.944,00	702.944,00	0,00
125055304	24.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	38 - 17	2.813.363,00	2.813.363,00	0,00
127037254	10.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	36-17	3.721.006,00	3.721.006,00	0,00
126055431	13.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Afrit: Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	33 - 17	2.323.016,00	2.323.016,00	0,00
126055839	28.12.2017	201712	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	41 - 17	3.058.734,00	3.058.734,00	0,00
126057185	20.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	16 - 18	3.410.372,00	3.410.372,00	0,00
125066026	26.1.2018	201801	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	108467	Smiðurinn þinn slf.	2 - 18	2.462.417,00	2.462.417,00	0,00
127040027	9.3.2018														

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
125067210	26.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Sérsmiði hurðir og innréttingar Nauthólsvegur 100	110823	Smiðurinn þinn slf.		105.519.443,00	105.519.443,00	0,00
125068455	1.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Eldhúsinnrétting á starfsmannasvæði Nauthólsvegur 100	110823	Tréborg ehf.	0000374	1.787.500,00	1.787.500,00	0,00
127039865	27.2.2018	201802	5556	Endurnýjun áhaldra, búnaðar og innréttinga	1108	20805	123038	912	Innborgun v/hurða og innréttinga v/Nauthólsvegur 100	110823	Tréborg ehf.	0000402	1.534.700,00	1.534.700,00	0,00
											Tréborg ehf.	0000360	480.000,00	480.000,00	0,00
91039038	6.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	v/ Nauthólsvegur 100	11173	Tréborg ehf.		3.802.200,00	3.802.200,00	0,00
125068973	28.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	KREDIT v. skil á vöru v. Nauthólsvegur 100	11173	Vélar og verkfæri ehf	R024566	968.230,00	968.230,00	0,00
91040097	19.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Lás - lásarhús v. Nauthólsvegur 100	11173	Vélar og verkfæri ehf	KR001774	-49.307,00	0,00	49.307,00
127040731	12.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	- KREDIT - R024566	11173	Vélar og verkfæri ehf	R025367	30.614,00	30.614,00	0,00
											Vélar og verkfæri ehf	KR001618	-729.461,00	0,00	729.461,00
125066408	20.2.2018	201802	5546	Múrverk	1108	20805	123038	13099	Fílisar v. Nauthólsvegur 100	12479	Vélar og verkfæri ehf		220.076,00	998.844,00	778.768,00
											Vidd ehf	0196106	478.538,00	478.538,00	0,00
											Vidd ehf		478.538,00	478.538,00	0,00
91031042	26.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Viroc black plötur v. Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0053629	18.536,00	18.536,00	0,00
91021146	8.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	v/Nauthólsvegur 100 Umb. Margrét Leifsdóttir Plötur og skrúfur	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0049001	239.048,00	239.048,00	0,00
91021158	9.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	v/Nauthólsvegur 100 Umb. Margrét Leifsdóttir Plötur og skrúfur	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0049055	292.877,00	292.877,00	0,00
91021159	9.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	KREDIT v. r. 0049001 v/Nauthólsvegur 100 Umb. Margrét Leifsdóttir Plötur og skrúfur	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0049056	-239.048,00	0,00	239.048,00
91039959	22.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Skrúfur v/ Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0057761	25.520,00	25.520,00	0,00
91041766	4.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	V/ Nauthólsvegur 100 Umb: Sigfús	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0059025	11.642,00	11.642,00	0,00
91038835	8.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Plötur og skrúfur v. Nauthólsvegur 100 v/ Bragga	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0057237	238.027,00	238.027,00	0,00
91038961	9.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Skrúfur v. Nauthólsvegur 100 v/ Bragga	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0057283	-5.810,00	0,00	5.810,00
91043688	24.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Plötur v/ Nauthólsvegur 100 Umb. Sigfús	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0059657	28.706,00	28.706,00	0,00
91037468	26.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	V/ Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0056888	952.023,00	952.023,00	0,00
91040159	3.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Viroc Brut plötur v/ Nauthólsvegur 100	10676	Þ.Porgímsson og Co ehf	0058030	17.971,00	17.971,00	0,00
											Þ.Porgímsson og Co ehf		1.579.492,00	1.824.350,00	244.858,00
125062921	18.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við þak Nauthólsvegi 100	109783	Þór Gunnarsson	20170940	379.905,00	379.905,00	0,00
126054834	28.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	45	679.830,00	679.830,00	0,00
125059625	24.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. spennur og grind Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170327	611.196,00	611.196,00	0,00
125059799	17.3.2017	201703	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. bragga Nauthólsvegi 100	109783	Þór Gunnarsson	20170328	434.372,00	434.372,00	0,00
125060723	20.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170530	623.844,00	623.844,00	0,00
126051406	31.5.2017	201705	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	31	571.857,00	571.857,00	0,00
125061520	17.7.2017	201707	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. þak Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170736	195.951,00	195.951,00	0,00
125060123	25.4.2017	201704	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	20170429	303.676,00	303.676,00	0,00
126051832	27.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	34	403.899,00	403.899,00	0,00
127036181	30.6.2017	201706	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	20170632	607.848,00	607.848,00	0,00
126054210	1.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	42	645.417,00	645.417,00	0,00
126054209	1.9.2017	201709	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	43	60.724,00	60.724,00	0,00
125063452	10.10.2017	201710	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við glugga ofl. Nauthólsvegi 100	109783	Þór Gunnarsson	20171044	383.904,00	383.904,00	0,00
127037350	23.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	46	740.308,00	740.308,00	0,00
125064430	30.11.2017	201711	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsvegur 100	109783	Þór Gunnarsson	2017-49	801.718,00	801.718,00	0,00
127040467	30.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	7	449.320,00	449.320,00	0,00
127039534	1.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	50	813.055,00	813.055,00	0,00
127039535	1.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Tryggingar v/Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	1	183.568,00	183.568,00	0,00
127040028	12.3.2018	201803	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	3	684.678,00	684.678,00	0,00
125067718	6.4.2018	201804	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Smiðavinna v. Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	201804	855.848,00	855.848,00	0,00
127041025	28.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg	109783	Þór Gunnarsson	9	774.542,00	774.542,00	0,00
127039677	19.2.2018	201802	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	2	607.652,00	607.652,00	0,00
126057240	7.5.2018	201805	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	8	449.320,00	449.320,00	0,00
125069200	19.6.2018	201806	5540	Húsasmiði	1108	20805	123038	13099	Vinna við Nauthólsveg 100	109783	Þór Gunnarsson	10	672.311,00	672.311,00	0,00
											Þór Gunnarsson		12.934.743,00	12.934.743,00	0,00
77006251	16.3.2016	201602	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		95.810,00	95.810,00	0,00
17012970	30.6.2016	201606	5422	Verkfærðæðingar og tæknifræðæðingar	1108	20805	123038		Verkfætþj.v Nauthólsvegur 100 kostnaður v ástandsmats flutt á ksn.stað 1108			-445.560,00	0,00	445.560,00	0,00
17012970	30.6.2016	201606	5422	Verkfærðæðingar og tæknifræðæðingar	1108	20805	123038		Verkfætþj.v Nauthólsvegur 100 kostnaður v ástandsmats 2015 flutt á framk.sv.			445.560,00	445.560,00	0,00	0,00
77006930	15.12.2016	201611	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		683.735,00	683.735,00	0,00
79066049	31.10.2016	201610	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				786.648,00	786.648,00	0,00
79069920	13.12.2016	201611	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		113.230,00	113.230,00	0,00
77007047	24.1.2017	201612	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýsluþóknun		235.170,00	235.170,00	0,00
79071175	31.5.2017	201705	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				256.594,00	256.594,00	0,00
79071136	30.4.2017	201704	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				526.710,00	526.710,00	0,00
79071511	31.7.2017	201707	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				501.082,00	501.082,00	0,00
79059400	30.4.2016	201604	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				254.863,00	254.863,00	0,00
79065141	30.9.2016	201609	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				209.192,00	209.192,00	0,00
79064358	31.8.2016	201608	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				95.831,00	95.831,00	0,00
79057775	31.3.2016	201603	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				199.946,00	199.946,00	0,00
79057758	31.3.2016	201603	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				302.011,00	302.011,00	0,00
79063482	31.7.2016	201607	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur				18.344,00	18.344,00	0,00
79060378	30.6.2016	201606	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur	</					

Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Lykill	Lykill (T)	Kostn.st	Vid2	Vid3	Vid4	Texti	Vmannanr.	Vmannanr. (T)	Reikn.nr.	Fjárhæð	Debet Fjárhæð	Kredit Fjárhæð
79072108	30.11.2017	201711	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		261.812,00	261.812,00	0,00
79071633	31.8.2017	201708	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		134.728,00	134.728,00	0,00
79071922	31.10.2017	201710	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		132.371,00	132.371,00	0,00
77008832	16.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		91.920,14	91.920,14	0,00
77008829	15.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		111.389,00	111.389,00	0,00
77008828	15.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		203.406,00	203.406,00	0,00
77009047	19.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		179.869,02	179.869,02	0,00
77008830	15.1.2018	201712	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099			umsýslubóknun		53.273,00	53.273,00	0,00
79072798	31.3.2018	201803	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		516.337,00	516.337,00	0,00
79073238	30.6.2018	201806	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		686.189,00	686.189,00	0,00
79072698	28.2.2018	201802	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		358.152,00	358.152,00	0,00
79072698	28.2.2018	201802	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038		Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		11.576,00	11.576,00	0,00
79072694	31.1.2018	201801	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		343.353,00	343.353,00	0,00
79072919	30.4.2018	201804	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		825.219,00	825.219,00	0,00
79073049	31.5.2018	201805	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		288.945,00	288.945,00	0,00
79073408	31.7.2018	201807	5602	Millivíðskipti umsjón og eftirlit á verk	1108	20805	123038	13099	Umsýslukostnaður - miðlægur		umsýslubóknun		20.449,00	20.449,00	0,00
umsýslubóknun													12.114.682,58	12.560.242,58	445.560,00
Heildarsumma													403.992.836,58	405.729.624,58	1.736.788,00
