




Áætlanagerð hugbúnaðarþróunar

Fjórða ársfjórðungs 2024



Áætlanagerð í hugbúnaðarþróun


- **Stefnumótun** – Langtímasýn, markmið og stefna
- **Verkefnalisti** – Yfirlit yfir verkefni sem styðja heildarstefnu og framtíðarsýn
- **Vörusýn** – Markmið fyrir vörur eða þjónustur til að mæta þörfum notenda
- **Áfangar** – Áfangar sem gefa skýran ramma fyrir framvindu og mælanlegar útkomur
- **Sprettir** – Skammtíma lotur þar sem teymið vinnur að afmörkuðum markmiðum
- **Stöðufundir** – Verkefni dagsins sem þróunarteymið einbeitir sér að

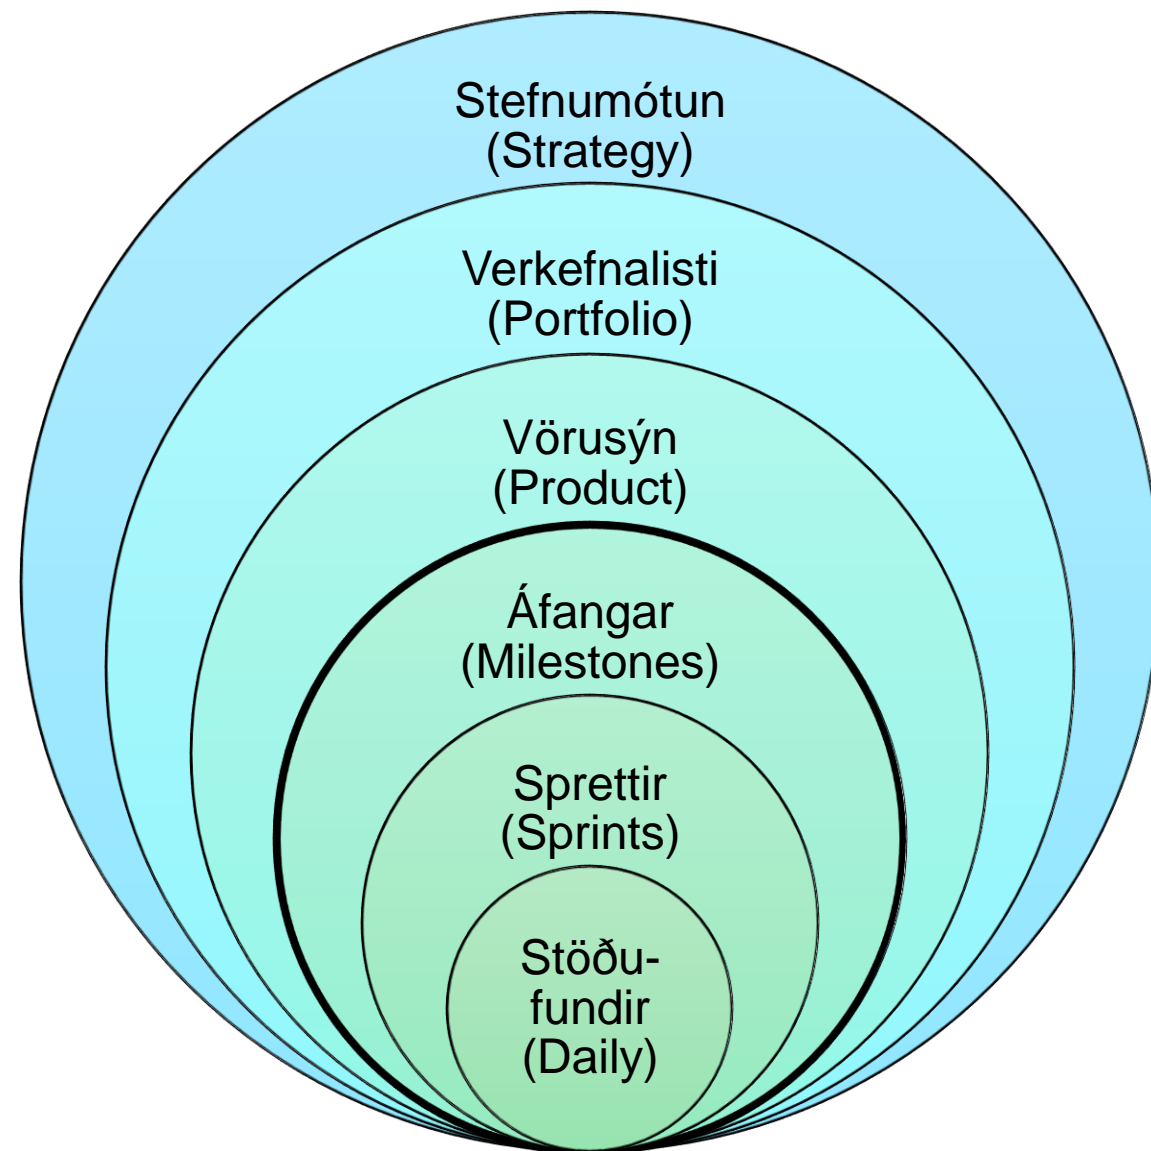



Áætlanagerð í hugbúnaðarþróun

- **Stefnumótun** – Langtímasýn, markmið og stefna
- **Verkefnalisti** – Yfirlit yfir verkefni sem styðja heildarstefnu og framtíðarsýn
- **Vörusýn** – Markmið fyrir vörur eða þjónustur til að mæta þörfum notenda
- **Áfangar** – Áfangar sem gefa skýran ramma fyrir framvindu og mælanlegar útkomur
- **Sprettir** – Skammtíma lotur þar sem teymið vinnur að afmörkuðum markmiðum
- **Stöðufundir** – Verkefni dagsins sem þróunarteymið einbeitir sér að

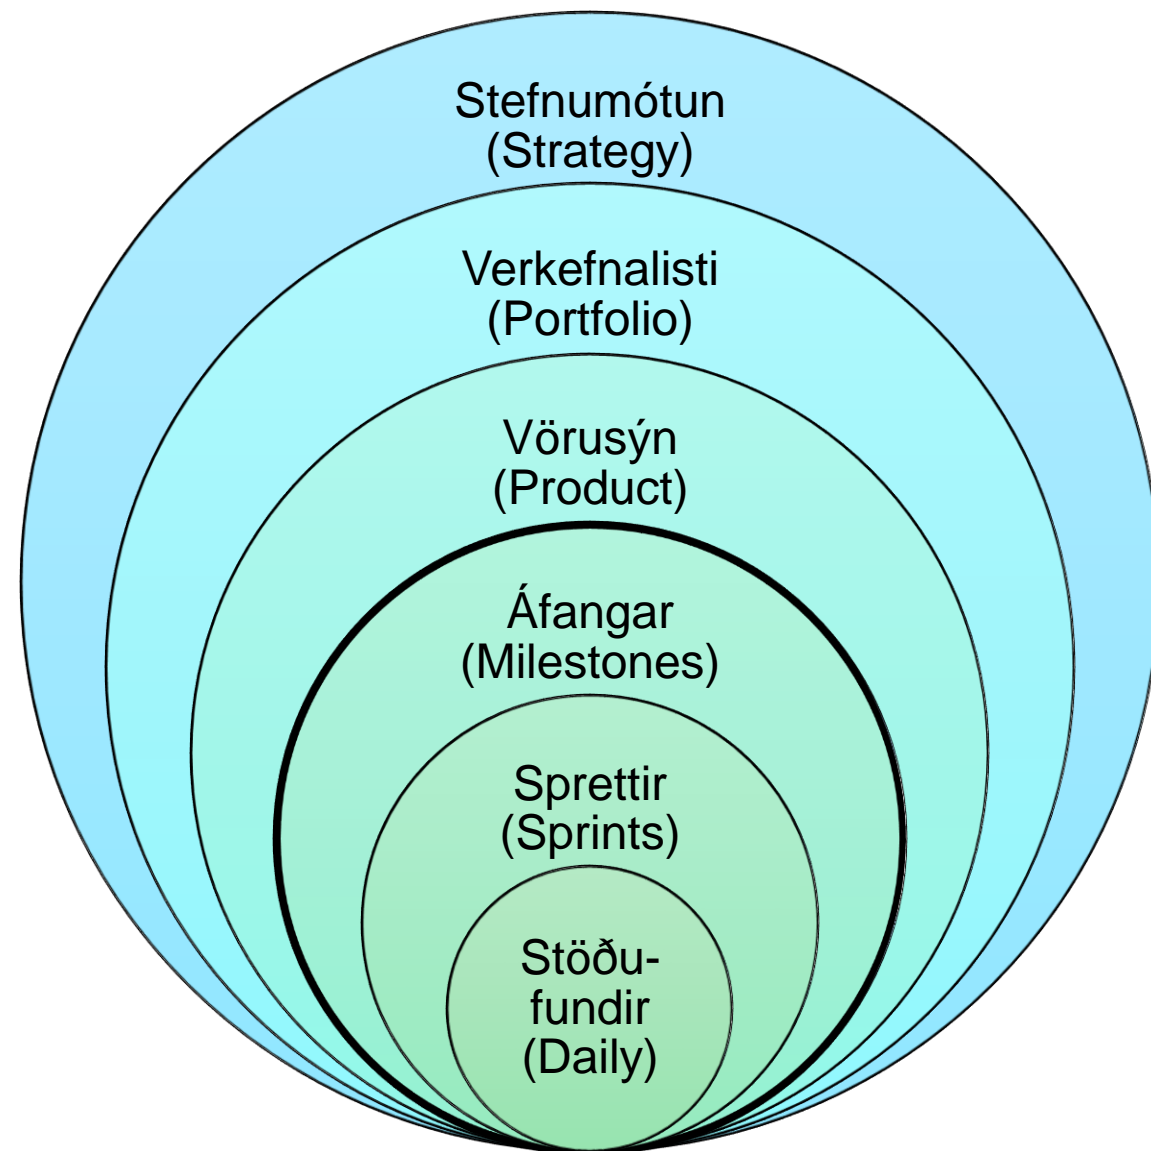



Áætlanagerð – Lota 1

- **Undirbúningur hjá hverju teymi (2 vikur)**

- Skilgreina markmið og tímalínur
- Forgangsraða verkefnalista (backlog)
- Tilgreina tengsl/háð
- Drög að útgáfuáætlun
- Áhættuþættir



- **Kynningar og umræða (3 klst.)**


- Hvert stefnum við? Samræmum framtíðarsýn, stefnu og forgangsroðun
- Þróunarteymi kynna drög að áætlun fyrir 4. ársfjórðung og fá endurgjöf



Áætlanagerð – Lota 2

- Ítrun hjá hverju teymi (2 vikur)

- Enduskoðun á áætlunum byggð á umræðu og endurgjöf
- Uppfæra skráningu í Jira (útgáfur, tengsl verkefna)
- Áhættu ROAM-ing:
 - **R**esolved = Leyst
 - **O**wned = Úthlutað
 - **A**ccepted = Samþykkt
 - **M**itigated = Mótvægisaðgerð
- Atkvæðagreiðsla til að meta hversu raunhæf áætlunin er

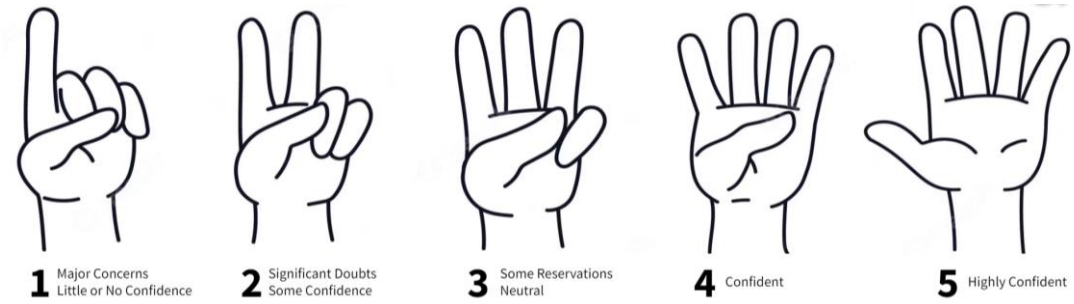


- Lokakynning (1 klst.)

- Þróunarteymi kynna áætlanir





... yfir í Jira

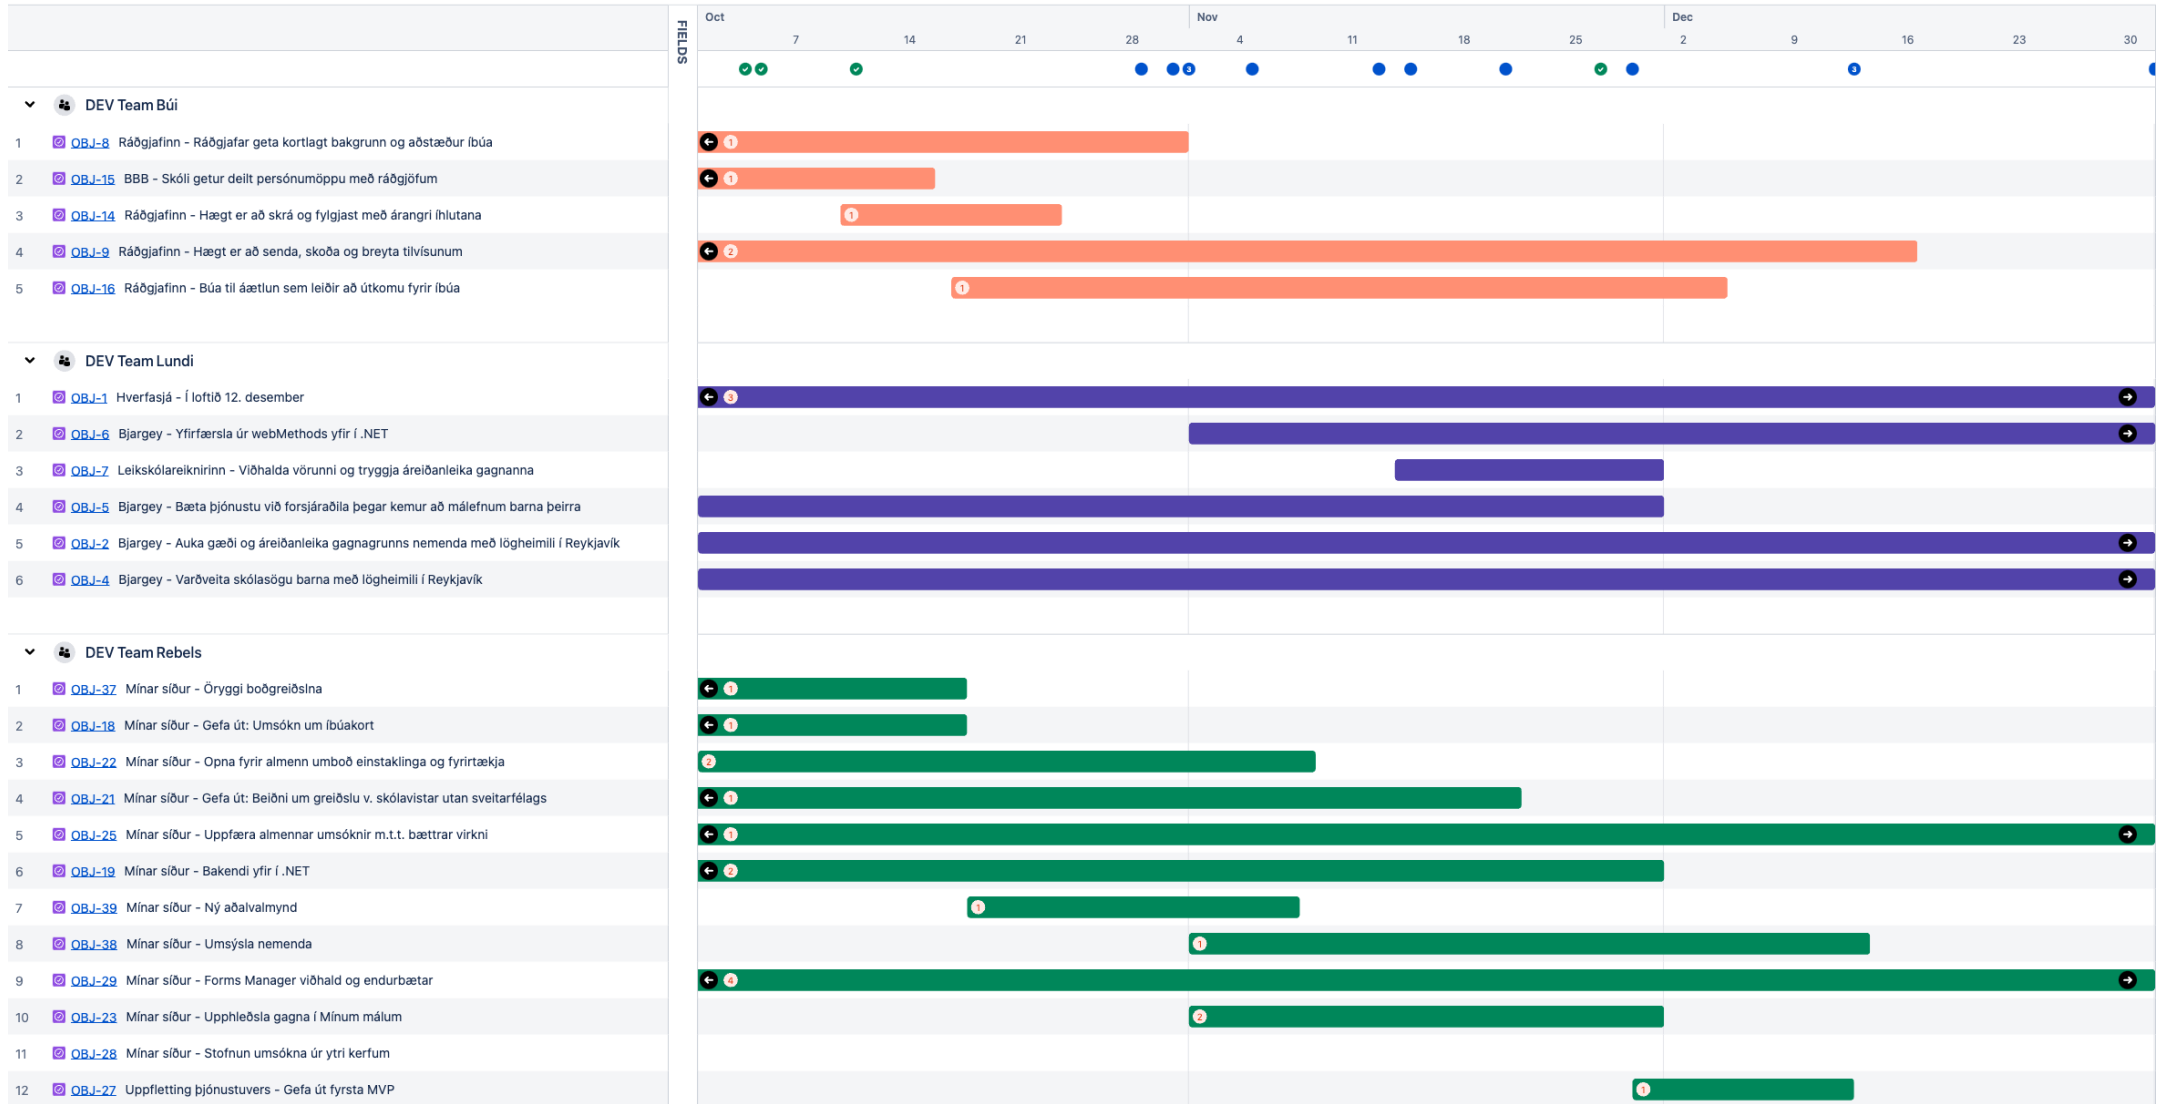



Markmiðin

Skipting í 2 flokka:

- Skuldbundin markmið (**Critical path**): Skuldbinding um að ljúka verkefnum tímans.
- Óskuldbundin markmið (**Stretch goal**): Viðbótarverkefni sem við reynum að ná ef tími og aðföng leyfa, en þau eru ekki tryggð.

The screenshot shows the Jira interface for a project named 'Hverfasjá - Í loftið 12. desember'. The page is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs like 'Your work', 'Projects', 'Filters', 'Dashboards', and 'More', along with a 'Create' button and a search bar.
- Project Info:** Shows the project name and a date '12. desember'. There are buttons for 'Attach', 'Link issue', 'Track time with Clockwork', and 'Link goals'.
- Description:** A section for editing the project description.
- Linked issues:** A section titled 'is blocked by' containing three linked issues:
 - USK-17: Return data related to 'Hverfi' in Hverfasjá (Status: OPEN)
 - USK-16: Return data related to 'skilmálaeining' in Hverfasjá (Status: OPEN)
 - USK-15: Return data related to address in Hverfasjá (Status: OPEN)
- Activity:** A section for adding comments, with a 'Pro tip: press M to comment' note.
- Details Panel (Right):** A sidebar containing project details:
 - Team:** DEV Team Lundi
 - Assignee:** Bryndís Kristinsdóttir (with 'Assign to me' link)
 - Reporter:** María Ámundadóttir
 - Objective category:** Critical path (highlighted with a pink box)
 - Business value:** 5
 - Technical effort:** 5
 - Fix versions:** P2024.Q4
 - Labels:** P2024.Q4



Markmiðin

Skipting í 2 flokka:

- Skuldbundin markmið (**Critical path**): Skuldbinding um að ljúka verkefnum tímans.
- Óskuldbundin markmið (**Stretch goal**): Viðbótarverkefni sem við reynum að ná ef tími og aðföng leyfa, en þau eru ekki tryggð.

Einkunnargjöf:

- **Business value** (1-5): Mikilvægi verkefna fyrir notendur.
- **Technical effort** (1-5): Mat á fyrirhöfn verkefna.

Þessi nálgun hjálpar okkur að gera raunhæfari áætlanir, á meðan við ýtum á meiri afköst ef mögulegt er.



Projects / Cross-team Delivery / OBJ-1

Hverfasjá - Í loftið 12. desember

Attach Link issue Track time with Clockwork Link goals

Description
Edit description

Linked issues
is blocked by

- USK-17 Return data related to 'Hverfi' in Hverfasjá OPEN
- USK-16 Return data related to 'skilmálaeining' in Hverfasjá OPEN
- USK-15 Return data related to address in Hverfasjá OPEN

Activity
Add a comment...
Pro tip: press M to comment

In Progress Actions

Details

Team: DEV Team Lundi

Assignee: Bryndís Kristinsdóttir
Assign to me

Reporter: María Ámundadóttir

Objective category: Critical path

Business value: 5

Technical effort: 5

Fix versions: P2024.Q4

Labels: P2024.Q4



Tilgangurinn ...

- Gera teyllum, stjórnendum og hagaðilum kleift að **samræma markmið** fyrir komandi tímabil.
- Skapa **gagnsæi** og sýnileika á forgangsröðun og afhendingu verkefna.
- Draga úr líkum á óvæntum vandamálum með því að bera kennsl á áhættur og ræða mótvægisaðgerðir.
- Stuðla að **betra samstarfi** milli teyma og búa til tækifæri til að leysa ágreining eða ósamræmi í tímalínunum.



Team Rocket

Ráðgjafinn / Búi / Veita



TINDUR

Vörustjóri



ÖRN

Tech lead



SÓLVEIG

Team lead



ARNA

Stafrænn vöruhönnuður



KAMIL

Framendaforritari



Sigurbór

Framendaforritari



DAMIAN

Bakendaforritari



MARCIN

Bakendaforritari



Piotr

Prófari



Q4 Team Rocket - Markmið



		Objective category	Status
1	OBJ-8 Ráðgjafinn - Ráðgjafar geta kortlagt bakgrunn og aðstæður íbúa	Critical path	IN PROGRESS
2	OBJ-15 BBB - Skóli getur deilt persónumöppu með ráðgjöfum	Critical path	IN PROGRESS
3	OBJ-14 Ráðgjafinn - Hægt er að skrá og fylgjast með árangri íhlutana	Critical path	IN PROGRESS
4	OBJ-9 Ráðgjafinn - Hægt er að senda, skoða og breyta tilvísunum	Critical path	IN PROGRESS
5	OBJ-16 Ráðgjafinn - Búa til áætlun sem leiðir að útkomu fyrir íbúa	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT



Q4 Team Rocket - Markmið



		Objective category	Status	13.11.2024
1	OBJ-8 Ráðgjafinn - Ráðgjafar geta kortlagt bakgrunn og aðstæður íbúa	Critical path	IN PROGRESS	
2	OBJ-15 BBB - Skóli getur deilt persónumöppu með ráðgjöfum	Critical path	IN PROGRESS	
3	OBJ-14 Ráðgjafinn - Hægt er að skrá og fylgjast með árangri íhlutana	Critical path	IN PROGRESS	
4	OBJ-9 Ráðgjafinn - Hægt er að senda, skoða og breyta tilvísunum	Critical path	IN PROGRESS	
5	OBJ-16 Ráðgjafinn - Búa til áætlun sem leiðir að útkomu fyrir íbúa	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT → IN PROGRESS v	



Team Lundi

Bjargey / Leikskólareiknir
Hverfasjá



BRYNDÍS

Vörustjóri



PERLA

Team lead



RAGNHEIÐUR

Teach lead



ALEXANDRA

Bakendaforritari



ÁSA

Stafrænn vörhönnuður



JENNÝ

Framendaforritari



KRISTJÁN

Framendaforritari




TRISTAN

Framendaforritari



JAKUB

Prófari



PATRYK

Prófari



Q4 Team Lundi - Markmið



		Objective category	Status
1	OBJ-1 Hverfasjá - Í loftið 12. desember	Critical path	IN PROGRESS
2	OBJ-6 Bjargey - Yfirfærsla úr webMethods yfir í .NET	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT
3	OBJ-7 Leikskólareiknirinn - Viðhalda vörunni og tryggja áreiðanleika gagnanna	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT
4	OBJ-5 Bjargey - Bæta þjónustu við forsjáraðila þegar kemur að málefnum barna þeirra	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT
5	OBJ-2 Bjargey - Auka gæði og áreiðanleika gagnagrunns nemenda með lögheimili í Reykjavík	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT
6	OBJ-4 Bjargey - Varðveita skólasögu barna með lögheimili í Reykjavík	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT



Q4 Team Lundi - Markmið



	Objective category	Status	13.11.2024
1 OBJ-1 Hverfasjá - Í loftið 12. desember	Critical path	IN PROGRESS	
2 OBJ-6 Bjargey - Yfirfærsla úr webMethods yfir í .NET	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT	CANCELLED ✓
3 OBJ-7 Leikskólareiknirinn - Viðhalda vörunni og tryggja áreiðanleika gagnanna	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT	
4 OBJ-5 Bjargey - Bæta þjónustu við forsjáraðila þegar kemur að málefnum barna þeirra	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	CANCELLED ✓
5 OBJ-2 Bjargey - Auka gæði og áreiðanleika gagnagrunns nemenda með lögheimili í Reykjavík	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	CANCELLED ✓
6 OBJ-4 Bjargey - Varðveita skólasögu barna með lögheimili í Reykjavík	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	CANCELLED ✓



Team Rebels

Mínar síður / Uppfletting þjónustovers



Adam

Framenda-
forritari



Elías

Framenda-
forritari



Sólveig

Framenda-
forritari



Sigurpór

Framenda-
forritari



Kári

Bakenda-
forritari



Axel

Bakenda-
forritari



Ása

Hönnuður



Bogna

Prófari



Fjalar

Vörustjóri



Dagrún

Team lead



Q4 Team Rebels - Markmið



		Objective category	Status
1	OBJ-37 Mínar síður - Öryggi boðgreiðslna	Critical path	IN PROGRESS
2	OBJ-18 Mínar síður - Gefa út: Umsókn um íbúakort	Critical path	IN PROGRESS
3	OBJ-22 Mínar síður - Opna fyrir almenn umboð einstaklinga og fyrirtækja	Critical path	IN PROGRESS
4	OBJ-21 Mínar síður - Gefa út: Beiðni um greiðslu v. skólavistar utan sveitarfélags	Critical path	IN PROGRESS
5	OBJ-25 Mínar síður - Uppfæra almennar umsóknir m.t.t. bættrar virkni	Stretch goal	IN PROGRESS
6	OBJ-19 Mínar síður - Bakendi yfir í .NET	Critical path	IN PROGRESS
7	OBJ-39 Mínar síður - Ný aðalvalmynd	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT
8	OBJ-38 Mínar síður - Umsýsla nemenda	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT
9	OBJ-29 Mínar síður - Forms Manager viðhald og endurbætar	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT
10	OBJ-23 Mínar síður - Upphleðsla gagna í Mínum málum	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT
11	OBJ-28 Mínar síður - Stofnun umsókna úr ytri kerfum	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT
12	OBJ-27 Uppfletting þjónustuvvers - Gefa út fyrsta MVP	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT



Q4 Team Rebels - Markmið



		Objective category	Status	13.11.2024
1	OBJ-37 Mínar síður - Öryggi boðgreiðslna	Critical path	IN PROGRESS	DONE ✓
2	OBJ-18 Mínar síður - Gefa út: Umsókn um íbúakort	Critical path	IN PROGRESS	DONE ✓
3	OBJ-22 Mínar síður - Opna fyrir almenn umboð einstaklinga og fyrirtækja	Critical path	IN PROGRESS	
4	OBJ-21 Mínar síður - Gefa út: Beiðni um greiðslu v. skólavistar utan sveitarfélags	Critical path	IN PROGRESS	
5	OBJ-25 Mínar síður - Uppfæra almennar umsóknir m.t.t. bættrar virkni	Stretch goal	IN PROGRESS	
6	OBJ-19 Mínar síður - Bakendi yfir í .NET	Critical path	IN PROGRESS	
7	OBJ-39 Mínar síður - Ný aðalvalmynd	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT	IN PROGRESS ✓
8	OBJ-38 Mínar síður - Umsýsla nemenda	Critical path	SELECTED FOR DEVELOPMENT	CANCELLED ✓
9	OBJ-29 Mínar síður - Forms Manager viðhald og endurbætar	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	IN PROGRESS ✓
10	OBJ-23 Mínar síður - Upphleðsla gagna í Mínum málum	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	IN PROGRESS ✓
11	OBJ-28 Mínar síður - Stofnun umsókna úr ytri kerfum	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	
12	OBJ-27 Uppfletting þjónustuvers - Gefa út fyrsta MVP	Stretch goal	SELECTED FOR DEVELOPMENT	




Samantekt markmiða Q4 2024

- 3 þróunarteymi
- 23 markmið
 - 15 skuldbundin (**Critical path**)
 - 8 óskuldbundin (**Stretch goal**)

- Staðan í dag (13.11.2024)

- 13% Ekki hafið (n=3)
- 56% Í vinnslu (n=13)
- 31% Lokað (n=7)
 - 9% Lokið (n=2)
 - 22% Hætt við (n=5)





Reykjavík
